

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1247	Chief of Operations Validation Date	10/15/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Institutional Strengthening of the Ministry of Finance	Loan Number	3759/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Team Leader	GARCIA MEJIA, MAURICIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1247	13,000,000	13,000,000	5,000,000	0	18,000,000	13,000,000	5,386,376.52	41.43%	7,613,623.48
Aggregated	13,000,000	13,000,000	5,000,000	0	18,000,000	13,000,000	5,386,376.52	41.43%	7,613,623.48

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

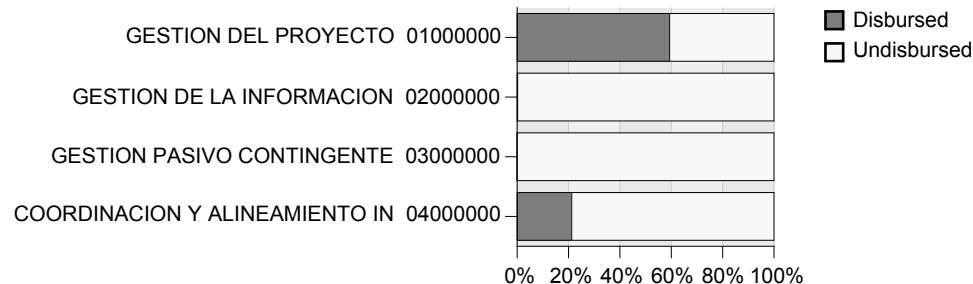

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Las políticas sectoriales de mediano y largo plazo incorporan los parámetros provenientes de la política económica

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Número de planes sectoriales que incorporan los parámetros de la política económica (en sectores seleccionados)	Planes	15.00	2018	P	17.00	20.00	20.00
					P(a)	17.00	20.00	20.00
					A			

Details

Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado ICEPE

Observations: Índice = $\sum P_i/n$, siendo P_i las puntuaciones a los descriptores 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 y 22 del ICEPE y n el nº de descriptores. Se entiende política económica en su sentido amplio, incluyendo las políticas financieras, presupuestarias y fiscales.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.1	Índice de Incidencia de la Política Económica en las Políticas Sectoriales (IPEPS): valor de los ítems 3 y 6	Valor de los ítems	6.10	2018	P	6.50	7.50	7.50
					P(a)	6.50	7.50	7.50
					A			

Details

Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado IPEPS

Observations: Índice = $\sum P_i/n$, siendo P_i la puntuación de los ítems 3 y 6, y n es el número de ítems. Se entiende política económica en su sentido amplio, incluyendo las políticas financieras, presupuestarias y fiscales.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Capacidades técnicas para la elaboración de política económica fortalecidas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Índice de calidad del análisis para la política económica	Valor del Índice	5.40	2018	P			6.00		7.50	7.50
					P(a)			6.00		7.50	7.50
					A						0.00

Details

Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado ICEPE

Observations: Índice = $\Sigma P_i/n$, siendo P_i las puntuaciones a los descriptores 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 y 22 del cuestionario ICEPE y n el nº de descriptores. Se entiende política económica en su sentido amplio, incluyendo las políticas financieras, presupuestarias y fiscales.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Mejor coordinación entre el MF y los ministerios sectoriales en lo referido a las políticas sectoriales de mediano y largo plazo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Índice de calidad de la coordinación externa	Valor del Índice	7.50	2018	P			8.00		9.00	9.00
					P(a)			8.00		9.00	9.00
					A						0.00

Details

Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado ICEPE

Observations: Índice = $\Sigma P_i/n$, siendo P_i las puntuaciones a los descriptores 15, 16, 17 y 18 del cuestionario ICEPE y n el nº de descriptores.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Número de Unidades que utilizan mecanismos formales y regulares de coordinación con entidades externas.	Numero	1.00	2018	P			3.00		6.00	6.00
					P(a)			3.00		6.00	6.00
					A						0.00

Details

Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas

Observations: Descriptores 1, 2, 5 y 7 del IPEPS, considerando Unidades que seleccionaron la opción 1 de cada uno de los ítems mencionados.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: La elaboración de políticas económicas incorpora conocimientos y metodologías adecuadas para planificar el mediano y largo plazo

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.0	Índice de calidad del procesamiento de información económica	Valor del Índice	5.00	2018	P			5.80	0.00	7.00	7.00
					P(a)			5.80	0.00	7.00	7.00
					A						

Details

Means of verification: Aplicación cuestionario ICEPE

Observations: Índice = $\Sigma P_i/n$, siendo P_i las puntuaciones a los descriptores 7, 8, 9 y 10 del cuestionario ICEPE y n el n° de descriptores.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.1	Porcentaje del personal profesional con posgrado y/o estudios de especialización relevante en su área de trabajo	Porcentaje	41.00	2018	P			47.00		55.00	55.00
					P(a)			47.00		55.00	55.00
					A						

Details

Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas

Observations: = (personal de las Unidades clave para la formulación de Pol. Económicas con posgrado y/o estudios de especialización relevante en su área/ total de personal PROFESIONAL de las Unidades clave para la formulación de Pol. Económicas)* 100

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.2	Porcentaje del personal con capacitación mediante el Sistema Virtual de Conocimiento	Porcentaje	11.00	2018	P			15.00		20.00	20.00
					P(a)			15.00		20.00	20.00
					A						

Details

Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas

Observations: = (personal de las Unidades clave para la formulación de Pol. Económicas que han completado una capacitación en el sistema virtual de conocimiento en el último año / total de personal de las Unidades clave para la formulación de Pol. Económicas)* 100

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.3	Índice de adecuación del equipamiento informático	Valor del	7.20	2018	P			8.00		9.00	9.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.3	y los sistemas informáticos para la realización del trabajo	índice	7.20	2018	P(a)			8.00		9.00	9.00
					A						
Details											
Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas											
Observations: Índice = $\sum P_i/n$, siendo P_i las puntuaciones de los descriptores 7 y 8 del apartado “Dotación de personal, equipo informático y sistemas” y n el nº de descriptores											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

Outcome Nbr. 3: La elaboración de política económica incorpora información con la calidad y oportunidad adecuadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.0	Índice de calidad y oportunidad de la información primaria	Valor del Índice	7.10	2018	P			8.00		9.00	9.00
					P(a)			8.00		9.00	9.00
					A						
Details											
Means of verification: Encuesta de Calidad de la Formulación de las Políticas Económicas – Apartado ICEPE											
Observations: Índice = $\sum P_i/n$, siendo P_i las puntuaciones de los descriptores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del ICEPE y n el nº de descriptores											
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Gestión del conocimiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Sistema Virtual de Conocimiento actualizado y mejorado.	Politica	P	0	1	1,386,667	4,804,761
			P(a)	0	1	0	4,690,314
			A	0	0	0	1,110,532
1.2	Programa del Gestión del conocimiento en el contexto de la inserción internacional	Fondo	P	0	1	0	1,033,923
			P(a)	0	1	196,139	2,828,467
			A	0	0	113,735	2,224,099

Component Nbr. 2 Componente 2: Gestión de la información

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Sistema de gestión de información para el servicio de deuda diseñado e implementado.	Politica	P	1	1	172,861	516,967
			P(a)	0	1	0	9,898
			A	0	0	0	9,898
2.2	Sistema de gestión de proyectos con financiamiento externo diseñado e implementado.	Herramienta	P	0	1	232,373	926,822
			P(a)	0	1	50,000	1,101,822
			A	0	1	0	2,069
2.3	Sistemas del Ministerio de Finanzas compatibilizados con otros sistemas de dependencias/entes/organismos de la administración pública nacional y subnacional diseñados e implementados.	Sistema	P	2	3	100,000	1,917,175
			P(a)	0	3	0	2,124,244
			A	0	1	0	1,317,175
2.4	Sistema de gestión de información para mejorar el desempeño de Superintendencia de Seguros diseñado e implementado.	sistema	P	1	1	200,000	600,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
2.5	Relevamiento de buenas prácticas y recomendaciones de mejora para el sistema de seguimiento de proyectos de financiamiento externo.	Informe	P	1	1	169,981	506,173
			P(a)	0	1	10,000	526,173
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Componente 3: Gestión del pasivo contingente y expedientes

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	Proceso de gestión de pasivos mejorado.	Proceso	P	0	1	0	1,454,995
			P(a)	0	1	0	1,454,995
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Componente 4: Instrumentos de coordinación y alineamiento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
4.1	Proyectos de mejora de la gestión interna de los Ministerios de Hacienda y de Finanzas implementados y concluidos.	Proyecto	P	0	1	324,092	2,788,247
			P(a)	0	1	398,935	3,157,182
			A	0	0	155,415	1,029,256
4.2	Planes de fortalecimiento institucional de organismos dependientes del Ministerio de Finanzas implementados.	Plan	P	1	3	953,104	3,051,184
			P(a)	1	3	6,000	1,752,921
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Monitoreo y Evaluacion	P				0	0
		P(a)				0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Monitoreo y Evaluacion	A			0	0
	Unidad Ejecutora	P			134,250	399,753
		P(a)			97,538	353,984
		A			45,175	53,752
	Imprevistos	P			0	0
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			3,673,328	18,000,000
		P(a)			758,612	18,000,000
		A			314,325	5,746,781

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Planes de fortalecimiento institucional de organismos dependientes del Ministerio de Finanzas implementados.	Se actualiza la planificación 2020 reportada a inicios del año por el Ejecutor, según lo acordado con SPD. Debido al impacto que ha tenido en la planificación inicial reportada el COVID-19.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MSGOMEZ	10/08/2020
	Programa del Gestión del conocimiento en el contexto de la inserción internacional	Se actualiza la planificación 2020 reportada a inicios del año por el Ejecutor, según lo acordado con SPD. Debido al impacto que ha tenido en la planificación inicial reportada el COVID-19.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
	Proyectos de mejora de la gestión interna de los Ministerios de Hacienda y de Finanzas implementados y concluidos.	Se actualiza la planificación 2020 reportada a inicios del año por el Ejecutor, según lo acordado con SPD. Debido al impacto que ha tenido en la planificación inicial reportada el COVID-19.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
	Relevamiento de buenas prácticas y recomendaciones de mejora para el sistema de seguimiento de proyectos de financiamiento externo.	Se actualiza la planificación 2020 reportada a inicios del año por el Ejecutor, según lo acordado con SPD. Debido al impacto que ha tenido en la planificación inicial reportada el COVID-19.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MSGOMEZ	10/08/2020
	Sistema Virtual de Conocimiento actualizado y mejorado.	Se actualiza la planificación 2020 reportada a inicios del año por el Ejecutor, según lo acordado con SPD. Debido al impacto que ha tenido en la planificación inicial reportada el COVID-19.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MSGOMEZ	10/08/2020
	Sistema de gestión de proyectos con financiamiento externo diseñado e implementado.	Se actualiza la planificación 2020 reportada a inicios del año por el Ejecutor, según lo acordado con SPD. Debido al impacto que ha tenido en la planificación inicial reportada el COVID-19.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MSGOMEZ	10/08/2020
	Sistemas del Ministerio de Finanzas compatibilizados con otros sistemas de dependencias/entes/organismos de la administración pública nacional y subnacional diseñados e implementados.	Se actualiza la planificación 2020 reportada a inicios del año por el Ejecutor, según lo acordado con SPD. Debido al impacto que ha tenido en la planificación inicial reportada el COVID-19.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MSGOMEZ	10/08/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
