

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1254	Chief of Operations Validation Date	10/16/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/16/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support the National Early Childhood Plan and the Policy for Universalization of Early Childhood Education	Loan Number	4229/OC-AR, 4229/OC-AR-1, 4229/OC-AR-2
Executing Agency	MINISTERIO DE EDUCACION, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	TRISTAO, IGNEZ M.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1254	200,000,000	200,000,000	26,000,000	0	226,000,000	200,000,000	19,826,579.18	9.91%	180,173,420.82
Aggregated	200,000,000	200,000,000	26,000,000	0	226,000,000	200,000,000	19,826,579.18	9.91%	180,173,420.82

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

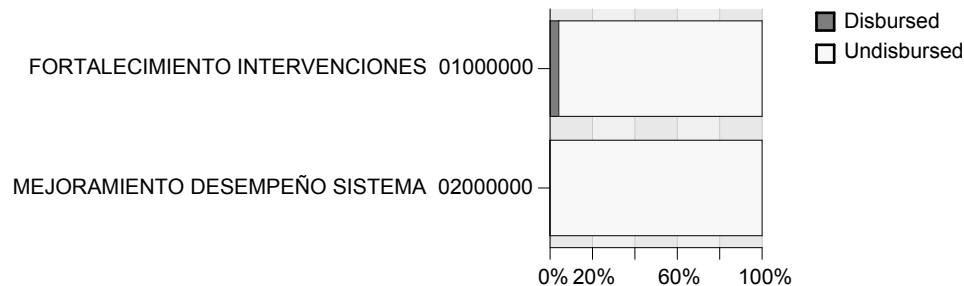

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejora en indicadores de desarrollo infantil

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2022	EOP 2022
0.0	Niños de 0 a 48 meses de edad que asisten a EPI fortalecidos por el Programa y logran un nivel de desarrollo esperable para su edad	%	78.00	2012	P			80.00
					P(a)			80.00
					A			

Details

Means of verification: Informe de evaluación de impacto

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Incremento en el acceso a servicios públicos de desarrollo infantil de calidad

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Niños que asisten a un EPI con proyecto de fortalecimiento de calidad financiado por el programa finalizado	Children (#)	0.00	2017	P	0.00	1,674.00	11,160.00	16,200.00	16,833.00	45,867.00
					P(a)	0.00	1,674.00	11,160.00	16,200.00	16,833.00	45,867.00
					A	0.00	1,674.00	0.00			1,674.00

Details

Means of verification: Reporte del Sistema de Espacios de Primera Infancia

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.1	Niños beneficiarios del Programa Primeros Años en su modalidad de acompañamiento familiar	niños	0.00	2017	P	0.00	3,541.00			3,541.00
					P(a)	0.00	3,541.00			3,541.00
					A	0.00	3,541.00			3,541.00

Details

Means of verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.2	Alumnos que asisten a las nuevas salas de jardines construidos o ampliados por el programa	# of students	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	7,550.00	3,500.00	11,050.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	7,550.00	3,500.00	11,050.00
					A	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Reporte del Sistema Integral de Información Digital Educativa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.3	Tasa neta de matriculación a Educación Inicial para niños de 3 y 4 años	%	66.20	2015	P				66.80	66.80
					P(a)				66.80	66.80
					A					

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informe de evaluación de impacto

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Mejora en la calidad de servicios públicos de desarrollo infantil

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	EPI fortalecidos por el Programa cuyo estado de condición edilicia es adecuado	%	55.00	2015	P				81.00	81.00
					P(a)				81.00	81.00
					A					

Details

Means of verification: Reporte del Sistema de Espacios de Primera Infancia

Observations: La línea de base se construye con el diagnóstico inicial realizado en cada EPI antes de su remodelación.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Jardines beneficiados por el Programa que alcanzan un puntaje mínimo de calidad de los insumos para el proceso educativo	%	0.00	2018	P				50.00	
					P(a)				50.00	
					A					

Details

Means of verification: Informe de evaluación de impacto

Observations: La línea de base debe ser levantada y con esa información se definirá la meta. Se colocó cero como línea de base porque el sistema indica error si dejábamos la celda vacía.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Fortalecimiento de competencias de técnicos, docentes, directores y supervisores en Educación Inicial

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	Profesionales técnicos, supervisores, directivos y docentes capacitados para la gestión de estrategias integrales para la primera infancia	profesionales	0.00	2017	P	0.00	0.00	500.00	1,500.00	3,000.00	5,000.00
					P(a)	0.00	0.00	500.00	1,500.00	3,000.00	5,000.00
					A	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Informes del Ministerio de Educación, programa Escuela de Gobierno

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 1: Subcomponente 1.1. Fortalecimiento de espacios de primera infancia

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Espacios de primera infancia (EPIs) construidos	EPIs	P	0	10	1,137,500	5,000,000
			P(a)	0	10	1,137,500	5,000,000
			A	0	0	0	0
1.2	EPIs remodelados	EPIs	P	132	350	41,274,478	64,461,502
			P(a)	132	350	41,274,478	64,461,502
			A	30	48	580,293	2,985,470
1.3	EPIs con becas	EPIs	P	0	800	0	16,058,532
			P(a)	0	800	0	16,058,532
			A	0	800	0	16,058,532
1.4	Piloto de validación de instrumento de supervisión de procesos NEA/NOA	piloto	P	0	1	0	0
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1		0
1.5	EPI con materiales para la mejora de los procesos de cuidado entregados	EPIs	P	200	1,700	330,523	2,235,999
			P(a)	200	1,700	330,523	2,235,999
			A	0	782	2,023	62,447
1.6	Estudio de seguimiento de mejora de procesos de cuidado en EPI finalizado	evaluación	P	0	1	0	1,464,000
			P(a)	0	1	0	1,464,000
			A	0	0	0	0
1.7	EPIs con material lúdico y libros entregados	EPIs	P	200	1,700	742,926	3,699,999
			P(a)	200	1,700	742,926	3,699,999
			A	0	782	89,926	692,187
1.8	Sistema de Información Integral de Primera Infancia en funcionamiento	Sistema	P	0	1	44,900	224,500
			P(a)	0	1	44,900	224,500
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 COMPONENTE 1: Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de intervenciones domiciliarias

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Informe diagnóstico de prácticas de crianza y cuidado en los hogares donde se realizaron intervenciones domiciliarias en el marco del Programa Primeros Años	evaluación	P	0	1	314,096	1,221,875
			P(a)	0	1	314,096	1,221,875
			A	0	1	314,096	767,740
2.2	Becas a facilitadoras que realizan visitas domiciliarias de Primeros Años	evaluación	P	0	2,688	0	478,125
			P(a)	0	2,688	0	478,125
			A	0	2,688	0	478,125

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 COMPONENTE 2: Subcomponente 2.1. Expansión de la infraestructura educativa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Jardines nuevos construidos y equipados para la Educación Inicial	jardines	P	0	60	9,203,170	47,642,600
			P(a)	0	60	9,203,170	47,642,600
			A	0	0	0	0
3.2	Jardines ampliados y equipados para la Educación Inicial	jardines	P	0	20	2,371,821	10,457,400
			P(a)	0	20	2,371,821	10,457,400
			A	0	0	0	0
3.3	Estimaciones de demanda insatisfecha en la provincia de Buenos Aires desarrolladas e implementadas.	informe	P	0	1	0	50,000
			P(a)	0	1	0	50,000
			A	0	1	0	50,000

Component Nbr. 4 COMPONENTE 2: Subcomponente 2.2. Fortalecimiento de la gestión escolar y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
4.1	Dispositivos de formación para la gestión de estrategias integrales para la primera infancia implementados	dispositivo	P	1	3	660,000	1,990,000
			P(a)	1	3	660,000	1,990,000
			A	0	0	0	0
4.2	Tablero de gestión diseñado y funcionando	tablero	P	0	1	0	10,000
			P(a)	0	1	0	10,000
			A	0	1	0	10,000

Component Nbr. 5 COMPONENTE 2: Subcomponente 2.3. Evaluación y monitoreo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
5.1	Instrumento de Evaluación de Calidad de los insumos de educación inicial formulado y piloteado	instrumentos	P	0	1	0	350,000
			P(a)	0	1	0	350,000
			A	0	0	0	0
5.2	Estudio de evaluación de calidad de los insumos de educación inicial en jardines beneficiarios	estudio	P	0	1	0	350,000
			P(a)	0	1	0	350,000
			A	0	0	0	0
5.3	Evaluación de Procesos de la Expansión de Cobertura	evaluación	P	0	1	0	350,000
			P(a)	0	1	0	350,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

Gastos operativos del Componente 1	P			332,371	464,000
	P(a)			332,371	464,000
	A			167,371	228,232
Auditoría externa del Componente 1	P			12,765	750,000
	P(a)			12,765	750,000
	A			0	21,402
Administración del Componente 2	P			100,000	500,000
	P(a)			100,000	500,000
	A			0	0
Auditoría externa del Componente 2	P			0	450,000
	P(a)			0	450,000
	A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			56,524,550	158,208,532
		P(a)			56,524,550	158,208,532
		A			1,153,709	21,354,135

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
