

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1126	Chief of Operations Validation Date	10/23/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/21/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Strengthen the Public Investment System	Loan Number	2977/OC-CO
Executing Agency	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
Team Leader	ARISI, DIEGO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1126	8,000,000	8,000,000	25,000,000	0	33,000,000	8,000,000	6,887,730.56	86.10%	1,112,269.44
Aggregated	8,000,000	8,000,000	25,000,000	0	33,000,000	8,000,000	6,887,730.56	86.10%	1,112,269.44

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

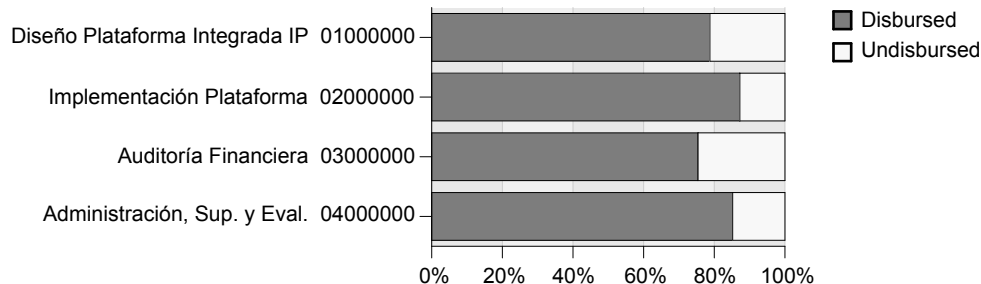

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejorar la transparencia en el uso de los recursos de inversión pública

Observation: fuente: Estadísticas de la Subdirección Territorial y de Inversión Pública del DNP. La línea de base se compone por el número de visitas al Sistema General de Regalías (SGR) y al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI).

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	EOP 2020
0.0	Número de visitas anuales a los sistemas de información en línea para los proyectos de inversión pública	Visitas	1,266,575.00	2012	P	4,051,414.00			4,051,414.00
					P(a)	4,051,414.00			4,051,414.00
					A				
Details									
Means of verification: Estadísticas de la Subdirección Territorial y de Inversión Pública- DNP									
Observations: La línea de base se compone por el número de visitas al Sistema General de Regalías (SGR) y al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI). Al finalizar el programa, la información sobre proyectos de inversión se publicará en un sistema único denominado Mapa Inversiones. Los detalles que soportan las proyecciones estimadas para el incremento de visitas se encuentran en el Enlace Opcional 9.									
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Los recursos de inversión pública nacional financiados con recursos provenientes con regalías estarán sujetos a un monitoreo y seguimiento que facilite la toma de decisiones y que permita la identificación de alertas tempranas

Observation: Fuente: Subdirección Territorial y de Inversión Pública y Dirección de Regalías del DNP.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2020
0.0	Porcentaje de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías cuya información está disponible on-line	Porcentaje	0.00	2013	P	100.00		100.00
					P(a)	100.00		100.00
					A			

Details

Means of verification: No. de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías cuya información está disponible on-line / No. de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías. Subdirección Territorial y de Inversión Pública- DNP / Sistemas DNP (<https://sgr.dnp.gov.co/>).

Observations: Aunque hoy en día hay información en la página del SGR, esta no es específica a ningún proyecto. Mapa Inversiones mostrara información sobre cada proyecto, no general, por lo que el valor de línea de base es 0%.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2020
0.0	Porcentaje de proyectos aprobados financiados con SGR registrados en el SUIFP con información completa	Porcentaje	10.00	2013	P	80.00		80.00
					P(a)	80.00		80.00
					A			

Details

Means of verification: No. de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías cuya información está completa / No. de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías DNP – Dirección de regalías

Observations: Por información completa se entiende que como mínimo está: (i) Ejecución financiera actualizada con corte a la normatividad establecida por el DNP. (ii) Ejecución física actualizada con corte a la normatividad establecida por el DNP. (iii) Proyectos georeferenciados (iv) Fotos de ejecución con corte a la normatividad establecida por el DNP. Datos de responsables actualizados de acuerdo a la normatividad establecida por el DNP.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 0: Reducción de los costos operativos y de transición vinculados al proceso de seguimiento de la inversión pública financiada con regalías

Observation: Fuente: Dirección de Regalías. Encuestas Secretarías de Planeación. Información Banco de Proyectos (SUIFP).

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2020
0.0	Tiempo promedio que dedica un funcionario del DNP en solicitar, enviar y procesar información para el monitoreo, seguimiento y control de los proyectos de inversión financiados con recursos de regalías	Días	30.00	2013	P	25.00		25.00
					P(a)	25.00		25.00
					A			

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: DNP. Encuesta a funcionarios Dirección de Regalías.

Observations: Se realizó una encuesta para estimar la línea de base. Los resultados de la misma, se encuentran disponibles en el enlace opcional No. 10. Será necesario realizar una encuesta de seguimiento en 2017, para verificar la reducción en tiempos.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2020
0.0	Tiempo promedio que dedican funcionarios de la Secretaría de Planeación municipal en la revisión y verificación de requisitos por proyecto a ser financiado con recursos de regalías	Días	14.29	2013	P	11.00		11.00
					P(a)	11.00		11.00
					A			

Details

Means of verification: Tiempo promedio que dedican funcionarios de la Secretaria de Planeación municipal en la revisión y verificación de requisitos por proyecto a ser financiados con recursos de regalías.

Observations: Se realizó una encuesta para estimar la línea de base. Los resultados de la misma, se encuentran disponibles en el enlace opcional No. 10. Se estima que el tiempo establecido en la norma de 5 días hábiles se alcanzará en 2019. Sera necesario realizar un encuesta de seguimiento en 2017, para verificar la reducción en tiempos.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	EOP 2020
0.0	Tiempo promedio que tarda un proyecto desde la formulación (inscripción inicial en el SUIFP) hasta la aprobación	Días	40.47	2013	P	30.00		30.00
					P(a)	30.00		30.00
					A			

Details

Means of verification: DNP – Dirección de regalías. Información Banco de Proyectos (SUIFP). Decreto 1949-2012.

Observations: Actualmente la información del Banco de Proyectos no incluye el tiempo entre formulación e inscripción en el Banco de Proyectos. En la encuesta realizada a los actores del sistema se estimó que el tiempo de proceso es más alto y puede llegar a ser del doble de este valor. Los resultados de la misma, se encuentran disponibles en el enlace opcional No. 10 . Será necesario realizar una encuesta de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la meta.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Diseño de una Plataforma Tecnológica Integrada de Inversión Pública

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2020	2020	EOP 2020
1.1	Análisis de procedimientos existentes y la elaboración de propuestas al marco regulatorio para el funcionamiento de la PII	Análisis	P		1		240,000
			P(a)	1	1	222,721.68	511,229
			A	0	0	0	288,507.32
1.2	Diseño, planificación, construcción y estabilización de la plataforma base de servicios y el módulo web de la nueva MGA	Herramienta Web	P		1		1,400,000
			P(a)	0	1	0	1,345,346.85
			A	0	1	0	1,345,346.85
1.3	Análisis del estado actual de sistemas de información, infraestructura tecnológica, bases de datos en utilización, recursos humanos y dimensionamiento de requerimientos	Análisis	P		1		840,000
			P(a)	0	1	0	103,844.81
			A	0	1	0	103,844.81
1.4	Plataforma Tecnológica Integrada de Inversión Pública diseñada	Plan	P		1		2,650,000
			P(a)	0	1	769,094.53	3,137,404.34
			A	0	1	0	2,368,309.81
1.5	Plan Organizacional para la gestión de contenido de la PII	Plan	P		1		220,000
			P(a)	1	1	55,784	55,784
			A	0	0	0	0
1.6	Propuesta de gestión de cambio y programa de entrenamiento e implementación de una estrategia de comunicaciones para MapalInversiones	Propuesta	P		1		220,000
			P(a)	1	1	60,000	60,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Implementación de la Plataforma Tecnológica Integrada de Inversión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2020	2020	EOP 2020
2.1	Implementación herramienta de visualización y georeferenciación de recursos y proyectos de inversión pública - MapalInversiones	Sistema	P		1		1,970,000
			P(a)	0	1	190,304.15	1,490,748
			A	0	1	0	1,300,443.85

Other Cost

	Auditoría Financiera		P				150,000
			P(a)			39,461.16	160,448
			A			6,039.9	127,026.74
	Administración, Supervisión y Evaluación		P				310,000
			P(a)			167,955.1	1,135,195
			A			24,884.02	992,123.92
	Módulo del Sistema General de Regalías (SGR) en la PII. Pilotos en entidades territoriales y un OCAD implementados. Asistencia técnica al diseño e implementación de la Plataforma. (Aporte Local)		P				25,000,000
			P(a)			17,549,889.12	25,000,000
			A			15,999.46	7,466,110.34

Total Cost

	Total Cost		P				33,000,000
			P(a)			19,055,209.74	33,000,000
			A			46,923.38	13,991,713.64

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation
