

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1302	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/16/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/16/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to support the equity and effectiveness of the social safety net in Argentina	<b>Loan Number</b>	4648/OC-AR, 4648/OC-AR-1, 4648/OC-AR-2, 4648/OC-AR-3, 4648/OC-AR-4, 4648/OC-AR-5
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Ministerio del Interior y Transporte, MINISTERIO DE EDUCACION	<b>Sector/Subsector</b>	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
<b>Team Leader</b>	TRISTAO, IGNEZ M.	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Argentina
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1302	900,000,000	900,000,000	0	0	900,000,000	900,000,000	892,600,000	99.18%	7,400,000
<b>Aggregated</b>	<b>900,000,000</b>	<b>900,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,000,000</b>	<b>900,000,000</b>	<b>892,600,000</b>	<b>99.18%</b>	<b>7,400,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

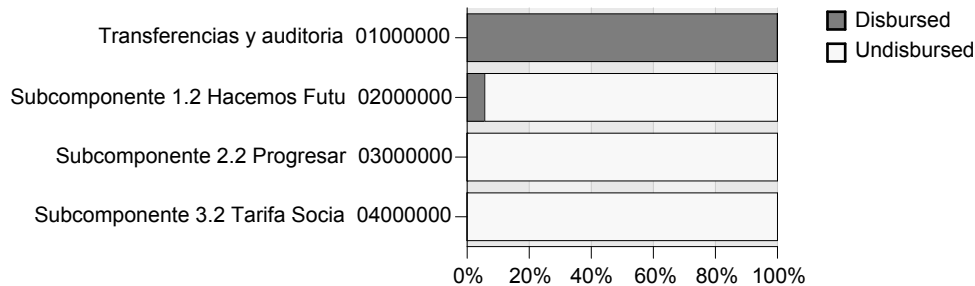

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Aumento del empleo registrado en el sector formal

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.0	Titulares de Hacemos Futuro que acceden a un empleo registrado en el sector formal	%	3.00	2017	P	5.00	5.00
					P(a)	5.00	5.00
					A		
Details							
Means of verification: Reporte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) en base a datos administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

**Impact Nbr. 1:** Aumento del porcentaje de jóvenes que aprueban las materias según el plan de estudios

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.0	Beneficiarios de Becas Progresar en el nivel superior que aprueban al menos 50% de las materias requeridas según su plan de estudios	%	20.00	2017	P	35.00	35.00
					P(a)	35.00	35.00
					A		
Details							
Means of verification: Reporte del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología (MECCT) en base a datos administrativos de las universidades y las instituciones de educación terciaria.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Impact Nbr. 2:** Mayor ahorro en transporte como porcentaje del gasto no alimentario

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
2.0	Ahorro promedio en gastos de transporte debido a la Tarifa Social como porcentaje del gasto no alimentario de los hogares de menores ingresos	%	4.00	2017	P	5.00	5.00
					P(a)	5.00	5.00
					A		
Details							
Means of verification: Cálculo en base a la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2012-2013 y datos del Ministerio de Transporte (MTR)							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Empleabilidad de población vulnerable mejorada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Titulares de Hacemos Futuro que acreditaron la finalización de cursos de formación laboral integral.	%	3.00	2017	P	60.00	60.00
					P(a)	60.00	60.00
					A	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Reporte del MSDS con base en datos administrativos de las instituciones homologadas y/o los certificados presentados por los titulares en ANSES.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.2	Titulares de Hacemos Futuro con secundario incompleto que asisten a un establecimiento educativo.	%	31.00	2017	P	45.00	45.00
					P(a)	45.00	45.00
					A	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Reporte del MSDS en base a los certificados presentados por los titulares en ANSES.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Regularidad educativa entre jóvenes de 18 a 24 años mantenida

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.0	Beneficiarios de las Becas Progresar en el nivel superior que mantiene la regularidad al finalizar el ciclo lectivo	%	49.00	2017	P	50.00	50.00
					P(a)	50.00	50.00
					A	50.77	

#### Details

**Means of verification:** Reporte del MECCT en base a información administrativa de las universidades e instituciones de educación terciaria a nivel nacional.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Acceso al servicio de transporte público por parte de la población vulnerable aumentado

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.0	Cobertura a nivel nacional del subsidio social a la tarifa de transporte	%	27.30	2017	P	29.30		29.30
					P(a)	29.30		29.30
					A	0.00		
Details								
Means of verification: Reporte del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) en base a datos administrativos del universo de beneficiarios potenciales.								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1: Empleabilidad de beneficiarios de programas de protección social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Personas por año que recibieron una transferencia de ingreso con contraprestación de formación	# of beneficiaries	P	0	285,602	0	438,200,000
			P(a)	0	371,130	0	438,200,000
			A	0	371,130	0	438,200,000
1.2	Instrumento de relevamiento de competencias y trayectorias laborales validado en terreno	Instrumento	P	0	1	0	68,000
			P(a)	0	1	0	68,000
			A	0	1	0	0
1.3	Sistema Integrado y Unificado (SIU) en funcionamiento	Sistema	P	1	1	1,605,000	1,932,000
			P(a)	0	1	0	1,932,000
			A	0	0	0	113,228

## Component Nbr. 2 Componente 2: Continuidad educativa de jóvenes de familias vulnerables

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Jóvenes de 18 a 30 años que recibieron transferencia de ingreso con una contraprestación educativa	# of students	P	0	360,621	0	185,535,000
			P(a)	0	793,855	0	185,535,000
			A	0	793,855	0	185,535,000
2.2	Sistema de Gestión Integral de Progresar en funcionamiento	Plataforma informática	P	1	1	1,000,000	2,300,000
			P(a)	0	1	100,000	2,300,000
			A	0	0	0	120,000

## Component Nbr. 3 Componente 3: Accesibilidad al transporte público

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	Número de usos de la tarjeta SUBE con el subsidio de la tarifa social	Número de usos	P	0	1,627,000,000	0	267,800,000
			P(a)	0	1,809,929,026	0	267,800,000
			A	0	1,809,929,026	0	267,680,000
3.2	Estudios para la mejora de los servicios de transporte público en AMBA	Informes	P		0		0
			P(a)		2		2,000,000
			A		0		0

## Component Nbr. 4 Componente 4: Apoyo al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
4.1	Sistema Integrado de Información Social desarrollado	Sistema	P	1	1	893,920	893,920
			P(a)	0	1	0	893,920
			A	0	0	0	0
4.2	Modelo de Gestión de la Información desarrollado	Modelo	P	1	1	355,560	355,560
			P(a)	0	1	0	355,560
			A	0	0	0	0
4.3	Plan de evaluación del programa finalizado	Plan	P	1	1	600,000	700,520
			P(a)	0	1	10,000	700,520
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Auditoría externa	P			60,000	215,000
		P(a)			52,177	215,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Auditoria externa	A			52,177	116,117
--	-------------------	---	--	--	--------	---------

Total Cost

	Total Cost	P			5,534,480	900,000,000
		P(a)			162,177	900,000,000
		A			52,177	891,764,345

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Encuesta de movilidad en troncales de transporte público finalizada	En la misión de administración realizada en junio de 2020, el equipo del Ministerio de Transporte informó al Banco que, debido al cambio de prioridades de política del sector, se eliminan los productos 3.2 "Encuesta de movilidad en troncales de transporte público finalizada", y 3.3 "Sistema de gestión de flota en funcionamiento" de la matriz de resultados, por lo que este producto fue marcado como inactivo.	Modify Output	Inactivate Output	NATALIAB	09/30/2020
	Estudios para la mejora de los servicios de transporte público en AMBA	En la misión de administración realizada en junio de 2020, el equipo del Ministerio de Transporte informó al Banco que, debido al cambio de prioridades de política del sector, se eliminan los productos 3.2 "Encuesta de movilidad en troncales de transporte público finalizada", y 3.3 "Sistema de gestión de flota en funcionamiento" de la matriz de resultados. Se están evaluando la realización de dos o tres estudios dirigidos a desarrollar propuestas, metodologías o estrategias que apunten a mejorar la movilidad en transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires, por lo que se incluyó este producto para reflejar estas actividades. Se prevé que la no objeción del Banco a los Términos de Referencia de estos estudios y el inicio de los procesos de selección y contratación de servicios de consultoría se realicen en 2020.	Create Output	N/A	NATALIAB	09/30/2020
			Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	NATALIAB	09/30/2020
				Modify Means of Verification	NATALIAB	09/30/2020
	Sistema Integrado y Unificado (SIU) en funcionamiento	En la misión de administración realizada en junio de 2020, el nuevo equipo del Ministerio de Desarrollo Social presentó la propuesta de plan de trabajo, la cual implica cambios a un producto de la Matriz de Resultados correspondiente al Subcomponente. El indicador 1.3, "Sistema predictivo de demanda laboral local en funcionamiento", será reemplazado por "Sistema Integrado y Unificado (SIU) en funcionamiento". El SIU tendrá la finalidad de relevar, sistematizar y consolidar información sobre la población y las políticas sociales desde una perspectiva integral y de derechos. En ese sentido, el SIU amplía el ámbito de acción de lo que se había planeado abordar con el sistema predictivo de la demanda laboral para abordar la integralidad de la asistencia que otorga el MDS. El SIU es una herramienta de gestión interna que consolidará información de las distintas áreas del propio Ministerio, para uso de las mismas, así como también de los gabinetes sociales de los gobiernos jurisdiccionales, lo cual permitirá fortalecer y mejorar su gestión. Por estos motivos, se actualizó el nombre del producto.	Modify Output	Modify Output name	NATALIAB	09/30/2020
	Sistema de gestión de flota en funcionamiento	En la misión de administración realizada en junio de 2020, el equipo del Ministerio de Transporte informó al Banco que, debido al cambio de prioridades de política del sector, se eliminan los productos 3.2 "Encuesta de movilidad en troncales de transporte público finalizada", y 3.3 "Sistema de gestión de flota en funcionamiento" de la matriz de resultados, por lo que este producto fue marcado como inactivo.	Modify Output	Inactivate Output	NATALIAB	09/30/2020

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
