

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1243	Chief of Operations Validation Date	10/23/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/21/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Strengthen Public Sector Strategic Management Capacities	Loan Number	4848/OC-CO
Executing Agency	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Team Leader	ARISI, DIEGO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1243	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	1,406,047	9.37%	13,593,953
Aggregated	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	1,406,047	9.37%	13,593,953

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

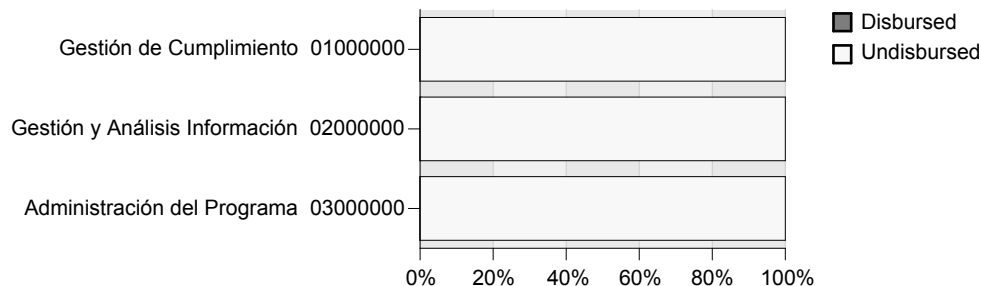

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejora en la efectividad gubernamental

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Índice de Efectividad Gubernamental (IEG)	Número	-0.07	2017	P	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	0.15	0.15
					P(a)	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	0.15	0.15
					A	0.00					

Details

Means of verification: Fuente: Worldwide Governance Indicators (WGI) project - Banco Mundial Responsable de recolección y reporte de datos: Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento (CGC - recolección) - Unidad Ejecutora (UEP) DAPRE (reporte)

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mejora en la capacidad de gestión de cumplimiento de PG

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Mejora en la calificación del gobierno en el índice de la Revisión de Capacidad de Cumplimiento (RCC - Delivery Capacity Review)	Número	2.21	2018	P	0.00	2.21	2.60	2.60	3.00	3.00
					P(a)	0.00	2.21	2.60	2.60	3.00	3.00
					A	0.00					

Details

Means of verification: Fuente: RCC (BID)

Observations: Responsable de recolección y reporte de datos: CGC (recolección) - (UEP) Dapre (reporte)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Mejora en la gestión de PG mediante el uso de TIC

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Prioridades gestionadas mediante el uso de datos masivos, analítica de datos y herramientas de visualización	Número	1.00	2018	P	0.00	1.00	3.00	5.00	6.00	6.00
					P(a)	0.00	1.00	3.00	5.00	6.00	6.00
					A	0.00					

Details

Means of verification: Fuente: Sistema de Gestión y Análisis de Información Gerencial de la Presidencia de la República

Observations: Responsable de recolección y reporte de datos: CGC (recolección) - Unidad Ejecutora (UEP) Dapre (reporte)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de capacidades de gestión de cumplimiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Modelo de Gestión del Cumplimiento (MGC) y plan de capacitación para aplicarlo en los ministerios y agencias responsables de implementar Prioridades Gubernamentales (PG) diseñado e implementado	Documento (MGC y plan de capac	P	0	1	457,910	500,000
			P(a)	0	1	260,895	500,000
			A	0	0	9,857.7	9,857.7
1.2	Funcionarios capacitados en el Modelo de Gestión del Cumplimiento (MGC)	Funcionarios capacitados	P	0	200	98,500	500,000
			P(a)	0	200	0	500,000
			A	0	0	0	0
1.3	Evaluaciones rápidas (Deep Dives) y/o estrategias especializadas de intervención para apoyar la gestión de la ejecución y el cumplimiento de Prioridades Gubernamentales (PG) realizadas	Documento (Evaluaciones/Estrat	P	10	18	834,000	1,500,000
			P(a)	10	18	834,000	1,500,000
			A	1	2	19,378.54	68,221.54
1.4	Coordinación e incorporación de buenas prácticas y conocimiento público privado al seguimiento y análisis de las Prioridades Gubernamentales (PG) realizada	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	93,700	500,000
			P(a)	1	5	93,700	500,000
			A	0	1	33,897.28	49,419.28
1.5	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 1 realizado – PG1	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	62,900	359,500
			P(a)	1	5	62,900	359,500
			A	0	1	25,839.29	35,399.29
1.6	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 2 realizado – PG2	Documento (análisis y seguimie	P	1	4	62,900	359,500
			P(a)	1	4	62,900	359,500
			A	0	0	13,731.15	13,731.15
1.7	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 3 realizado – PG3	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	67,200	359,500
			P(a)	1	5	67,200	359,500
			A	0	1	27,650.82	39,306.82
1.8	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 4 realizado – PG4	Documento análisis y seguimien	P	1	5	62,900	274,500
			P(a)	1	5	62,900	274,500
			A	0	1	25,868.11	30,897.11
1.9	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 5 realizado – PG5	Documento (análisis y seguimie	P	1	4	54,900	274,500
			P(a)	1	4	54,900	274,500
			A	0	0	17,453.49	17,453.49
1.10	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 6 realizado – PG6	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	62,900	274,500
			P(a)	1	5	62,900	274,500
			A	0	1	23,476.19	31,669.19
1.11	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 7 realizado – PG7	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	62,900	274,500
			P(a)	1	5	62,900	274,500
			A	0	1	30,198.48	40,469.48
1.12	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 8 realizado – PG8	Documento (análisis y seguimie	P	1	4	39,300	274,500
			P(a)	1	4	39,300	274,500
			A	0	0	14,198.47	14,198.47
1.13	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 9 REDAP (Transparencia) realizado – PG9	Documento (análisis y seguimie	P	1	4	145,400	274,500
			P(a)	1	4	145,400	274,500
			A	0	0	40,911.84	40,911.84
1.14	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 9 REDAP (Simplificación y digitalización de trámites) realizado - PG9	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	145,400	274,500
			P(a)	1	5	145,400	274,500
			A	0	1	41,363.13	55,598.13
1.15	Diagnósticos en temas clave para la definición del plan de cumplimiento de la REDAP realizados	Documento (diagnósticos en dos	P	2	2	781,500	850,000
			P(a)	0	2	0	850,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.15	Diagnósticos en temas clave para la definición del plan de cumplimiento de la REDAP realizados	Documento (diagnósticos en dos	A	0	0	0	0
1.16	Plan de cumplimiento de la REDAP con base en los diagnósticos realizados diseñado e implementado	Documento (plan de cumplimient	P	0	1	14,184	1,124,000
			P(a)	0	1	14,184	1,124,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de capacidades de gestión y análisis de información

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Funcionalidades de analítica de datos definidas e integración de sistemas de información del gobierno para analizar datos que afectan la gestión de Prioridades Gubernamentales (PG) desarrolladas	Sistema (software)	P	0	1	394,000	3,000,000
			P(a)	0	1	283,500	3,000,000
			A	0	0	0	0
2.2	Herramienta de visualización de información georreferenciada diseñada e implementada	Sistema (software)	P	0	1	0	1,000,000
			P(a)	0	1	0	1,000,000
			A	0	0	0	0
2.3	Funcionarios capacitados y actividades de gestión del cambio realizadas	Funcionarios capacitados	P	0	200	98,500	500,000
			P(a)	0	200	0	500,000
			A	0	0	0	0
2.4	Servicios de infraestructura y software adquiridos y operando	Documento (inventario de servi	P	1	4	283,300	1,500,000
			P(a)	0	4	0	1,500,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Coordinación y asistencia técnica	P			248,500	816,000
		P(a)			248,500	816,000
		A			58,083.7	89,402.7
	Auditorías	P			37,500	150,000
		P(a)			37,500	150,000
		A			0	0
	Evaluaciones	P			0	60,000
		P(a)			0	60,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			4,108,294	15,000,000
		P(a)			2,538,979	15,000,000
		A			381,908.19	536,536.19

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity
