

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1251	Chief of Operations Validation Date	10/23/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	11/02/20
Last Update	10/21/20	Country Representative Validation Date	11/20/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Strengthening Colombia's National Agency for Legal Defense of the State	Loan Number	4922/OC-CO
Executing Agency	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE
Team Leader	ARISI, DIEGO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1251	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	302,089.13	2.01%	14,697,910.87
Aggregated	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	302,089.13	2.01%	14,697,910.87

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

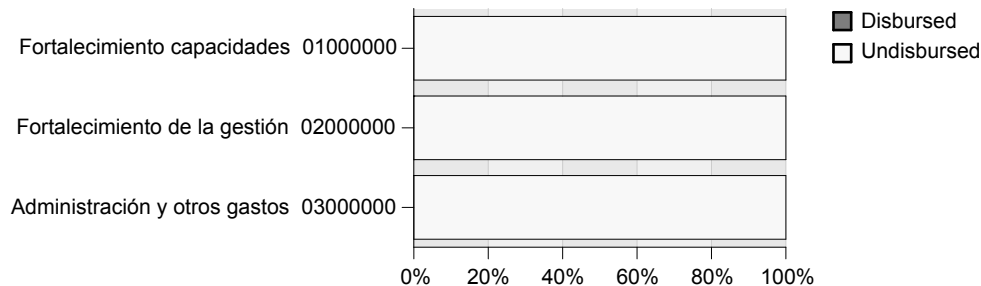

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejora en la eficiencia del SDJ en términos de ahorros potenciales reales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.0	Ahorros potenciales reales en millones de dólares	Ahorros potenciales reales medidos por los ahorros en los procesos en los que interviene o acompaña la ANDJE sobre el total de condenas/pretensiones	1,174.00	2018	P	1,200.00	1,586.00	2,538.00	3,173.00	3,173.00
					P(a)	1,200.00	1,586.00	2,538.00	3,173.00	3,173.00
					A					

Details

Means of verification: eKOGUI SIIF CHIP

Observations: 1 La relación condena /pretensión se calculó en 2018 en 30%. El programa contribuirá mediante ahorros potenciales reales medidos por $\Sigma \text{Valor pretensiones iniciales} - \text{valor estimado de Condena /pretensión de los procesos con fallo favorable} + \Sigma (\text{pretensiones iniciales de fallos desfavorables} - \text{valor estimado de Condena /pretensión} - \text{condenas ij}) + \Sigma \text{Pretensiones de casos con laudo favorable ij} + \Sigma (\text{pretensiones iniciales de Laudos desfavorables ij} - \text{condenas ij}) + \Sigma (\text{total condenas a empleados públicos por acción de repetición}) + (\text{valor total de los levantamientos de recursos públicos inembargables}) + \Sigma (\text{pretensiones iniciales ij} - \text{valor conciliación extrajudicial aprobado})$. Se escogió el indicador de ahorros potenciales reales y no ahorros potenciales porque se quiere mostrar un impacto atribuible a las acciones específicas a desarrollar en el marco del programa de acuerdo a la posibilidad real de éxito y no sobre las pretensiones totales sin tener en cuenta la relación condena/pretensión. 2 Cálculos realizados con una Tasa de Cambio de 1US\$ = COP\$3.151.

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Aumento en la eficacia de las herramientas de defensa jurídica

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.0	Porcentaje de reportes de información de conciliaciones prejudiciales en eKOGUI actualizados	No. de conciliaciones analizadas que fueron actualizadas/ No. de conciliaciones analizadas	18.00	2018	P	18.00	19.00	21.00	23.00	23.00
					P(a)	18.00	19.00	21.00	23.00	23.00
					A					

Details

Means of verification: eKOGUI

Observations: Se toma como variable proxi la actualización de la información en eKOGUI del estado de la conciliación para la entidad (activo ya terminado) tomando como fuente de contraste la información de la Procuraduría General de la Nación.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Aumento en la cobertura de procesos en los que interviene la ANDJE

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2024
2.0	Porcentaje de casos con mayores pretensiones en los que interviene la ANDJE	Casos en que interviene la ANDJE/ Total de casos	5.00	2018	P	5.00	10.00	15.00	20.00	20.00
					P(a)	5.00	10.00	15.00	20.00	20.00
					A					

Details

Means of verification: eKOGUI

Observations: 3 La ANDJE definió una estrategia de intervención judicial de los 500 procesos más cuantiosos, que representan el 68% de las pretensiones en contra del Estado por un valor de US\$81.000 millones. La estrategia está enfocada en 381 procesos judiciales de la jurisdicción contencioso-administrativa (US\$34.000 millones) y 119 acciones de grupo (US\$46.900 millones). Así mismo, la agencia diseñó e inició la implementación de una estrategia de negociación en 208 de los 1.490 procesos interadministrativos, cuyas pretensiones equivalen al US\$960 millones, es decir al 97% del total de pretensiones en este tipo de procesos. Con esto se busca implementar soluciones amistosas a los litigios interadministrativos reduciendo el impacto fiscal que tienen y mejorando la articulación interinstitucional.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Aumento en la transferencia de conocimiento para la ANDJE y el SDJ

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2024
3.0	Porcentaje de certificación en herramientas de defensa jurídica con enfoque de género	Abogadas certificadas en defensa	8.00	2018	P	8.00	16.00	24.00	30.00	30.00
					P(a)	8.00	16.00	24.00	30.00	30.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.0	Porcentaje de certificación en herramientas de defensa jurídica con enfoque de género	jurídica de ANDJE y SDJ/ Total de abogados del ANDJE y SDJ	8.00	2018	A					
Details										
Means of verification: eKOGUI										
Observations: 4 A la fecha del total de abogados (4.771) que defienden al Estado, el 32% son mujeres. De ellas se capacitaron 396 en 2018 equivalente al 8%.										
Pro-Gender	Yes					Pro-Ethnicity	No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de las capacidades de la ANDJE para mejorar la eficiencia de las entidades del nivel nacional que hacen parte del SDJ

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Modelo de Gestión Integral por resultados para la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica diseñado e implementado	Modelo	P	0	1	127,006	2,207,450
			P(a)	0	1	127,006	2,207,450
			A	0	0	0	0
1.2	Modelo de Arquitectura de Datos diseñado e implementado	Modelo	P	0	1	65,625	1,585,000
			P(a)	0	1	65,625	1,585,000
			A	0	0	0	0
1.3	Portafolio actual de productos y servicios diagnosticado y optimizado y nuevos productos y servicios del portafolio: (Gestión de casos, expediente electrónico, entre los principales) diseñados	Productos y servicios	P	0	1	66,164	3,175,000
			P(a)	0	1	66,164	3,175,000
			A		0	0	0
1.4	Herramienta para la Gestión de Grupos de Interés (CRM) diseñada e implementada	Herramienta	P	0	1	65,625	1,190,000
			P(a)	0	1	65,625	1,190,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la gestión del conocimiento basado en evidencia del SDJ del Estado

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Nuevos módulos de eKOGUI diseñados e implementados	Módulos	P	0	3	195,697	1,446,548
			P(a)	0	3	195,697	1,446,548
			A	0	0	0	0
2.2	Modelo predictivo y prospectivo diseñado y desarrollado (Tablero de control, modelo de analítica y calidad de datos y herramientas descriptivas de georreferenciación)	Herramientas	P	0	1	95,880	1,810,022
			P(a)	0	1	95,880	1,810,022
			A	0	0	0	0
2.3	Arquitectura de integración e interoperabilidad desarrollada e implementada	Modelo	P	0	1	32,769	837,304
			P(a)	0	1	32,769	837,304
			A		0	0	0
2.4	Estrategia de gestión de conocimiento diagnosticada, optimizada e implementada	Estrategia	P	0	1	166,349	769,369
			P(a)	0	1	166,349	769,369
			A		0	0	0
2.5	Protecciones de ciberseguridad desarrolladas	Herramientas	P	0	1	0	311,722
			P(a)	0	1	0	311,722
			A		0	0	0
2.6	Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC ejecutado	Plan	P	0	1	75,158	595,085
			P(a)	0	1	75,158	595,085
			A		0	0	0

Other Cost

Unidad Ejecutora	P			171,413	892,500
	P(a)			171,413	892,500
	A			44,277.02	44,277.02
Evaluaciones	P			0	80,000
	P(a)			0	80,000
	A			0	0
Auditorías	P			9,600	100,000
	P(a)			9,600	100,000
	A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			1,071,286	15,000,000
		P(a)			1,071,286	15,000,000
		A			44,277.02	44,277.02

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section
