

PMR Operational Report

Operation Number	PN-L1115	Chief of Operations Validation Date	11/02/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/30/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Integrated Health Service Networks Strengthening Program	Loan Number	3615/OC-PN
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	HEALTH-PRIMARY HEALTH CARE
Team Leader	SANCHEZ-MONIN, EMMANUELLE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Panama
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PANAMA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El MINSA ha iniciado el proceso de preparación del Plan de Manejo Desechos de las Unidades de Salud (PMDUS) para facilitar el control de los residuos hospitalarios y adicional ha programado una campaña de monitoreo de la calidad de las aguas servidas para posteriormente comenzar a la puesta de sistemas de tratamiento de aguas servidas. Igualmente, las obras no han todavía empezado.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PN-L1115	140,000,000	140,000,000	34,000,000	0	174,000,000	140,000,000	93,935,200.58	67.10%	46,064,799.42
Aggregated	140,000,000	140,000,000	34,000,000	0	174,000,000	140,000,000	93,935,200.58	67.10%	46,064,799.42

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

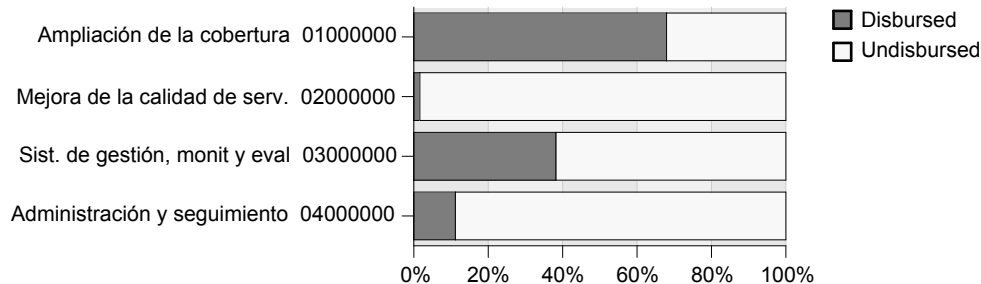

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Contribuir a la reducción de la mortalidad materna a través de una mayor cobertura y calidad de los servicios de salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.1	Razón de mortalidad materna en la comarca Ngabe Buglé	Muertes maternas	274.30	2012	P		251.00
					P(a)		251.00
					A		

Details

Means of verification: Contraloría General de la República (CGR)

Observations: Muertes maternas por 100.000 nacidos vivos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Razón nacional de mortalidad materna	Muertes maternas	55.60	2013	P		45.80
					P(a)		45.80
					A		

Details

Means of verification: Estadísticas Vitales – Contraloría General de la República (CGR)

Observations: Muertes maternas por 100.000 nacidos vivos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Contribuir a la reducción de la mortalidad infantil a través de una mayor cobertura y calidad de los servicios de salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Tasa nacional de mortalidad en <5 años	Muertes infantiles	19.00	2013	P		8.00
					P(a)		8.00
					A		

Details

Means of verification: Contraloría General de la República (CGR)

Observations: Muertes infantiles por 1.000 nacidos vivos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.1	Tasa de mortalidad en <5 años en la comarca Ngabe Buglé	Muertes infantiles	31.50	2012	P		16.40
					P(a)		16.40
					A		

Details

Means of verification: Contraloría General de la República (CGR)

Observations: Muertes infantiles por 1.000 nacidos vivos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Mejorar las condiciones de salud y nutrición de la población en situación de pobreza y pobreza extrema

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.0	Prevalencia de desnutrición crónica en niños <5 años en las comarcas Guna Yala y Emberá Wounaan	%	55.90	2015	P		48.00
					P(a)		48.00
					A		

Details

Means of verification: Encuestas de la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015

Observations: Puntaje z de talla para la edad. Puntaje z<-2 SD determina desnutrición crónica

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.1	Prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres embarazadas (medidos por índice de masa corporal) en la comarca Ngabe Buglé	%	52.70	2014	P		46.00
					P(a)		46.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de Monitoreo Nutricional de Unidades Básicas de Atención (UBA)

Observations: Método de cálculo: Numerador: peso en kilogramos/Denominador: altura en metros cuadrados. IMC>25 determina sobrepeso; IMC>30 determina obesidad (OMS)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.2	Prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres embarazadas (medidos por índice de masa corporal) en la comarca Emberá Wounaan	%	56.40	2014	P		49.00
					P(a)		49.00
					A		

Details

Means of verification: Informes de Monitoreo Nutricional de Unidades Básicas de Atención (UBA)

Observations: Método de cálculo: Numerador: peso en kilogramos/Denominador: altura en metros cuadrados. IMC>25 determina sobrepeso; IMC>30 determina obesidad (OMS)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 3: Contribuir a la reducción de las enfermedades no transmisibles a través de una mayor cobertura y calidad de los servicios de salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
3.0	Tasa nacional de mortalidad prematura (<70 años) por diabetes mellitus	Muertes prematuras	28.60	2013	P		21.60
					P(a)		21.60
					A		
Details							
Means of verification: Estadísticas Vitales - Contraloría General de la República (CGR)							
Observations: Método de cálculo: Numerador: número de muertes (de 30 a 69 años) por diabetes mellitus (códigosCID-10E10-E14) por 100.000 habitantes/Denominador: población residente (de 30 a 69 años)							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y nutrición de la población en situación de pobreza y pobreza extrema

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.0	Mujeres embarazadas captadas antes de la semana 13 de gestación	Porcentaje de mujeres embarazadas	82.00	2015	P	90.00		90.00
					P(a)	90.00		90.00
					A	0.00		

Details

Means of verification: Hoja HCPB; Tarjeta de control prenatal (CPN)

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de mujeres embarazadas del Patrón de Población Beneficiaria (PPB) captadas antes de la semana 13 de gestación en el semestre anterior; Denominador: Total de mujeres embarazadas del PPB

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Mujeres embarazadas afrodescendientes captadas antes de la semana 13 de gestación	P	
		P(a)	
		A	
	Mujeres embarazadas de la comarca Ngabe Buglé captadas antes de la semana 13 de gestación	P	
		P(a)	
		A	
	Mujeres embarazadas de la comarca Guna Yala captadas antes de la semana 13 de gestación	P	
		P(a)	
		A	
	Mujeres embarazadas de la comarca Emberá Wounaan captadas antes de la semana 13 de gestación	P	
		P(a)	
		A	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.1	Mujeres embarazadas que al final del 3er trimestre de gestación hayan completado al menos cuatro controles prenatales en UBA (por lo menos uno (1) en cada trimestre)	Porcentaje de mujeres embarazadas	71.00	2015	P	90.00		90.00
					P(a)	90.00		90.00
					A	0.00		

Details

Means of verification: Hoja HCPB, Tarjeta CPN

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de mujeres embarazadas del PPB que hayan cumplido 37 semanas de gestación o hayan completado su parto con 4 o más CPN en UBA (por lo menos uno cada trimestre); Denominador: Total de mujeres embarazadas del PPB que en el semestre hayan cumplido 37 semanas de gestación o hayan completado su parto.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Mujeres embarazadas afrodescendientes que al final del 3er trimestre de gestación hayan completado al menos cuatro controles prenatales en UBA (por lo menos uno (1) en cada trimestre)		P
			P(a)
			A
	Mujeres embarazadas de la comarca Ngabe Buglé que al final del 3er trimestre de gestación hayan completado al menos cuatro controles prenatales en UBA (por lo menos uno (1) en cada trimestre)		P
			P(a)
			A
	Mujeres embarazadas de la comarca Guna Yala que al final del 3er trimestre de gestación hayan completado al menos cuatro controles prenatales en UBA (por lo menos uno (1) en cada trimestre)		P
			P(a)
			A
	Mujeres embarazadas de la comarca Emberá Wounaan que al final del 3er trimestre de gestación hayan completado al menos cuatro controles prenatales en UBA (por lo menos uno (1) en cada trimestre)		P
			P(a)
			A

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.2	Mujeres embarazadas con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD	Porcentaje de mujeres embarazadas	85.00	2015	P	95.00		95.00
					P(a)	95.00		95.00
					A	0.00		

Details

Means of verification: Hoja HCPB, Tarjeta CPN

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de mujeres embarazadas del PPB con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD; Denominador: Total de Mujeres embarazadas del PPB

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Mujeres embarazadas afrodescendientes con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD		P
			P(a)
			A
	Mujeres embarazadas de la comarca Ngabe Buglé con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD		P
			P(a)
			A
	Mujeres embarazadas de la comarca Guna Yala con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD		P
			P(a)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Mujeres embarazadas de la comarca Guna Yala con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD				A			
	Mujeres embarazadas de la comarca Emberá Wounaan con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD				P			
					P(a)			
					A			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.3	Mujeres embarazadas en la comarca Ngabe Buglé que reportan haber comido fruta al menos una vez al día en los últimos siete días	Porcentaje de mujeres embarazadas	0.00	2016	P	10.00		
					P(a)	10.00		10.00
					A	0.00		

Details

Means of verification: Evaluación del Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C)

Observations: Línea de base no está disponible. Se espera una aumento de 10 puntos porcentuales durante el programa. Método de cálculo: Numerador: número de mujeres embarazadas que reportan haber comido fruta al menos una vez al día en los últimos siete días; Denominador: número de mujeres embarazadas en NB

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.4	Partos atendidos por personal calificado en UBA	Porcentaje de partos	83.00	2015	P	90.00		90.00
					P(a)	90.00		90.00
					A	0.00		

Details

Means of verification: Hoja HCPB, Tarjeta CPN

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de partos atendidos por personal calificado en UBA; Denominador: Total de mujeres embarazadas captadas del PPB que en el semestre han finalizado el tercer trimestre

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Partos de mujeres afrodescendientes atendidos por personal calificado en UBA				P			
					P(a)			
					A			
	Partos de mujeres de la comarca Ngabe Buglé atendidos por personal calificado en UBA				P			
					P(a)			
					A			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Partos de mujeres de la comarca Guna Yala atendidos por personal calificado en UBA				P			
					P(a)			
					A			
	Partos de mujeres de la comarca Emberá Wounaan atendidos por personal calificado en UBA				P			
					P(a)			
					A			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.5	Madres de <6 meses en las comarcas que alimentan a su niño/niña exclusivamente con leche materna	Porcentaje de madres	45.30	2013	P	55.30		55.30
					P(a)	55.30		55.30
					A			

Details

Means of verification: Encuestas SM2015 y Evaluación AIN-C

Observations: Método de Cálculo: Numerador: Número de madres de niños <6 meses que dicen haber alimentado exclusivamente con leche materna el día anterior; Denominador: Número de madres de niños <6 meses

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No			
	Madres de <6 meses en la comarca Ngabe Buglé que alimentan a su niño/niña exclusivamente con leche materna				P			
					P(a)			
					A			
	Madres de <6 meses en la comarca Guna Yala que alimentan a su niño/niñasexclusivamente con leche materna				P			
					P(a)			
					A			
	Madres de <6 meses en la comarca Emberá Wounaan que alimentan a su niño/niña exclusivamente con leche materna				P			
					P(a)			
					A			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.6	Madres en las comarcas que reportan haber iniciado la alimentación complementaria cuando sus niños/niñas cumplieron 6 meses.	Porcentaje de madres	88.00	2013	P	93.00		93.00
					P(a)	93.00		93.00
					A	0.00		

Details

Means of verification: Encuestas SM2015 y Evaluación AIN-C

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: Método de Cálculo: Numerador: Número de madres de niños de 6-11,9 meses que reportan haber iniciado la alimentación complementaria cuando sus niños cumplieron seis meses, en los últimos 6 meses; Denominador: Número de madres de niños de 6-11,9 meses

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Madres en la comarca Ngabe Buglé que reportan haber iniciado la alimentación complementaria cuando sus niños/niñas cumplieron 6 meses.	P	
		P(a)	
		A	
	Madres en la comarca Guna Yala que reportan haber iniciado la alimentación complementaria cuando sus niños/niñas cumplieron 6 meses.	P	
		P(a)	
		A	
	Madres en la comarca Emberá Wounaan que reportan haber iniciado la alimentación complementaria cuando sus niños/niñas cumplieron 6 meses.	P	
		P(a)	
		A	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2020	2021	EOP 2021
0.7	Niños/niñas que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo	Porcentaje de niños/niñas	0.00	2016	P	10.00	
					P(a)	10.00	10.00
					A	0.00	

Details

Means of verification: Expediente clínico (EC), tarjetas CCD

Observations: Línea de base no está disponible. Se espera un aumento de 10 puntos porcentuales durante el programa. Método de cálculo: Numerador: Número de niños que al cumplir un año de edad, en el semestre anterior, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo (CCD); Denominador: Total de niños del PPB, que hayan cumplido un año durante el semestre

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Niños que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo	P	
		P(a)	
		A	
	Niñas que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo	P	
		P(a)	
		A	
	Niños/niñas afrodescendientes que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo	P	
		P(a)	
		A	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Niños/niñas de la comarca Ngabe Buglé que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo				P			
					P(a)			
					A			
	Niños/niñas de la comarca Guna Yala que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo				P			
					P(a)			
					A			
	Niños/niñas de la comarca Emberá Wounaan que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo				P			
					P(a)			
					A			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.8	Niños/niñas <1 año con esquema de vacunación completo para su edad.	Porcentaje de niños/niñas	91.00	2015	P	95.00		95.00
					P(a)	95.00		95.00
					A	0.00		

Details

Means of verification: EC, tarjeta de vacunación

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de niños del PPB que hayan cumplido un año durante el semestre con esquema de vacunación completo para su edad (acorde a definiciones PAI, OPS); Denominador: Total de niños del PPB, que hayan cumplido un año durante el semestre

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No			
	Niños <1 año con esquema de vacunación completo para su edad.				P			
					P(a)			
					A			
	Niñas <1 año con esquema de vacunación completo para su edad.				P			
					P(a)			
					A			
	Niños/niñas afrodescendientes <1 año con esquema de vacunación completo para su edad.				P			
					P(a)			
					A			
	Niños/niñas de la comarca Ngabe Buglé <1 año con esquema de vacunación completo para su edad.				P			
					P(a)			
					A			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Niños/niñas de la comarca Guna Yala <1 año con esquema de vacunación completo para su edad.				P			
					P(a)			
					A			
	Niños/niñas de la comarca Emberá Wounaan <1 año con esquema de vacunación completo para su edad.				P			
					P(a)			
					A			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.9	Madres en la comarcas que dieron a sus niños/niñas <59 meses Sales de Rehidratación Oral y zinc en el último episodio de diarrea en las últimas dos semanas	Porcentaje de madres	0.60	2013	P	20.60		20.60
					P(a)	20.60		20.60
					A	0.00		

Details

Means of verification: Encuestas SM2015 y Evaluación AIN-C

Observations: Método de Cálculo: Numerador: número de madres que dieron a sus niños de 0-59 meses SRO y zinc en el último episodio de diarrea en las últimas dos semanas; Denominador: número de madres de niños de 0-59 meses que tuvieron al menos un episodio de diarrea en las últimas dos semanas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No			
	Madres en la comarca Ngabe Buglé que dieron a sus niños/niñas <59 meses Sales de Rehidratación Oral y zinc en el último episodio de diarrea en las últimas dos semanas				P			
					P(a)			
					A			
	Madres en la comarca Guna Yala que dieron a sus niños/niñas <59 meses Sales de Rehidratación Oral y zinc en el último episodio de diarrea en las últimas dos semanas				P			
					P(a)			
					A			
	Madres en la comarca Emberá Wounaan que dieron a sus niños/niñas <59 meses Sales de Rehidratación Oral y zinc en el último episodio de diarrea en las últimas dos semanas				P			
					P(a)			
					A			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.10	Niños/niñas de 12-59 meses en las comarcas que recibieron dos dosis de tratamiento antiparasitario en el último año.	Porcentaje de niños/niñas	8.70	2013	P	38.70		38.70
					P(a)	38.70		38.70
					A	0.00		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Fuente: Encuestas SM2015 y Evaluación AIN-C

Observations: Método de Cálculo: Numerador: número de niños de 12-59 meses del PPB que recibieron 2x tratamiento antiparasitario en el último año; Denominador: número de niños de 12-59 meses del PPB

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Niños/niñas de 12-59 meses en la comarca Ngabe Buglé que recibieron dos dosis de tratamiento antiparasitario en el último año.		P
			P(a)
			A
	Niños/niñas de 12-59 meses en la comarca Guna Yala que recibieron dos dosis de tratamiento antiparasitario en el último año.		P
			P(a)
			A
	Niños/niñas de 12-59 meses en la comarca Emberá Wounaan que recibieron dos dosis de tratamiento antiparasitario en el último año.		P
			P(a)
			A

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2020	2021	EOP 2021
0.11 Niños/niñas de 1-4 años que tienen al menos dos CCD realizados en el semestre anterior	Porcentaje de niños/niñas	0.00	2016	P	10.00	
				P(a)	10.00	10.00
				A	0.00	

Details

Means of verification: EC, tarjetas CCD

Observations: Línea de base no está disponible. Se espera un aumento de 10 puntos porcentuales durante el programa. Método de cálculo: Numerador: Número de niños del PPB que hayan cumplido 2,3,4 y 5 años durante el semestre anterior y que tengan al menos dos registros con fechas diferentes en las tarjetas de CCD durante el último año para cada corte de edad; Denominador: Total de niños del PPB que hayan cumplido 2,3,4 y 5 años durante el semestre

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Niños de 1-4 años que tienen al menos dos CCD realizados en el semestre anterior		P
			P(a)
			A
	Niñas de 1-4 años que tienen al menos dos CCD realizados en el semestre anterior		P
			P(a)
			A

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2020	2021	EOP 2021
0.12 Niños/niñas que al cumplir 2, 3, 4, y 5 años	Porcentaje de	85.00	2015	P	90.00	90.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.12	cuenten con esquema de vacunación completo	niños/niñas	85.00	2015	P(a)	90.00		90.00
					A	0.00		

Details

Means of verification: EC, tarjeta de vacunación

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de niños del PPB que al cumplir 2, 3, 4 y 5 años cuenten con esquema de vacunación completo (acorde a definiciones PAI, OPS); Denominador: Total de niños del PPB que hayan cumplido 2, 3, 4 y 5 años durante el semestre

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Niños que al cumplir 2, 3, 4, y 5 años cuenten con esquema de vacunación completo	P	
		P(a)	
		A	
	Niñas que al cumplir 2, 3, 4, y 5 años cuenten con esquema de vacunación completo	P	
		P(a)	
		A	

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.13	Mujeres de 20 años y más que se les realiza una toma de muestra de citología cérvico-vaginal anual	Porcentaje de mujeres	2015	P	70.00		70.00
				P(a)	70.00		70.00
				A	0.00		

Details

Means of verification: EC, tarjeta de control de citología

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de mujeres del PPB de 20 a 70 años con toma de muestra de citología cérvico vaginal en los doce meses anteriores a la finalización del semestre; Denominador: Total de Mujeres de 20 a 70 años del PPB

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
0.14	Adultos sintomáticos respiratorios con toma de baciloscopia	P	25.00
		P(a)	25.00
		A	0.00

Details

Means of verification: Tarjeta de registro y seguimiento, Expediente C y libro de registro de laboratorio

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de adultos sintomáticos respiratorios captados en el último semestre con toma de baciloscopia; Denominador: Número de adultos sintomáticos respiratorios esperados del PPB en el último semestre

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Hombres sintomáticos respiratorios con toma de baciloscopia		P
			P(a)
			A
	Mujeres sintomáticos respiratorios con toma de baciloscopia		P
			P(a)
			A

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.15	Pacientes diabéticos captados que han recibido tratamiento según la norma del MINSA	Porcentaje de pacientes diabéticos	39.00	2015	P	65.00	65.00
					P(a)	65.00	65.00
					A	0.00	

Details

Means of verification: Expediente Clínico, Tarjeta de registro y seguimiento

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de pacientes diabéticos captados que han recibido tratamiento en el último semestre según la norma del MINSA; Denominador: Número de pacientes diabéticos del PPB

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Paciente hombres diabéticos captados que han recibido tratamiento según la norma del MINSA		P
			P(a)
			A
	Paciente mujeres diabéticas captadas que han recibido tratamiento según la norma del MINSA		P
			P(a)
			A

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.16	Pacientes hipertensos captados que han recibido el tratamiento según la norma del MINSA	Porcentaje de pacientes hipertensos	18.00	2015	P	65.00	65.00
					P(a)	65.00	65.00
					A	0.00	

Details

Means of verification: Expediente Clínico, Tarjeta de registro y seguimiento

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de pacientes hipertensos captados que han recibido el tratamiento en el último semestre según la norma del MINSA; Denominador: Número de pacientes hipertensos del PPB

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No			
	Pacientes hombres hipertensos captados que han recibido el tratamiento según la norma del MINSA				P			
					P(a)			
					A			
	Pacientes mujeres hipertensas captadas que han recibido el tratamiento según la norma del MINSA				P			
					P(a)			
					A			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Ampliación de la cobertura de la Cartera Priorizada de Prestaciones (CPP) y formento de la demanda

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Número de personas que recibieron al menos un servicio de la CPP en el año reportado	Número de personas	P	380,000	380,000	14,866,916.21	65,405,522.4
			P(a)	100,000	200,000	15,000,000	106,895,541.86
			A	73,060	73,060	11,318,965.8	89,214,507.66
1.2	Número de agentes comunitarios activos en la Red Comunitaria.	Agentes	P	1,900	1,900	6,057,929	23,096,605
			P(a)	350	450	200,000	705,776
			A	299	299	0	155,776
1.3	Número de mujeres embarazadas que reciben apoyos comunitarios	Mujeres	P	800	2,600	2,418,450	6,018,450
			P(a)	300	1,721	100,000	1,877,563.47
			A	270	1,391	0	1,527,563.47
1.4	Número de comunidades céntricas donde el MINSA implementa la estrategia Nutrividas	Comunidades	P	37	37	18,000	73,500
			P(a)	70	90	80,000	356,730
			A	61	37	0	126,730
1.5	Comunidades de las comarcas indígenas donde MINSA inició implementación de la estrategia de cambio de comportamiento y consejería en Planificación Familiar en el período reportado.	Comunidades	P	0	3	0	500,000
			P(a)	0	50	0	0
			A	0	0	0	0
1.6	Equipos de Respuesta Rápida para contención de COVID-19 activos (un equipo es una enfermera, una medica y un conductor)	equipo de respuesta	P		0		0
			P(a)	40	60	2,500,000	4,500,000
			A	40	40	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2: Fortalecimiento de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) y mejora de la calidad de los servicios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Número de regiones de salud con redes de salud conformadas	Número de regiones	P	3	12	0	10,000
			P(a)	3	4	750,000	985,692
			A	2	2	0	185,692
2.2	Número de centros de salud y hospitales con adecuaciones de infraestructura	Número de centros de salud	P	10	41	12,862,343.66	47,999,998.6
			P(a)	0	12	1,370,000	37,113,740
			A	0	0	0	0
2.3	Número de centros de salud y hospitales regionales de referencia equipados	Número de centros de salud y h	P	12	41	500,000	5,625,000
			P(a)	0	12	0	6,910,000
			A	0	0	172,109.5	172,109.5
2.4	Número de protocolos de atención actualizados	Número de protocolos	P	0	48	0	220,000
			P(a)	2	130	100,000	376,600.65
			A	0	126	0	226,600.65
2.5	Número de personal de salud capacitados en la aplicación de protocolos de atención actualizados tomando en cuenta elementos multiculturales	Número de personal	P	0	740	18,000	73,500
			P(a)	120	240	0	30,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3: Apoyo a los sistemas de gestión, monitoreo y evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	Documento de diagnóstico de infraestructura del MINSA central elaborado	Documento elaborada	P	0	1	0	40,125
			P(a)	0	1	0	45,026.41
			A	0	1	0	45,026.41
3.2	Sistema de información diseñado	Sistema de información diseñad	P	0	1	0	168,000
			P(a)	0	2	30,000	262,307.2
			A	0	2	36,176.7	248,483.9
3.3	Número de centros de salud y hospitales equipado con hardware y software para operación del sistema de información	Número de centros de salud y h	P	5	41	333,333.5	2,000,000
			P(a)	0	84	0	151,522.15
			A	0	84	0	151,522.15
3.4	Número de captadores de datos y técnicos de registros capacitados para el manejo del sistema de información y en uso de tecnologías innovadoras	Número de captadores de datos	P	0	135	0	64,432
			P(a)	100	450	0	3,345
			A	41	291	0	3,345
3.5	Documento de estrategia de comunicación con pertinencia cultural y enfoque de género implementada	Documento implementada	P	0	1	188,890	755,560
			P(a)	0	0	50,000	50,000
			A	0	0	0	0
3.6	Evaluaciones de impacto y cualitativas finalizadas	Evaluaciones finalizadas	P	0	5	0	2,445,900
			P(a)	0	2	0	736,309.32
			A	0	1	0	236,309.32
3.7	Encuesta Nacional de Salud finalizada	Encuesta finalizada	P	1	1	0	2,500,000
			P(a)	1	1	2,200,000	4,413,687.9
			A	0	0	0	2,213,687.9

Other Cost

Supervisión Técnica para el Monitoreo y Supervisión de la CPP	P			256,155	1,114,620
	P(a)			200,000	623,679.09
	A			0	233,678.72
Supervisión Administrativa y Financiera de la CPP	P			73,188.75	322,755
	P(a)			30,000	116,348
	A			0	66,348
Administración del Programa	P			1,200,000	4,875,000
	P(a)			1,451,721.36	5,811,166.11
	A			505,106.77	4,564,551.52
Auditoria financiera	P				0
	P(a)			192,740	432,585.62
	A			118,074.5	157,920.12

Total Cost

Total Cost	P			40,764,759.62	174,000,000
	P(a)			24,304,461.36	174,000,000
	A			12,150,433.27	101,082,231.54

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Atenciones COVID realizadas (detección o traslado)	Se crea este Hito para recoger la información de producción de servicios bajo los contratos COVID-19.	Create Milestone	N/A	EMMAM	10/29/2020
	Comunidades de las comarcas indígenas donde MINSA inició implementación de la estrategia de cambio de comportamiento y consejería en Planificación Familiar en el período reportado.	Este producto no se podrá lograr y el tema ha sido abordado a través de otras intervenciones de capacitación del personal y en la comunidad, pero la estrategia de cambio de comportamiento y consejería comunitaria fue prevista inicialmente como una consultoría grande, contratada con la asociación de planificación familiar. El contrato llegó a ser suscrito por el Ministerio y la fundación pero la Contraloría General de la República en su control previo se negó a refrendar dicho contrato indicando que el precio era excesivo. El Ministerio no ha podido proponer una alternativa de intervención. Se desactiva este producto en este ciclo.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIMITRAS	10/29/2020
	Documento consolidado al cabo de la experiencia de estrategias comunitarias elaborado (MINSA)	Se actualiza la planificación de este producto, afectado por la pandemia ya que las intervenciones en campo fueron suspendidas entre marzo y octubre, y siguen limitadas con medidas de prevención del contagio.	Modify Milestone	Modify Milestone name	EMMAM	10/29/2020
	Documento de Estrategia de aseguramiento de la calidad elaborada	Desde finales del 2019 se ha acordado con el Ejecutor que este producto no podría ser abordado. En este caso, no solamente por priorizar el producto de extensión de cobertura y los productos de infraestructura y equipamiento del segundo componente, para los cuales se ha venido aumentando el costo, sino también porque la forma de desarrollar implicaba asistencia técnica con consultores externos además de trabajo de la institución, y a partir del 2017, las autoridades tanto de la Contraloría como del Ministerio han limitado la posibilidad de invertir en este tipo de intervención. El trabajo de mejora de la calidad no se ha abandonado del todo, ya que se han mejorado los mecanismos de implementación, supervisión y auditoría de la estrategia de extensión de cobertura, alineando estos mecanismos con los protocolos de atención, y se ha apoyado el proceso de auditoría de expedientes que realiza el departamento de Monitoreo y Evaluación de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Se desactiva oficialmente est producto en este ciclo.	Modify Output	Inactivate Output	EMMAM	10/30/2020
	Documento de estrategia de comunicación con pertinencia cultural y enfoque de género implementada	Se actualiza la planificación de este producto, para el cual podría ameritar desactivar en el ciclo siguiente. No se desactiva ya que no se ha acordado con el ejecutor, no obstante, la consultoría inicial para desarrollar la estrategia es una de las acciones que fue vetada por las autoridades por representar un costo alto en consultoría.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EMMAM	10/30/2020
	Equipos de Respuesta Rápida para contención de COVID-19 activos (un equipo es una enfermera, una medica y un conductor)	Se crea este producto, bajo el componente de extensión de cobertura y fomento de la demanda, para registrar la asignación y ejecución de los recursos destinados a la atención a la pandemia. El producto consiste en canalizar recursos a las Direcciones regionales de salud y a empresas privadas (Organizaciones Extrainsitucionales conocidas como OE) para que constituyan equipos de respuesta rápida, móviles, para despacharlos cuando se identifica un caso sospechoso y para realizar investigación de contactos. El Convenio / Contrato combina esta intervención con el sostener los servicios esenciales que normalmente captura el producto 1.1 del programa. El mecanismo de rendición y pago permitirá registrar la ejecución final, entre estos dos productos. Se ha dado la no objeción a las OE por hasta 1,98 millones y a las regiones por hasta 2,4 millones de dólares. que podrían ejecutarse en bajo este producto en 2020 y el primer semestre de 2021. Adicionalmente, recogimos bajo el producto original 1.1 la compra de insumos por 945 mil dólares, y bajo el producto de "Centros de salud Equipados" en el segundo componente compra por 172 mil dólares, para COVID, para los cuales no se vio necesario crear nuevo producto dado que los montos son muy poco significativos a la escala del programa. El total de recursos aprobados a la fecha para COVID bajo este programa es de 5,5 millones de dólares, a reflejarse en la ejecución financiera del 2020 y 2021.	Create Output	N/A	EMMAM	10/29/2020
			Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	EMMAM	10/29/2020
				Modify Means of Verification	EMMAM	10/29/2020
	Norma de	Desde finales del 2019 se ha acordado con el Ejecutor que este producto no podría ser abordado. En este caso, no solamente por	Modify	Inactivate	EMMAM	10/30/2020

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	habilitación de establecimientos de salud actualizada	priorizar el producto de extensión de cobertura y los productos de infraestructura y equipamiento del segundo componente, para los cuales se ha venido aumentando el costo, sino también porque la forma de desarrollar implicaba asistencia técnica con consultores externos además de trabajo de la institución, y a partir del 2017, las autoridades tanto de la Contraloría como del Ministerio han limitado la posibilidad de invertir en este tipo de intervención. Sobre habilitación, lo que se podrá avanzar dentro del programa es documentar el proceso de dimensionamiento de los proyectos de infraestructura, en ausencia de una norma consolidada de habilitación, y dejar las recomendaciones para, en un futuro, retomar el esfuerzo de sistematización de las normas en cuanto a la tipificación de establecimientos de salud, condiciones para su puesta en marcha, incluyendo planes médico funcionales de base, y relaciones dentro de una red integrada, incluyendo una estrategia de desarrollo prospectivo de la red de establecimientos. Se desactiva oficialmente est producto en este ciclo.	Output	Output		
	Número de agentes comunitarios activos en la Red Comunitaria.	Se actualiza la planificación de este producto, afectado por la pandemia ya que las intervenciones en campo fueron suspendidas entre marzo y octubre, y siguen limitadas con medidas de prevención del contagio.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EMMAM	10/29/2020
				Modify Physical EOP P(a)	EMMAM	10/29/2020
	Número de centros de salud y hospitales con adecuaciones de infraestructura	Se actualiza la planificación de este producto, afectado por la pandemia ya que las intervenciones en campo fueron suspendidas entre marzo y octubre, y siguen limitadas con medidas de prevención del contagio.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EMMAM	10/30/2020
	Número de centros de salud y hospitales regionales de referencia equipados	Se actualiza la planificación de este producto. En este año 2020 se ha intensificado el esfuerzo por licitar los proyectos para los cuales se cuenta ahora con un diseño final y una estimación de costos y calendario mucho más precisa que en los ciclos anteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EMMAM	10/30/2020
	Número de comunidades céntricas donde el MINSA implementa la estrategia Nutrивidas	Se actualiza la planificación de este producto, afectado por la pandemia ya que las intervenciones en campo fueron suspendidas entre marzo y octubre, y siguen limitadas con medidas de prevención del contagio.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EMMAM	10/29/2020
				Modify Unit of Measure	EMMAM	10/29/2020
	Número de comunidades céntricas donde el MINSA	Desde finales del 2018 se ha acordado con el Ejecutor que este producto no podría ser abordado. En este caso, porque dependía de la ejecución y ampliación del programa de Salud Mesoamérica en Panamá, programa que fue cancelado a finales del noviembre de 2018. Se logró identificar planes de inversión necesarios en áreas rurales, pero otra coordinación con el sub-sector de Agua (la Dirección de Sistemas de Agua Potable, Acueductos y Saneamiento para la zona rural, DISAPAS), pero no así como asegurar su implementación por	Modify Output	Inactivate Output	EMMAM	10/30/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	implementa la estrategia de mejora de calidad del agua en el hogar	esta dirección y con presupuestos complementarios que no entraron en el alcance de este programa. Se desactiva oficialmente est producto en este ciclo.				
	Número de mujeres embarazadas que reciben apoyos comunitarios	Se actualiza la planificación de este producto, afectado por la pandemia ya que las intervenciones en campo fueron suspendidas entre marzo y octubre, y siguen limitadas con medidas de prevención del contagio. Además, se actualiza redacción del output.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EMMAM	10/29/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIMITRAS	10/29/2020
	Número de personas que recibieron al menos un servicio de la CPP en el año reportado	Se actualiza la planificación de este producto, afectado por la pandemia ya que las intervenciones en campo fueron suspendidas entre marzo y octubre, y siguen limitadas con medidas de prevención del contagio. Además, se actualiza redacción del output.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EMMAM	10/30/2020
				Modify Physical EOP P(a)	EMMAM	10/29/2020
	Número de regiones de salud con redes de salud conformadas	Ajuste a la planificación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EMMAM	10/30/2020
	Número de áreas del MINSA central adecuadas	Desde finales del 2019 se ha acordado con el Ejecutor que este producto no podría ser abordado, por priorizar el producto de extensión de cobertura y los productos de infraestructura y equipamiento del segundo componente, para los cuales se ha venido aumentando el costo. Se desactiva oficialmente en este ciclo.	Modify Output	Inactivate Output	EMMAM	10/30/2020
	Otras atenciones ambulatorias de servicios esenciales realizadas (atención a	Se crea este Hito para recoger la información de producción de servicios bajo los contratos COVID-19.	Create Milestone	N/A	EMMAM	10/29/2020

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Embarazada, vacunación del niño o atención primaria a crónicos)					

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
Project Management Capacity
Stakeholder Priorities
