

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	DR-L1067	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/23/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/23/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Strengthening of the Management for Results of the Sector Health in Dominican Republic	<b>Loan Number</b>	2973/OC-DR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	<b>Sector/Subsector</b>	HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
<b>Team Leader</b>	GONZALEZ ACERO, CAROLINA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Dominican Republic
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DOMINICANA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1067	146,000,000	146,000,000	0	0	146,000,000	146,000,000	141,464,749.21	96.89%	4,535,250.79
Aggregated	146,000,000	146,000,000	0	0	146,000,000	146,000,000	141,464,749.21	96.89%	4,535,250.79

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

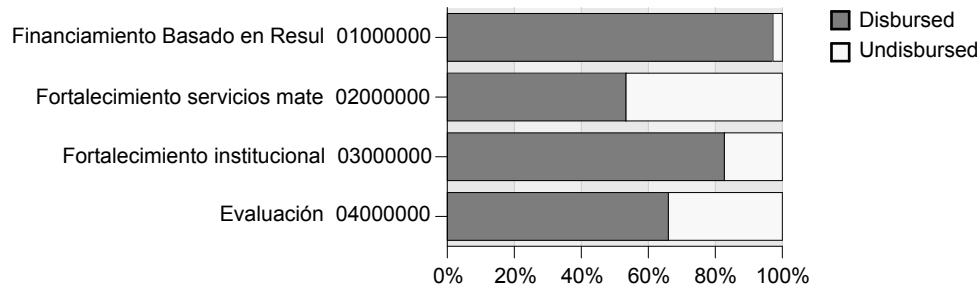

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Acceso de la población pobre a los servicios de salud mejorado y morbi-mortalidad materna e infantil disminuida

##### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
1.1	Población pobre I-II (SIUBEN) no cubierta por ningún régimen con acceso garantizado a los servicios de salud primer nivel a través del FBR, en las cinco regiones de salud del Proyecto	Personas	0.00	2013	P		72,025.00		288,100.00		288,100.00
					P(a)		72,025.00		288,100.00		403,304.00
					A		80,955.00		288,100.00		

##### Details

**Means of verification:** Reportes de auditorias concurrentes

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
1.2	Mortalidad materna disminuida en los seis hospitales en los que se implementará el Modelo de Centros de Excelencia CIME Materno Infantil (CEMI)	Porcentaje	155.00	2013	P		8.00		30.00		30.00
					P(a)			8.00	30.00		30.00
					A		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00

##### Details

**Means of verification:** Formulario EPI-2/Reportes SIGHO

**Observations:** The baseline will be calculated in 2015

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	EOP 2020
1.3	Mortalidad infantil disminuida en los hospitales en que se implementará el CEMI	Porcentaje	24.00	2013	P		8.00		30.00		30.00
					P(a)			8.00	30.00		30.00
					A		0.00	0.00	0.00	43.00	43.00

##### Details

**Means of verification:** Formulario EPI-2/Reportes del SIGHO

**Observations:** The baseline will be calculated in 2015

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Mejorar la asignación del gasto en salud mediante la expansión del FBR, con especial énfasis en el primer nivel de atención

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Porcentaje de mujeres de mujeres embarazadas con evaluación de riesgo del embarazo realizada antes de la semana 15 de embarazo en las cinco regiones del Proyecto, aumentada	Porcentaje	2.98	2013	P		15.00	30.00	50.00			50.00
					P(a)		15.00	30.00	50.00	70.00		70.00
					A		15.00	28.76	62.70	48.07	0.00	42.15

#### Details

**Means of verification:** Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

**Observations:** Cuatrimestral

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Porcentaje de mujeres púrpuras referidas del hospital a su unidad de atención primaria correspondiente con la documentación adecuada incluida en los archivos clínicos del centro de salud en las cinco regiones del Proyecto, aumentado.	Porcentaje	0.79	2013	P		20.00	30.00	60.00			60.00
					P(a)		10.00	30.00	60.00	70.00		70.00
					A		10.00	29.63	67.29	45.98	0.00	40.52

#### Details

**Means of verification:** Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

**Observations:** Cuatrimestral

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Porcentaje de menores de 15 meses con esquema de vacunación completo según protocolo nacional en las cinco regiones del Proyecto, aumentado	Porcentaje	6.79	2013	P		20.00	30.00	60.00			60.00
					P(a)		10.00	30.00	60.00	100.00		100.00
					A		10.00	50.85	100.00	31.81	0.00	97.33

#### Details

**Means of verification:** Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

**Observations:** Cuatrimestral

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Porcentaje de niños mayores de 15 meses y menores de 24 meses con esquema de vacunación	Porcentaje	1.80	2013	P		20.00	30.00	60.00			60.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.1	completo según protocolo nacional en las cinco regiones del Proyecto, aumentado	Porcentaje	1.80	2013	P(a)		10.00	30.00	60.00	100.00		100.00
					A		10.00	32.21	100.00	23.88	0.00	73.60

#### Details

**Means of verification:** Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

**Observations:** Cuatrimestral

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Porcentaje de niños menores de 24 meses con controles de desarrollo y crecimiento completo según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.54	2013	P		20.00	30.00	60.00			60.00
					P(a)		10.00	30.00	60.00	70.00		70.00
					A		10.00	18.73	64.98	7.73	0.00	25.98

#### Details

**Means of verification:** Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

**Observations:** Cuatrimestral

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Porcentaje de individuos sintomáticos respiratorios captados con resultados de baciloscopia documentado en centro de primer nivel en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.81	2013	P		10.00	30.00	50.00			50.00
					P(a)		10.00	30.00	50.00	100.00		100.00
					A		10.00	30.85	100.00	38.52	0.00	32.98

#### Details

**Means of verification:** Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Hombres mayores de 18 años tamizados para hipertensión arterial según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	12.44	2013	P		10.00	30.00	50.00			50.00
					P(a)		10.00	30.00	50.00	80.00		80.00
					A		10.00	46.01	50.21	49.25	0.00	37.62

#### Details

**Means of verification:** Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Hombres diagnosticados con hipertensión arterial en tratamiento según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	2.51	2013	P		10.00	30.00	50.00			50.00
					P(a)		10.00	30.00	50.00	80.00		80.00
					A		10.00	15.12	37.33	11.01	0.00	37.60

#### Details

**Means of verification:** Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Hombres mayores de 18 años con tamizaje para diabetes según protocolo nacional (screening diabetes) en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.20	2013	P		10.00	30.00	50.00			50.00
					P(a)		10.00	30.00	50.00	80.00		80.00
					A		0.00	20.91	43.50	37.66	0.00	30.00

#### Details

**Means of verification:** Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Hombres diagnosticados con Diabetes tipo II en tratamiento según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	1.77	2013	P		10.00		50.00			50.00
					P(a)		10.00	10.00	50.00	80.00		80.00
					A		0.00	12.94	37.14	12.27	0.00	37.97

#### Details

**Means of verification:** Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Porcentaje de población SIUBEN I y II con carnets de afiliación al régimen subsidiado en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.00	2013	P		30.00		80.00			80.00
					P(a)		30.00	69.50	0.00	80.00		80.00
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Details

**Means of verification:** Informes de empresa encargada de elaboración y entrega de carnets / reportes de auditorías concurrentes

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Cantidad de dependientes afiliados al régimen subsidiado que poseen información de acta de nacimiento en la base de datos de afiliados del SENASA en las cinco regiones del proyecto, aumentado.	Dependientes	0.00	2013	P		50,000.00		120,000.00			120,000.00
					P(a)		50,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Details

**Means of verification:** Reporte de Base de Datos del SENASA

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.2	Mujeres mayores de 18 años tamizadas para hipertensión arterial según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	5.68	2013	P		10.00	30.00	50.00			50.00
					P(a)		10.00	30.00	50.00	80.00		80.00
					A		10.00	0.00	76.15	79.68	0.00	79.68

#### Details

**Means of verification:** Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.2	Mujeres diagnosticadas con hipertensión arterial en tratamiento según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	1.16	2013	P		10.00		50.00			50.00
					P(a)		10.00		50.00	80.00		80.00
					A		10.00		71.40	20.19	0.00	20.19

#### Details

**Means of verification:** Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.2	Mujeres mayores de 18 años con tamizaje para diabetes según protocolo nacional (screening diabetes) en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.06	2013	P		10.00		50.00			50.00
					P(a)		10.00	10.00	50.00	80.00		80.00
					A		0.00	0.00	72.70	62.11	0.00	62.11

#### Details

**Means of verification:** Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.2	Mujeres diagnosticadas con Diabetes tipo II en tratamiento según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.67	2013	P		10.00		50.00			50.00
					P(a)		10.00	10.00	50.00	80.00		80.00
					A		0.00	0.00	72.13	24.25	0.00	24.25
Details												
Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)												
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		No				

**Outcome Nbr. 1:** Contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil mediante la expansión de una estrategia de mejoras gerenciales en los servicios de salud de segundo y tercer nivel

#### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
1.1	Hospitales con SIGHO implementado y en funcionamiento en los hospitales en que se implementará el CEMI.	Sistema	0.00	2013	P		3.00		9.00			12.00
					P(a)		0.00		9.00	3.00		12.00
					A		0.00		9.00	0.00	0.00	12.00
Details												
Means of verification: Reportes anuales de evaluación emitidos por la Dirección de Tecnología de Información del MISPAS												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
1.1	Porcentaje de muertes maternas e incidentes auditados por los Comités de Maternidad Segura con al menos una de las medidas correctivas implementadas en los hospitales en que se implementará el CEMI.	Porcentaje	0.00	2013	P		30.00		95.00			95.00
					P(a)		30.00		95.00	95.00		95.00
					A		44.00		28.00	0.00	0.00	62.00
Details												
Means of verification: Actas de las sesiones del Comité												
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
1.1	Porcentaje de las muertes neonatales auditadas por los Comités de Maternidad Segura con al menos una de las medidas correctivas implementadas en los hospitales en que se implementará el CEMI.	Porcentaje	0.00	2013	P		30.00		95.00			95.00
					P(a)		30.00		95.00	95.00		95.00
					A		1.00		0.00	0.00	0.00	15.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details												
Means of verification: Actas de las sesiones del Comité												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
1.1	Porcentaje de mujeres que reciben tratamiento activo de la tercera etapa del parto en los hospitales en que se implementará el CEMI, aumentado .	Porcentaje	0.00	2013	P		25.00		90.00			90.00
					P(a)		0.00	25.00	90.00	90.00		90.00
					A		59.00	0.00	82.00	88.00	0.00	88.00
Details												
Means of verification: Reportes de Descripción de Parto obtenido en la primera etapa del registro físico de cada paciente, una vez implementado el SIGHO												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				



## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 I. Financiamiento de prestaciones basado en resultados (FBR) en salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2020	2020	EOP 2020
1.1	Población pobre SIUBEN 1 y 2 adscripta a un centro de atención primaria en las cinco regiones del proyecto aumentada	# of beneficiaries	P		1,448,100		130,000,000
			P(a)	0	1,448,100	538,805	129,806,815.76
			A	0	1,448,100	357,885	129,625,895.76

## Component Nbr. 2 II. Calidad de los servicios de salud materno infantil fortalecida

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2020	2020	EOP 2020
2.1	Hospitales certificados como centros de excelencia materno-infantil (CEMI) aumentados	Hospitales	P		10		272,000
			P(a)	4	4	3,601	641,977.59
			A	0	0	3,374	641,750.59
2.2	Hospitales con infraestructura mejorada para proveer servicios de salud materno-infantil	Hospitales	P		6		3,178,100
			P(a)	0	4	119,500	2,391,800.71
			A	0	0	115,757	2,388,057.71
2.3	Hospitales con mobiliario y equipos mejorados para proveer servicios de salud materno-infantil	Hospitales	P		6		1,130,000
			P(a)	12	12	3,209,763	3,484,082.56
			A	0	0	221,217	495,536.56
2.4	Personal de salud de los hospitales en que se implementará el CEMI capacitado en programas Cuidados Obstétricos de Emergencia	Personas	P		200		2,415,999.98
			P(a)	0	205	0	217,695.53
			A	0	205	0	217,695.53
2.5	Personal de salud del área de perinatología de los hospitales en que se implementará el CEMI capacitado en sepsis neonatal	Personas	P		150		539,000
			P(a)	0	150	0	20,636.98
			A	0	150	0	20,636.98
2.6	Embarazadas vinculadas a los hospitales en que se implementara el CEMI capacitadas en sesiones de preparación al parto	Beneficiarias	P		50		1,122,000
			P(a)	0	50	0	7,805
			A	0	50	0	7,805

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 III. Función de rectoría del sector salud fortalecida

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2020	2020	EOP 2020
3.1	Plan decenal de salud 2016-2025 terminado	Plan	P		1		160,000
			P(a)	0	1	0	278,633.64
			A	0	1	0	278,633.64
3.2	Función de análisis de monitoreo y evaluación del desempeño del MISPAS fortalecida	Unidad	P		1		150,000
			P(a)	1	1	21,706	179,872.43
			A	1	1	13,842.23	172,008.66
3.3	Fortalecimiento de la Dirección de Habilitación	Normas	P		1		30,000
			P(a)	0	1	0	60,308.67
			A	0	1	0	60,308.67
3.4	Normas nacionales para la regulación del sector salud elaboradas	Normas	P		1		70,000
			P(a)	0	2	9,646	64,210.8
			A	0	2	2,978.3	57,543.1
3.5	Expediente Integrado de Salud implementado	Sistema	P		1		3,000,000
			P(a)	1	1	281,669	2,451,610.63
			A	0	0	281,621.56	2,451,563.19
3.6	Red Nacional de Sangre en funcionamiento	Red	P		0		0
			P(a)	1	1	694,621	895,988.26
			A	0	0	125,352.15	326,719.41
3.7	Pruebas realizadas en el laboratorio nacional para fortalecer diagnóstico de Covid-19	Pruebas	P		0		0
			P(a)	100,000	100,000	1,521,026	1,521,026
			A		0		0

## Component Nbr. 4 IV. Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2020	2020	EOP 2020
4.1	Evaluación del Programa	Evaluación	P		1		50,000
			P(a)	0	1	0	33,000
			A	0	1	0	33,000

## Other Cost

	Contratación personal UCP	P				2,525,702.03
		P(a)			119,466	1,474,331.2
		A			33,217.4	1,388,082.6
	Gerentes de Campo FBR (Componente I)	P				400,300
		P(a)			0	313,608.53
		A				313,608.53
	Gerentes de Campo CEMI (Componente II)	P				351,000
		P(a)			56,157	765,693.36
		A			30,898.78	740,435.14
	Gastos operativos visitas a regiones de salud para la implementación del FBR (Componente I)	P				178,000
		P(a)			0	23,205.97
		A				23,205.97
	Gastos operativos visitas a hospitales (Componente II)	P				120,000
		P(a)			34,136	77,900.55
		A			204.42	43,968.97
	Adquisición de vehículos para apoyo a las regiones en la implementación del FBR (Componente I)	P				60,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Adquisición de vehículos para apoyo a las regiones en la implementación del FBR (Componente I)	P(a)			0	39,218.43
		A				39,218.43
	Adquisición de vehículos para apoyo a las regiones en la implementación del CEMI (Componente II)	P				60,000
		P(a)			0	39,218.43
		A				39,218.43
	Readecuación física oficina UCP	P				0
		P(a)			0	285,167.44
		A				285,167.44

Total Cost

	Total Cost	P				146,000,000
		P(a)			6,610,096	145,073,808.47
		A			1,186,347.84	139,650,060.31

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact	Mortalidad infantil disminuida en los hospitales en que se implementará el CEMI	La información incluida corresponde a la reportada por el equipo que trabajo en el componente. Son datos del 2019 que es el mismo año en el que finalizó el componente.	Modify Impact Indicator	Modify Historical Actual	CGONZALEZ	10/06/2020
	Mortalidad materna disminuida en los seis hospitales en los que se implementará el Modelo de Centros de Excelencia CIME Materno Infantil (CEMI)	La información incluida corresponde a la reportada por el equipo que trabajo en el componente. Son datos del 2019 que es el mismo año en el que finalizó el componente.	Modify Impact Indicator	Modify Historical Actual	CGONZALEZ	10/06/2020
Output	Embarazadas vinculadas a los hospitales en que se implementara el CEMI capacitadas en sesiones de preparación al parto	La reorganización de varias actividades cuyos gastos habían sido registrados por el Organismo Ejecutor bajo categorías no correspondientes a los productos correctos, ha requerido la modificación de los gastos que habían sido reportados en años anteriores, para cada uno de los productos. Se ha procedido con la actualización conforme a la información presentada por el Ejecutor para este reporte (ver archivo Excel anexo).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AWILDAC	10/05/2020
				Modify Financial Historical Actual	AWILDAC	10/05/2020
	Evaluación del Programa	La evaluación se ajusto ya que fue realizada en el 2019.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIMITRAS	10/21/2020
	Expediente Integrado de Salud implementado	La reorganización de varias actividades cuyos gastos habían sido registrados por el Organismo Ejecutor bajo categorías no correspondientes a los productos correctos, ha requerido la modificación de los gastos que habían sido reportados en años anteriores, para cada uno de los productos. Se ha procedido con la actualización conforme a la información presentada por el Ejecutor para este reporte (ver archivo Excel anexo).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/21/2020
				Modify Financial Historical Actual	AWILDAC	10/05/2020
	Fortalecimiento de la Dirección de Rehabilitación	La reorganización de varias actividades cuyos gastos habían sido registrados por el Organismo Ejecutor bajo categorías no correspondientes a los productos correctos, ha requerido la modificación de los gastos que habían sido reportados en años anteriores, para cada uno de los productos. Se ha procedido con la actualización conforme a la información presentada por el Ejecutor para este reporte (ver archivo Excel anexo).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/21/2020
				Modify Financial Historical Actual	AWILDAC	10/05/2020

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Función de análisis de monitoreo y evaluación del desempeño del MISPAS fortalecida	La reorganización de varias actividades cuyos gastos habían sido registrados por el Organismo Ejecutor bajo categorías no correspondientes a los productos correctos, ha requerido la modificación de los gastos que habían sido reportados en años anteriores, para cada uno de los productos. Se ha procedido con la actualización conforme a la información presentada por el Ejecutor para este reporte (ver archivo Excel anexo).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/21/2020
				Modify Financial Historical Actual	AWILDAC	10/05/2020
	Hospitales certificados como centros de excelencia materno-infantil (CEMI) aumentados	La reorganización de varias actividades cuyos gastos habían sido registrados por el Organismo Ejecutor bajo categorías no correspondientes a los productos correctos, ha requerido la modificación de los gastos que habían sido reportados en años anteriores, para cada uno de los productos. Se ha procedido con la actualización conforme a la información presentada por el Ejecutor para este reporte (ver archivo Excel anexo).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/21/2020
				Modify Financial Historical Actual	AWILDAC	10/05/2020
	Hospitales con infraestructura mejorada para proveer servicios de salud materno-infantil	La reorganización de varias actividades cuyos gastos habían sido registrados por el Organismo Ejecutor bajo categorías no correspondientes a los productos correctos, ha requerido la modificación de los gastos que habían sido reportados en años anteriores, para cada uno de los productos. Se ha procedido con la actualización conforme a la información presentada por el Ejecutor para este reporte (ver archivo Excel anexo).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/21/2020
				Modify Financial Historical Actual	AWILDAC	10/05/2020
	Hospitales con mobiliario y equipos mejorados para proveer servicios de salud materno-infantil	La reorganización de varias actividades cuyos gastos habían sido registrados por el Organismo Ejecutor bajo categorías no correspondientes a los productos correctos, ha requerido la modificación de los gastos que habían sido reportados en años anteriores, para cada uno de los productos. Se ha procedido con la actualización conforme a la información presentada por el Ejecutor para este reporte (ver archivo Excel anexo).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/21/2020
				Modify Financial Historical Actual	AWILDAC	10/05/2020
	Normas nacionales para la regulación del sector salud elaboradas	La reorganización de varias actividades cuyos gastos habían sido registrados por el Organismo Ejecutor bajo categorías no correspondientes a los productos correctos, ha requerido la modificación de los gastos que habían sido reportados en años anteriores, para cada uno de los productos. Se ha procedido con la actualización conforme a la información presentada por el Ejecutor para este reporte (ver archivo Excel anexo).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the	DIMITRAS	10/21/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Normas nacionales para la regulación del sector salud elaboradas	La reorganización de varias actividades cuyos gastos habían sido registrados por el Organismo Ejecutor bajo categorías no correspondientes a los productos correctos, ha requerido la modificación de los gastos que habían sido reportados en años anteriores, para cada uno de los productos. Se ha procedido con la actualización conforme a la información presentada por el Ejecutor para este reporte (ver archivo Excel anexo).	Modify Output	Financial P(a).		
				Modify Financial Historical Actual	AWILDAC	10/05/2020
	Personal de salud de los hospitales en que se implementará el CEMI capacitado en programas Cuidados Obstétricos de Emergencia	La reorganización de varias actividades cuyos gastos habían sido registrados por el Organismo Ejecutor bajo categorías no correspondientes a los productos correctos, ha requerido la modificación de los gastos que habían sido reportados en años anteriores, para cada uno de los productos. Se ha procedido con la actualización conforme a la información presentada por el Ejecutor para este reporte (ver archivo Excel anexo).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AWILDAC	10/05/2020
				Modify Financial Historical Actual	AWILDAC	10/05/2020
	Personal de salud del área de perinatología de los hospitales en que se implementará el CEMI capacitado en sepsis neonatal	La reorganización de varias actividades cuyos gastos habían sido registrados por el Organismo Ejecutor bajo categorías no correspondientes a los productos correctos, ha requerido la modificación de los gastos que habían sido reportados en años anteriores, para cada uno de los productos. Se ha procedido con la actualización conforme a la información presentada por el Ejecutor para este reporte (ver archivo Excel anexo).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AWILDAC	10/05/2020
				Modify Financial Historical Actual	AWILDAC	10/05/2020
	Plan decenal de salud 2016-2025 terminado	La reorganización de varias actividades cuyos gastos habían sido registrados por el Organismo Ejecutor bajo categorías no correspondientes a los productos correctos, ha requerido la modificación de los gastos que habían sido reportados en años anteriores, para cada uno de los productos. Se ha procedido con la actualización conforme a la información presentada por el Ejecutor para este reporte (ver archivo Excel anexo).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AWILDAC	10/05/2020
				Modify Financial Historical Actual	AWILDAC	10/05/2020
	Población pobre SIUBEN 1 y 2 adscripta a un centro de atención primaria en las cinco regiones del proyecto aumentada	La reorganización de varias actividades cuyos gastos habían sido registrados por el Organismo Ejecutor bajo categorías no correspondientes a los productos correctos, ha requerido la modificación de los gastos que habían sido reportados en años anteriores, para cada uno de los productos. Se ha procedido con la actualización conforme a la información presentada por el Ejecutor para este reporte (ver archivo Excel anexo).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/21/2020
				Modify Financial Historical	AWILDAC	10/05/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Población pobre SIUBEN 1 y 2 adscripta a un centro de atención primaria en las cinco regiones del proyecto aumentada	La reorganización de varias actividades cuyos gastos habían sido registrados por el Organismo Ejecutor bajo categorías no correspondientes a los productos correctos, ha requerido la modificación de los gastos que habían sido reportados en años anteriores, para cada uno de los productos. Se ha procedido con la actualización conforme a la información presentada por el Ejecutor para este reporte (ver archivo Excel anexo).	Modify Output	Actual		
	Pruebas realizadas en el laboratorio nacional para fortalecer diagnóstico de Covid-19	<p>La República Dominicana ha sido uno de los países afectados por la pandemia del COVID-19, registrándose los primeros casos en marzo y el posterior cierre de oficinas en abril. Hasta ese momento los proyectos se ejecutaban según la última planificación de noviembre 2019, que incluía el cierre financiero de la operación en agosto; no obstante, el cambio abrupto en la dirección de la política sanitaria del gobierno, obligado para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el COVID, ha colocado al Ministerio de Salud Pública como punta de lanza, arrastrando con esto, la reorientación de las actividades y recursos en todos los planes existentes.</p> <p>Como medida de gestión del cambio y mitigación del impacto el equipo de proyectos realizó consultas y reuniones con los interesados clave (autoridades, clientes y beneficiarios) a fin de reorientar los recursos y actividades que fueron desestimadas.</p> <p>El fruto de esta estrategia ha sido enfocar actividades en los objetivos de Fortalecer la calidad de los servicios de salud y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud en alineación con lo contemplado en el convenio de préstamo; resultando en el ejercicio de planificación dos productos que apoyan estos resultados:</p> <p>a) "Laboratorio Nacional Fortalecido para el Diagnóstico COVID-19" : el objetivo específico es apoyar al laboratorio nacional con insumos para pruebas diagnósticas del COVID-19, buscando alcanzar una población de 100,000 personas.</p> <p>Se esta conversando con el Ministerio para definir si los recursos remanentes se destinaran a gastos recurrentes de COVID-19.</p>	Create Output	N/A	AWILDAC	10/05/2020
	Red Nacional de Sangre en funcionamiento	La reorganización de varias actividades cuyos gastos habían sido registrados por el Organismo Ejecutor bajo categorías no correspondientes a los productos correctos, ha requerido la modificación de los gastos que habían sido reportados en años anteriores, para cada uno de los productos. Se ha procedido con la actualización conforme a la información presentada por el Ejecutor para este reporte (ver archivo Excel anexo).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/21/2020
				Modify Financial Historical Actual	AWILDAC	10/05/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Intra/Inter Coordination
Others - Fiduciary Dimensions
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Management Capacity
