

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1080	Chief of Operations Validation Date	11/13/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	11/18/20
Last Update	11/12/20	Country Representative Validation Date	11/18/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Women City	Loan Number	4551/OC-DR
Executing Agency	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT
Team Leader	VILLANUEVA, MARIA TERESA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Dominican Republic
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	There is not currently an EA for the project and it is unclear how the operation will proceed, the previous EA conducted site clearing, including the cutting of a considerable onumber of mature trees, for the Santiago site before a site specific ESA was completed.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1080	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	58,866.39	0.29%	19,941,133.61
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	58,866.39	0.29%	19,941,133.61

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

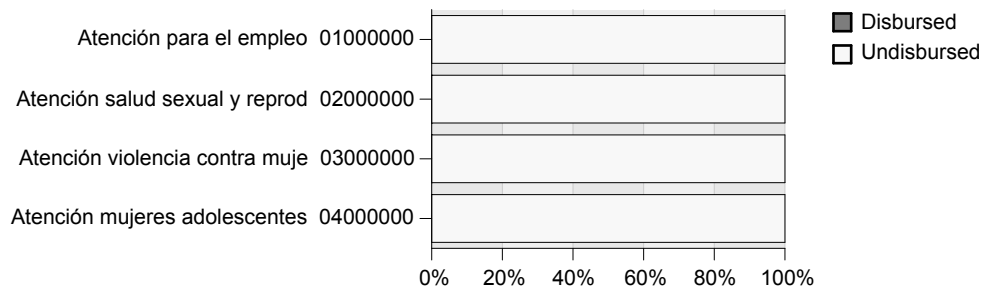

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Reducir la Tasa de mortalidad materna

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.0	Tasa de mortalidad materna en el Gran Santo Domingo y Santiago	Tasa	85.10	2014	P		84.50
					P(a)		84.50
					A		
Details							
Means of verification: Ministerio de Salud Pública							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Impact Nbr. 1: Reducir la Tasa de mortalidad por cáncer de mama y cérvico uterino

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Tasa de mortalidad por cancer cérvico-uterino y de mama en el GSD y Santiago	Tasa	26.80	2015	P		26.40
					P(a)		26.40
					A		
Details							
Means of verification: OMS (Número de muertes) y ONE (Proyecciones de Población)							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Impact Nbr. 3: Aumentar la tasa de ocupación laboral femenina

Observation:

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.1	Tasa de ocupación laboral (TOL) femenina	%	39.70	2015	P		39.90
					P(a)		39.90
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 4: Disminuir la violencia íntima de pareja

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
4.0	Mujeres (15-64 años), alguna vez casadas o unidas, que han sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte de la pareja o ex pareja en el territorio objetivo.	%	17.80	2013	P		16.30
					P(a)		16.30
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta para Evaluación de Impacto							
Pro-Gender		Yes		Pro-Ethnicity		No	

Impact Nbr. 5: Reducir la tasa de Embarazo en Adolescentes

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
5.0	Mujeres (15-19 años) que al momento de la encuesta ya tuvieron hijos o están embarazadas por primera vez en el territorio objetivo	%	17.80	2013	P		16.20
					P(a)		16.20
					A		
Details							
Means of verification: SIUBEN							
Pro-Gender		Yes		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Incrementar el porcentaje de mujeres de 15-64 años ocupadas en el territorio objetivo.

Observation: Los indicadores que se han eliminado y han sido sustituidos por otros indicadores son aquellos que la consultoría para revisar, actualizar líneas de base y fuentes de verificación en mayo 2020, indicó que no eran medibles y/o que las fuentes de verificación habían desaparecido. Las metas de los indicadores de provisión de servicios en los territorios objetivo se han estimado en función de las proyecciones realizadas por la consultoría, teniendo en cuenta el impacto de COVID19 en la recaudación de recursos públicos. Las metas de la provisión de servicios del modelo de atención integral a la mujer se han estimado con base en los datos observados en el primer año de funcionamiento de Ciudad Mujer en El Salvador. Las metas y líneas de base se revisarán y actualizarán cuando se disponga de datos observados para proyectar el impacto económico del COVID en 2020.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Tasa de ocupación femenina en el territorio objetivo	%	43.50	2019	P				22.71	22.71
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, BCRD

Observations: Redacción del indicador: La redacción del indicador varía respecto de la inicialmente recogida en la MR para que coincida con la variable que recoge esta información en el sistema nacional que se toma como fuente de verificación. Racionalidad de los datos: La población femenina ocupada en 2019 en Santo Domingo es de 110.941 personas. La población de mujeres de 10 a 64 años en Santo Domingo Norte en 2019 es de 254 mil personas. La tasa media de variación anual de 2017-2019 para Santo Domingo Norte se ha estimado en 1,0260%. El efecto de la pandemia COVID19 en la destrucción de empleo en República Dominicana se ha estimado en un 50% siguiendo estimaciones del Ministerio de Trabajo. El aporte del modelo integral de atención a la mujer se estima en 2023 de un 0,01% en Santo Domingo Norte.

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Mujeres entre 16 y 64 años que han recibido capacitación laboral en el territorio objetivo	%	5.80	2019	P				4.20	10.60
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Numerador: INFOTEP; Denominador: Encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, BCRD

Observations: Redacción del indicador: la redacción del indicador varía respecto de la inicialmente recogida en la MR debido a que el concepto "económicamente activas" no está presente en el sistema estadístico nacional, por lo que se ha eliminado de la redacción del indicador. El rango de edad se ha corregido para hacerlo coincidir con los que utiliza la fuente de verificación seleccionada. Racionalidad de los datos: La meta proyectada se basa en datos estimados del efecto de la pandemia COVID en el déficit público y el recorte de servicios públicos no sanitarios, previniéndose una reducción de aproximadamente un 25% de la oferta de capacitación de INFOTEP en el territorio objetivo. El aporte del primer centro de atención integral a la mujer en Santo Domingo Norte para el primer año se estima en un 0,2%.

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Mujeres que han recibido servicios de autonomía económica a través del modelo integral de atención a la mujer y que han accedido a una entrevista laboral en un plazo máximo de 3 meses posterior a	#	0.00	2020	P				34.00	34.00
					P(a)					
					A					

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.2	finalizar su capacitación	#	0.00	2020							
Details											
Means of verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer											
Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provisión d											
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity		No				
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Mujeres que han completado cursos de capacitación empresarial a través del modelo integral de atención a la mujer.	#	0.00	2020	P					116.00	116.00
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer											
Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi											
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity		No				
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.4	Mujeres que han completado cursos de formación técnico-vocacional a través del modelo integral de atención a la mujer	#	0.00	2020	P					391.00	391.00
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer											
Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi											

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: 2. Reducir la tasa de mortalidad materna y por cáncer de mama y cérvico-uterino en mujeres de 15 años o más en el territorio objetivo

Observation: La eliminación de los indicadores de mortalidad materna se justifica con los informes de la consultoría de revisión de indicadores que muestra que la medición es compleja y los datos poco precisos. Los datos de citología y mamografía publicados por los sistemas nacionales se refieren únicamente a las pruebas realizadas en centros públicos de tercer nivel. Se recomienda gestionar con el Ministerio de salud para que la citología y mamografía referida por el Centro a lugares de 1 y 2 nivel, así como las hechas en el mismo centro, sean incorporadas en las estadísticas.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Promedio de controles prenatales realizados por nacimiento en el territorio objetivo	#	0.46	2019	P					0.57	0.57
					P(a)						
					A						

Details

Means of verification: Servicio Nacional de Salud y proyecciones de población de la ONE

Observations: Redacción del indicador: el concepto de "embarazo no deseado" no existe como tal en el sistema nacional de estadísticas. Tampoco existe el dato de "número de controles prenatales por mujer o por nacimiento", por lo que no es posible saber cuántos controles se hace cada mujer, el sistema únicamente recoge cuántos controles prenatales se realizan en los centros públicos de tercer nivel de atención. La opción más aproximada al espíritu de medición del indicador es el promedio de controles por nacimiento. Racionalidad de los datos: El indicador muestra el número promedio de controles prenatales que se realizan por nacimiento. La meta incluye el impacto de los datos estimados de producción en el centro de atención integral a la mujer.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.1	Mujeres que se practicaron una citología vaginal o prueba detectora de cáncer vaginal en el territorio objetivo.	%	1.30	2019	P					4.63	4.63
					P(a)						
					A						

Details

Means of verification: Estadísticas Ministerio de Salud Pública y proyección de datos de población de la ONE

Observations: Redacción del indicador: se elimina el rango de edad previsto en la redacción original del indicador en la MR del diseño, porque el sistema nacional no permite filtrar por edad la información. Para el denominador, se ha tomado el rango de edad en el que la población femenina dominicana estar sexualmente activa. Racionalidad de los datos: Los datos se refieren a los servicios provistos por los centros públicos donde se realizan estas pruebas (centros de tercer nivel). Mujeres que se practican las pruebas como % del total de mujeres entre los 14 y los 64 años en el territorio objetivo. La contribución del modelo de atención integral se estima en función de los datos previstos de atención y se cifra para el año 2023 en un 22% de incremento directo del número de citologías realizadas en el territorio objetivo. La tendencia de los últimos datos observados en el territorio objetivo es descendiente; sin embargo, puesto que el número de citologías que se practican en centros de tercer nivel es

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.2	Mujeres que se practicaron una mamografía en el territorio objetivo.	%	5.26	2019	P					4.29	4.29
					P(a)						
					A						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details

Means of verification: Estadísticas Ministerio de Salud Pública y proyección de datos de población de la ONE

Observations: Redacción del indicador: se elimina el rango de edad previsto en la redacción original del indicador en la MR del diseño, porque el sistema nacional no permite filtrar por edad la información. Para el denominador, se ha tomado el rango de edad originalmente establecido en la MR (40-64 años). Racionalidad de los datos: La estimación de la meta se realiza aplicando la tasa media de crecimiento de las mamografías en el territorio objetivo teniendo en cuenta el dato observado de 2019 y del primer trimestre de 2020. La tendencia de estos datos es decreciente. Esta tasa negativa de crecimiento se proyecta linealmente al 2023. A este dato estimado se aplica la corrección de la contribución del modelo de atención integral en el primer año de funcionamiento (2023), que se estima en un incremento del 53% del número de mamografías realizadas en el territorio objetivo. (Ver ficha del indicador en el informe de consultoría adjunto a esta matriz en el sistema - EZSHARE-1449899531-6).

Pro-Gender

Yes

Pro-Ethnicity

No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.3	Mujeres que se practicaron control prenatal a través del modelo integral de atención a la mujer en el año	#	0.00	2020	P					2,000.00	0.00
					P(a)						
					A						

Details

Means of verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer

Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

Pro-Gender

Yes

Pro-Ethnicity

No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.4	Mujeres que practicaron una citología cervical o prueba detectora de cáncer cervical a través del modelo integral de atención a la mujer en el año	#	0.00	2020	P					2,007.00	2,007.00
					P(a)						
					A						

Details

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.5	Mujeres que se practicaron una mamografía a través del modelo integral de atención a la mujer en el año	#	0.00	2020	P					1,349.00	1,349.00
					P(a)						
					A						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details										
Means of verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer										
Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					

Outcome Nbr. 3: 3. Reducir la prevalencia de violencia contra la mujer (violencia íntima de pareja -física o sexual) en el territorio objetivo.

Observation: No existe registro de datos de violencia en el territorio objetivo. Por lo que la consultoría de la revisión de indicadores recomendó incluir únicamente indicadores de provisión del servicio a través del modelo de atención integral a la mujer

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Mujeres víctimas de violencia que han sido atendidas a través del modelo integral de atención a la mujer en el año	#	0.00	2020	P					365.00	365.00
					P(a)						
					A						

Details										
Means of verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer										
Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.1	Mujeres atendidas en el módulo de violencia de género del modelo de atención integral a la mujer que han sido referidas desde otro módulo del modelo	%	0.00	2020	P					80.30	80.30
					P(a)						
					A						

Details										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					

Outcome Nbr. 4: 4. Reducir el porcentaje de mujeres adolescentes de 15-19 años embarazadas en el territorio objetivo.

Observation: Meta de embarazo adolescente en el territorio objetivo es superior a la línea de base porque de acuerdo al informe de la consultoría de revisión de líneas de base en los últimos años se observa una tendencia creciente relevante. La hipótesis es que los servicios de atención integral a la mujer adolescente mitigaran la tendencia creciente en el territorio objetivo

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.0	Nacimientos de mujeres adolescentes (12-19 años) respecto del total de mujeres adolescentes en el territorio objetivo	%	6.33	2019	P					11.37	11.37
					P(a)						
					A						

Details

Means of verification: Servicio Nacional de Salud y proyección de población de la ONE

Observations: Redacción del indicador: se adapta la redacción para que el indicador coincida en su nomenclatura con la variable que mide el sistema nacional. El rango de edad se cambia para alinearse con la definición de "adolescente" utilizada en las estadísticas nacionales. Racionalidad del los datos: El informe de consultoría (EZSHARE-1449899531-6) resalta la tendencia creciente de la variable en los dos últimos datos observados por el Servicio Nacional de Salud en los territorios objetivo. La hipótesis es que los servicios de atención integral a la mujer adolescentes contribuyan a reducir la pendiente con un impacto esperado de reducción de embarazo adolescente en un 0,28% en 2023, de acuerdo a los datos previstos de atención a adoelscentes; sin embargo, este impacto no logra en el primer año de funcionamiento invertir la tendencia creciente de embarazo adolescente en el territorio objetivo.

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.1	Mujeres (12 y 19 años) que son atendidas a través del modelo integral de atención a la mujer	#	0.00	2020	P					674.00	674.00
					P(a)						
					A						

Details

Means of verification: Registro del sistema de atención integral a la mujer

Observations: Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Atención integral para el empleo y la generación de ingresos de las mujeres.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Estudio de Detección de Necesidades de Capacitación y Demanda Laboral para Orientar la Oferta de Cursos Técnico-Profesional con Enfoque de Género en los Territorios de los CEDIMU, adaptado	Número	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A		0		0
1.2	Programa de pasantías implementado	Número	P	0	1	0	285,000
			P(a)	0	1	0	285,000
			A		0		0
1.3	Taller de capacitación empresarial diseñado	Número	P	0	1	0	20,000
			P(a)	0	1	0	20,000
			A		0		0
1.4	Programa de capacitación técnico - vocacional diseñado	Número	P	0	1	0	15,000
			P(a)	0	1	0	15,000
			A		0		0
1.5	Programa de formación a funcionarias del módulo de autonomía económica, implementado	Programa	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A		0		0

Component Nbr. 2 Atención integral en SSR para las mujeres.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Centros con equipamiento médico especializado (mamógrafo, sonógrafo, colposcopio)	Número	P	0	2	0	900,000
			P(a)	0	2	0	900,000
			A		0		0
2.2	Programa de formación a funcionarias del Módulo de SSR, implementado	Programa	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A		0		0

Component Nbr. 3 Atención integral para la prevención y atención a la VCM.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.1	Programa, manuales y materiales de capacitación en la Atención Integral y Manejo Efectivo de Casos de VCM, diseñado	Número	P	0	1	0	20,000
			P(a)	0	1	0	20,000
			A		0		0
3.2	Tallere de capacitación comunitaria para la prevención de violencia dirigidos a hombres y mujeres, diseñado	Número	P	0	1	0	20,000
			P(a)	0	1	0	20,000
			A		0		0
3.3	Programa de formación a funcionarias del Módulo de Atención Integral para la prevención y atención a la VCM, implementado	Programa	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Atención integral a mujeres adolescentes.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
4.1	Diseño y evaluación de intervención piloto para cambio de comportamiento en prevención del embarazo adolescente, implementado	Número	P	0	1	0	120,000
			P(a)	0	1	0	120,000
			A		0		0
4.2	Programa de formación a funcionarias Módulo de Atención Integral a Mujeres Adolescentes, implementado	Número	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A		0		0

Component Nbr. 5 Construcción y equipamiento de los CCM y fortalecimiento institucional.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
5.1	Centro de Santo Domingo construido y equipado	Número	P	0	1	0	11,072,000
			P(a)	0	1	0	11,072,000
			A		0		0
5.2	Centro de Santiago construido y equipado	Número	P	0	1	0	4,725,000
			P(a)	0	1	0	4,725,000
			A		0		0
5.3	Módulo de registro, monitoreo e interoperatividad del Sistema de Información, operativo	Número	P	0	1	0	385,000
			P(a)	0	1	0	385,000
			A		0		0
5.4	Sistema de gestión administrativa , operativo	Número	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A		0		0
5.5	Estrategia de comunicación implementada	Número	P	0	1	0	420,000
			P(a)	0	1	0	420,000
			A		0		0
5.6	Taller de capacitación en habilidades para la vida para beneficiarias, diseñado	Número	P	0	1	0	20,000
			P(a)	0	1	0	20,000
			A		0		0
5.7	Manual operativo y de funciones elaborado	Número	P	0	1	0	105,800
			P(a)	0	1	0	105,800
			A		0		0

Other Cost

Gestión del Proyecto	P			70,000	406,000
	P(a)			70,000	406,000
	A				0
Auditorías Anuales	P			0	70,000
	P(a)			0	70,000
	A				0
Evaluaciones	P			0	100,000
	P(a)			0	100,000
	A				0
Imprevistos	P			0	1,136,200
	P(a)			0	1,136,200
	A				0

Total Cost

	Total Cost	P			70,000	20,000,000
		P(a)			70,000	20,000,000
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section
