

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1230	Chief of Operations Validation Date	10/19/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	PROGRAM TO ENHANCE FISCAL CAPACITY FOR PUBLIC INVESTMENT	Loan Number	4670/OC-EC, 4670/OC-EC-1, 4670/OC-EC-2
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	GONZALEZ DE FRUTOS, UBALDO JESUS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Ecuador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El Programa aun no cuenta con proyectos presentados bajo la modalidad de APP, se encuentran en plena estructuración de los mecanismos que permitirán financiar APP. Se ha identificado en la misión de supervisión como una necesidad de la AE (MEF y BDE) actualizar el MGAS para que responda a las necesidades del Programa		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1230	50,000,000	50,000,000	14,034,095	0	64,034,095	50,000,000	385,818.96	0.77%	49,614,181.04
Aggregated	50,000,000	50,000,000	14,034,095	0	64,034,095	50,000,000	385,818.96	0.77%	49,614,181.04

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

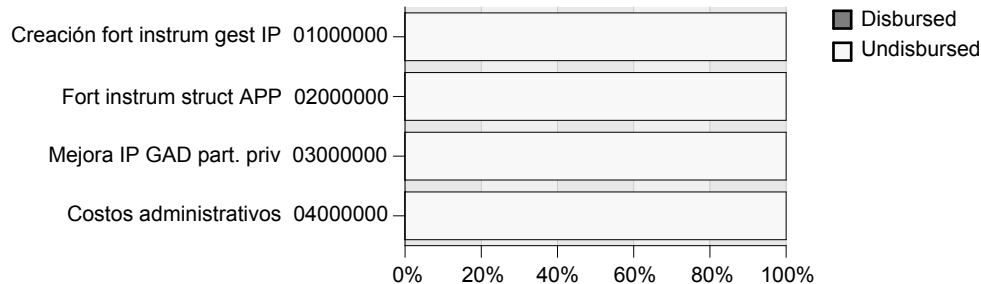

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Aumentar la IP con recursos provenientes de APP como % del PIB

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024		
1.0	Stock de IP comprometida proveniente de APP / PIB	Km	1.90	2017	P	1.90	1.90	2.00	2.20	2.40	2.40		
					P(a)	1.90	1.90	2.00	2.20	2.40	2.40		
					A								
Details													
Means of verification: Informe del Balance presupuestario anual presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No							
		Low-carbon and/or resiliency measures included in design (km)					P						
							P(a)						
							A						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Aumento de % de proyectos de APP estructurados con análisis de impacto fiscal

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.0	Número de proyectos APP estructurados con análisis de impacto fiscal / Total de proyectos APP	%	33.30	2017	P	33.30	50.00	50.00	75.00	100.00	100.00
					P(a)	33.30	50.00	50.00	75.00	100.00	100.00
					A						
Details											
Means of verification: Informe anual de gestión de proyectos de APP del MEF											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

Outcome Nbr. 2: Aumento de % del monto de proyectos de APP nacionales estructurados y licitados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
2.0	Monto de proyectos APP nacionales estructurados y licitados / PIB	%	2.00	2017	P	2.00	2.00	2.30	2.70	3.00	3.00
					P(a)	2.00	2.00	2.30	2.70	3.00	3.00
					A						
Details											
Means of verification: Informe anual de gestión de proyectos de APP del MEF											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

Outcome Nbr. 3: Aumentar el % del monto de inversión en proyectos de APP estructurados y licitados para los GAD

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
3.0	Monto de proyectos APP estructurados y licitados de GADs/ PIB	%	0.14	2017	P	0.14	0.14	0.25	0.40	0.57	0.57
					P(a)	0.14	0.14	0.25	0.40	0.57	0.57
					A						
Details											
Means of verification: Informe anual de gestión de la Unidad de APP del BDE											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de los instrumentos de gestión fiscal responsable de la inversión pública a través de APP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Modelo para la identificación, jerarquización, cuantificación, análisis y mitigación de riesgos de proyectos APP elaborado e implementado	# of agencies	P	0	1	73,276	227,969
			P(a)	0	1	0	227,969
			A	0	0	0	0
1.2	Modelo optimizado de análisis de disponibilidad presupuestaria plurianual, elaborado e implementado	# of agencies	P	0	1	24,425.2	179,118.6
			P(a)	0	1	0	179,118.6
			A	0	0	0	0
1.3	Lineamientos para la valoración, registro y gestión de los compromisos firmes y contingentes elaborados e implementados	Lineamientos	P	0	1	32,567	187,260
			P(a)	0	1	0	187,260
			A	0	0	0	0
1.4	Modelo optimizado de análisis de sostenibilidad fiscal elaborado e implementado	Modelo	P	0	1	24,425.2	179,118.6
			P(a)	0	1	0	179,118.6
			A	0	0	0	0
1.5	Modelo de gestión de Contratos APP elaborado e implementado	Modelo	P	0	1	0	244,253
			P(a)	0	1	0	244,253
			A	0	0	0	0
1.6	Módulo (software) de registro de proyectos de APP en el sistema nacional de IP desarrollado e implementado	# of agencies	P	0	1	0	36,960
			P(a)	0	1	0	36,960
			A	0	0	0	0
1.7	Funcionarios públicos capacitados en APP	Funcionari os	P	30	120	100,000	829,250
			P(a)	30	120	18,985.71	829,250
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de los Instrumentos de estructuración de proyectos de inversión pública bajo a modalidad de APP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Programa de reciclaje de activos de infraestructura pública implementado	Km	P	0	1	150,000	840,500
			P(a)	0	1	98,000	840,500
			A	0	0	53,760	85,760
2.2	Estudios de estructuración de proyectos estratégicos de APP en sectores prioritarios	Proyectos	P	0	3	0	13,064,481.8
			P(a)	0	3	0	13,064,481.8
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejora de la IP de los GAD con participación privada

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
3.1	Estudios de estructuración de proyectos de IP bajo APP	Km	P	0	12	0	10,826,000
			P(a)	0	12	0	10,826,000
			A	0	0	0	0
3.2	Fondo de garantías para la bancabilidad de proyectos APP de los GAD diseñado e implementado	Documento de constitución del	P	0	1	27,000	325,243
			P(a)	0	1	0	325,243
			A	0	0	0	0
3.3	Proyectos que reciben garantías del Fondo de Garantías de APP	Proyectos	P	0	2	0	26,382,539.7
			P(a)	0	2	0	26,382,539.7
			A	0	0	0	0
3.4	Funcionarios públicos del BDE y GAD capacitados en APP	Funcionarios	P	40	160	70,000	981,690
			P(a)	40	160	5,000	981,690
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administracion del programa	P			397,933.96	2,548,211.03
		P(a)			205,473.29	2,548,211.03
		A			0	67,700
	Imprevistos	P			0	739,225.07
		P(a)			0	739,225.07
		A			0	0
	Presupuesto para la Operación del Sistema de Monitoreo del Proyecto	P			4,887.22	275,000.05
		P(a)			0	275,000.05
		A			0	0
	IVA	P			120,254.7	3,778,115.5
		P(a)			39,295.08	3,778,115.5
		A			0	11,964

Total Cost

	Total Cost	P			1,024,769.28	61,644,935.35
		P(a)			366,754.08	61,644,935.35
		A			53,760	165,424

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Stakeholder Priorities
