

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	HO-L1195	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/24/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/23/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to improve the management and quality of maternal-neonatal health services	<b>Loan Number</b>	4619/BL-HO
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	<b>Sector/Subsector</b>	HEALTH-HEALTH SERVICES
<b>Team Leader</b>	GODOY, HUGO DANILO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Honduras
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE HONDURAS		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1195	69,000,000	69,000,000	0	0	69,000,000	69,000,000	19,000,000	27.54%	50,000,000
Aggregated	69,000,000	69,000,000	0	0	69,000,000	69,000,000	19,000,000	27.54%	50,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

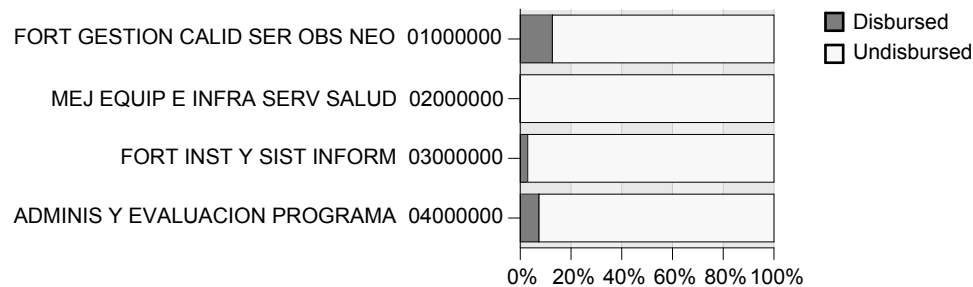

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Reducción de la mortalidad materna neonatal

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	RMM a nivel Nacional	Razón por 100.000 NV	61.00	2015	P		49.00
					P(a)		49.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Estudio Ramos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.1	Tasa de letalidad neonatal por sepsis y asfixia en hospitales intervenidos	%	16.42	2019	P		13.95
					P(a)		13.95
					A		

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final de desempeño del proyecto

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.2	Razón de muerte materna hospitalaria en los hospitales intervenidos	%	14.70	2015	P		13.23
					P(a)		13.23
					A		

#### Details

**Means of verification:** Estudio Ramos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Incremento de la Cobertura de atención materno neonatal con enfoque de atención primaria

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	% de captación de embarazadas antes de las 12 Semanas de Gestación en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas.	%	51.00	2019	P		61.00
					P(a)		61.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final de desempeño del proyecto

**Observations:** La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.2	Cobertura de atención prenatal con calidad, en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas.	%	24.00	2019	P		44.00
					P(a)		44.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final de desempeño del proyecto

**Observations:** La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.3	Cobertura de atención de parto por personal calificado en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas.	%	69.00	2010	P		79.00
					P(a)		79.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final de desempeño del proyecto

**Observations:** La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2024	EOP 2024
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

		Measure		Year			
0.4	Cobertura de atención a recién nacidos en los primeros tres días post parto en los últimos 12 meses, realizadas por los ESFAM y los Establecimientos de Salud	%	68.00	2019	P		83.00
					P(a)		83.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final de desempeño del proyecto

**Observations:** La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.5	Número de ESFAM conformados y funcionando en los Municipios priorizados no descentralizados.	numero	0.00	2019	P	20.00
					P(a)	20.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final de desempeño del proyecto

**Observations:** La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.6	% de Redes priorizadas conformadas de acuerdo a seis atributos (asistenciales).	%	0.00	2019	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final de desempeño del proyecto

**Observations:** La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 1:** Mejoramiento de la calidad de la atención hospitalaria de las complicaciones obstétricas neonatales

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.0	% de complicaciones obstétricas por Trastornos Hipertensivos del Embarazo y Hemorragia atendidas de acuerdo a la norma.	%	11.00	2019	P		41.00
					P(a)		41.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto							
Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.2	% de Complicaciones neonatales por Sepsis y asfixia, manejadas de acuerdo a la norma.	%	7.00	2019	P		27.00
					P(a)		27.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto							
Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1. Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención, priorizando los municipios más pobres	# of beneficiaries	P	425,045	425,045	8,294,566	16,219,186
			P(a)	425,045	425,045	7,302,467	16,219,186
			A	425,045	0	4,128,564	6,754,482
1.2	ESFAM conformados en municipios priorizados	Equipos	P	5	20	375,000	1,500,000
			P(a)	5	20	200,000	1,500,000
			A	0	0	0	0
1.3	Convenios de Gestión del II nivel de atención firmados	Numero	P	2	9	953,413	7,434,693
			P(a)	2	8	467,434	3,430,024
			A	2	2	191,527	236,117
1.4	Convenios de Gestión a Hospitales para atención de la emergencia de COVID-19	NUMERO	P		0		0
			P(a)		0	4,581,161	4,581,161
			A	8	8	3,204,741	3,204,741
1.5	Comités de Apoyo a Hospitales funcionando.	Numero	P	5	6	551,154	1,158,440
			P(a)	5	6	740,221	1,040,561
			A	5	0	269,503	569,843
1.6	Hospitales con modelo de gestion y costeo fortalecido	Numero	P	0	6	254,000	1,184,000
			P(a)	0	2	25,115	4,099,068
			A	0	0	10,117	10,117

## Component Nbr. 2 Componente 2. Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), Sala de Neonatología y readecuación de obras hospitalarias construidos.	Numero	P	0	5	300,000	24,221,301
			P(a)	0	5	0	20,401,870
			A	0	0	0	0
2.2	Unidades de UCIN para el cuidado neonatal y áreas de Obstetricia equipados	Numero	P	0	6	0	6,124,000
			P(a)	0	6	0	6,124,000
			A	0	0	0	0
2.3	Mecanismo de comunicación para el sistema de referencia implementado.	Numero	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	0	0	0
2.4	Diseño, estudio de preinversion y supervision de las Obras elaborados	Numero	P	1	3	37,008	2,064,130
			P(a)	1	3	94,050	2,064,130
			A	1	1	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnologicas y Sistema de Información

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
3.1	Regiones sanitarias fortalecidas	numero	P	0	6	270,000	540,000
			P(a)	0	6	162,000	538,637
			A	0	0	72,161	72,161
3.2	Expediente electronico y Sistema de Información en hospitales implementado	Hospital	P	0	1	0	3,000,000
			P(a)	0	1	0	3,382,400
			A	0	0	0	0
3.3	Departamento de Hospitales fortalecido	numero	P	0	5	211,000	835,000
			P(a)	0	5	60,000	835,000
			A	0	0	30,000	30,000
3.4	Departamentos y unidades del nivel central de la SESAL fortalecidos	Numero	P	3	9	342,396	1,349,250
			P(a)	3	9	342,396	1,413,963
			A	3	5	149,935	245,185
3.5	Plan Maestro de Inversion Hospitalario en Honduras elaborado	Documento	P	0	1	120,000	1,200,000
			P(a)	0	1	0	1,200,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 4 Componente 4: Administración y Evaluación del Programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
4.1	Evaluacion de Linea Base y Evaluación Operativa elaborado	Evaluacion	P	1	2	100,000	300,000
			P(a)	0	2	0	300,000
			A	0	0	0	0
4.2	Estudio Ramos elaborado	Estudio	P	0	1	0	70,000
			P(a)	0	1	0	70,000
			A	0	0	0	0
4.3	Evaluacion del Desempeno final del programa elaborado	Evaluacion	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A	0	0	0	0

## Other Cost

Auditoria Financiera		P			30,000	100,000
		P(a)			30,000	100,000
		A			0	0
Asistencia Tecnica para realizar un analisis de compromiso fiscal y una evaluacion de estrategias alternativas de financiamiento		P			0	50,000
		P(a)			0	50,000
		A			0	0
Unidad Ejecutora		P			368,078	828,450
		P(a)			298,080	921,390
		A			128,145	155,299
Gastos Operativos		P			150,500	321,550
		P(a)			150,500	228,610
		A			53,100	53,100

## Total Cost

Total Cost		P			12,357,115	69,000,000
		P(a)			14,453,424	69,000,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A			8,237,793	11,331,045
--	------------	---	--	--	-----------	------------



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Comités de Apoyo a Hospitales funcionando.	Debido a que esta meta se cambio por la de atencion de pacientes covid19, esta meta se eliminó para el 2021 ya que al reorientar los fondos para la atencion de pacientes COVID-19 en 8 ocho hospitales no quedaron fondos disponibles para contratar los comites de apoyos originalmente programados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	10/23/2020
	Convenios de Gestión a Hospitales para atención de la emergencia de COVID-19	Debido a la pandemia de COVID-19, se tuvo que reorientar los fondos que anteriormente iban a ser usados por los comites de apoyo y gestores descentralizados de segundo nivel u hospitales. Siempre a traves de los gestores que ya estaban gestionando los hospitales se firmaron 8 nuevos convenios de gestión para igual número de hospitales: hospital san marcos de ocotepeque,, hospital de occidente, hospital enrique aguilar cerrato, hospital san lorenzo, hospital san francisco, hospital del sur, hospital de puerto cortes y hospital leonardo martinez.	Create Output	N/A	BESSYR	10/07/2020
			Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	HUGOG	10/23/2020
				Modify Means of Verification	HUGOG	10/23/2020
	Convenios de Gestión del II nivel de atención firmados	Debido a la pandemia de COVID-19, se tuvo que reorientar los fondos que anteriormente iban a ser usados por los comites de apoyo y gestores descentralizados de segundo nivel u hospitales. Siempre a traves de los gestores que ya estaban gestionando los hospitales se firmaron 8 nuevos convenios de gestión para la atencion de paciente covid para 8 hospitales en el 2020: hospital san marcos de ocotepeque,, hospital de occidente, hospital enrique aguilar cerrato, hospital san lorenzo, hospital san francisco, hospital del sur, hospital de puerto cortes y hospital leonardo martinez. Quedo programado el financiamiento solamente para 3 hospitales que ya estaban descentralizados y que estan financiados con fondos BID para el 2021 y el 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/23/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	HUGOG	10/23/2020
	Departamentos y unidades del nivel central de la SESAL fortalecidos	Debido a cambio del organismo ejecutor se esta decidiendo la reorientación de estas consultorias para fortalecer al nuevo orgnismo ejecutor (AEPAS-H) en temas de infraestructura hospitalaria, por lo que se tuvo que reducir la meta programa para el 2020 ya que no se contrataron las consultorias.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BESSYR	10/07/2020
	Expediente electronico y Sistema de Información en hospitales implementado	Debido a cambio del organismo ejecutor aun no se han inciado las actividades para la obtención de este producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BESSYR	10/07/2020
	Hospitales con modelo de gestion y costeo fortalecido	Meta reducida debido a que para el 2020 solo se contrató la consultoria para el el modelo de gestión hospitalaria. Se reprograma la del costeo para el año 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/23/2020
				Modify Physical EOP P(a)	BESSYR	10/07/2020
	Regiones sanitarias fortalecidas	La meta fue reducida debido a que las contrataciones iniciaron despues de la fecha original programada.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/23/2020
	Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), Sala de Neonatología y readecuacion de obras hospitalarias construidos.	Debido al cambio de organismo ejecutor y a los atrasos debido a la pandemia no se pudo avanzar a la contratación de la firma de diseno, por lo tanto no se pudo contratar a la empresa constructora para la construcción de la sala de neonatología del hospital escuela, por lo que se tuvo que reprogramar para el 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/23/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Management Capacity
