

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1130	Chief of Operations Validation Date	10/17/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/12/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Projects for Tax and Customs management Consolidation	Loan Number	3214/OC-PE
Executing Agency	SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	PEREZ RINCON, BELINDA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1130	15,000,000	15,000,000	58,030,000	0	73,030,000	15,000,000	12,667,196	84.45%	2,332,804
Aggregated	15,000,000	15,000,000	58,030,000	0	73,030,000	15,000,000	12,667,196	84.45%	2,332,804

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

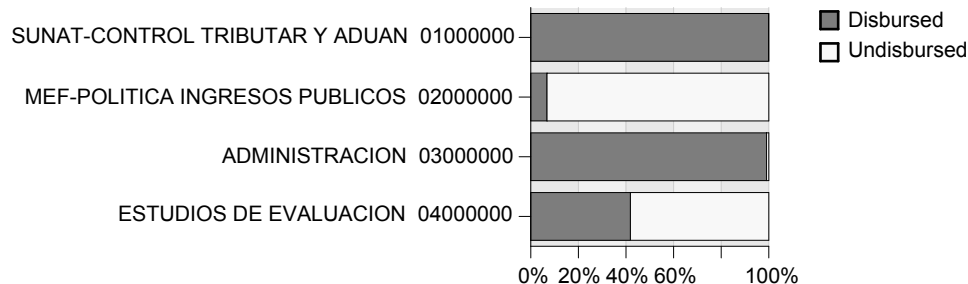

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Incrementar los ingresos estructurales del gobierno general, medido como porcentaje del PIB

Observation:

Classification:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.0	Ingresos estructurales del gobierno general / PIB	%	21.20	2013	P		21.90
					P(a)		21.90
					A		
Details							
Means of verification: Marco macroeconómico multianual (MMM) - MEF							
Observations: La meta final se actualizará en función del MMM del año 2017							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Mejorar la efectividad para controlar el cumplimiento del universo de administrados a nivel nacional y lograr una adecuada gestión de política de ingresos públicos, con énfasis en la recaudación tributaria municipal

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.0	Porcentaje de contribuyentes sobre los cuales se realiza el control de la deuda tributaria	%	30.00	2012	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

Details

Means of verification: Reportes de Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario (INCT)

Observations: El indicador se refiere a contribuyentes de actividad empresarial

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.1	Ratio de acciones de fiscalización no conformes (auditorías más verificaciones)	%	69.50	2012	P	74.00
					P(a)	74.00
					A	

Details

Means of verification: INCT

Observations: Se espera mejorar este indicador a través de gestión integral de riesgos

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.2	Crecimiento porcentual anual del número de intervenciones con incidencia como resultado del control aduanero	%	3.90	2013	P	8.00
					P(a)	8.00
					A	

Details

Means of verification: Estadísticas de la Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización Aduanera

Observations: Se espera mejorar este indicador a través del equipamiento aduanero

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.3	Reducción de las horas de caída al año del sistema	horas	12.21	2012	P	2.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	virtual PDT	horas	12.21	2012	P(a)		2.00
					A		
Details							
Means of verification: Reportes de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información							
Observations: Se espera mejorar este indicador a través de la mejora de la arquitectura informática de SUNAT							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.4	Crecimiento porcentual anual de la recaudación del impuesto predial en ciudades principales tipo A y B	%	11.50	2012	P		12.50
					P(a)		12.50
					A		
Details							
Means of verification: Reportes de Contaduría General de la República - MEF							
Observations: Se espera mejorar este indicador a través de la implementación del nuevo SRTM							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.5	Porcentaje de expedientes sin respuesta luego de 30 días de recibidos	%	74.00	2014	P		10.00
					P(a)		10.00
					A		
Details							
Means of verification: Reportes de gestión de la DGPIP							
Observations: Se espera alcanzar las metas de este indicador con las actividades de mejora de la gestión de la DGPIP							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Mejoramiento de la efectividad del control tributario y aduanero del universo de administrados a nivel nacional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Sistema de cuenta única diseñado e implantado	Sistema	P		1		13,996,798
			P(a)	0.2	1	5,022,393	17,233,540
			A	0.1	0.5	4,703,445	8,073,213
1.2	Sistema de gestión inductiva (CRM) diseñado e implantado	Sistema	P		1		6,720,733
			P(a)	0.02	1	199,458	2,005,644
			A	0.02	1	102,971	1,909,157
1.3	Sistema de gestión de riesgo diseñado e implantado	Sistema	P		1		6,243,586
			P(a)	0	1	403,656	6,709,418
			A	0	1	198,348	6,504,110
1.4	Modelo de gestión coordinada de fronteras (GCF) diseñado	Modelo	P		1		2,063,500
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
1.5	Equipamiento nuevo no intrusivo adquirido y en funcionamiento	Equipamiento no intrusivo	P		62		12,455,558
			P(a)	0	50	5,020,671	13,255,751
			A	0	47	63,474	5,027,017
1.6	Embarcaciones nuevas para operaciones acuáticas adquirido y en funcionamiento	Embarcaciones para operaciones	P		5		7,419,826
			P(a)	0	0	0	72,231
			A	0	0	0	72,231
1.7	Plataformas de servidores para base de datos y soluciones continuas de alta disponibilidad adquiridos	Plataformas	P		2		10,800,000
			P(a)	0.05	2	956,290	12,753,520
			A	0.02	1.97	403,289	12,200,519
1.8	Centro de monitoreo predictivo implementado	Centro	P		1		100,000
			P(a)	0.2	1	2,388,772	9,325,120
			A	0.1	0.9	1,057,145	7,993,493

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Mejoramiento de la gestión de la política de ingresos públicos con énfasis en la recaudación tributaria municipal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal diseñado e implementado en 50 GGLL	# of agencies	P		50		6,866,560
			P(a)	0	50	363,989	7,041,174.45
			A	0	0	42,544	382,963.45
2.2	Aplicativo web implementado en ciudades principales tipo A y B	# of agencies	P		249		1,268,570
			P(a)	0	249	0	1,268,570
			A	0	0	0	0
2.3	Propuesta organizacional de la DGPIP implementada	Propuesta organizacional	P		1		134,000
			P(a)	0	1	0	107,441.41
			A	0	0	22,813	130,254.41
2.4	Sistema de gestión documentaria de la DGPIP implementado	Sistema de gestión documentari	P		1		453,650
			P(a)	0	1	86,176	149,812.41
			A	0	0	0	63,636.41
2.5	Funcionarios de la DGPIP capacitados en temas de tributación sectorial	Funcionarios capacitados	P		280		396,100
			P(a)	20	76	52,387	399,662.62
			A	0	0	2,967	7,149.62
2.6	Equipos informáticos adquiridos	Equipos informáticos	P		35		62,500
			P(a)	5	35	155,203	193,292
			A	0	0	0	0
2.7	Aplicativo tributario adquirido	Aplicativo tributario	P		1		251,874
			P(a)	0	1	54,094	273,132
			A	0	0	0	0
2.8	Bases de datos adquiridas	Bases de datos	P		6		156,915
			P(a)	0	6	0	156,915
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Seguimiento y administración de los Proyectos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	Unidad Ejecutora SUNAT conformada	Informe	P		1		85,720
			P(a)	0	1	0	198,088
			A	0	1	0	198,088
3.2	Unidad Ejecutora MEF conformada	Informe	P		1		78,020
			P(a)	0	1	0	85,587
			A	0	1	0	85,587
3.3	Evaluación intermedia y final SUNAT realizadas	Informe	P		2		483,000
			P(a)	1	1	25,746	25,746
			A	0	0	0	0
3.4	Evaluación intermedia y final MEF realizadas	Informe	P		0		0
			P(a)	1	1	12,000	192,623
			A	0	0	0	0
3.5	Línea de Base SUNAT	Informe	P		0		0
			P(a)	0	1	0	10,679
			A	0	1	0	10,679
3.6	Línea de Base MEF	Informe	P		0		0
			P(a)	0	1	34,118	165,377
			A	0	1	0	122,259

Other Cost

	Administración del Programa SUNAT	P				1,264,000
		P(a)			267,800	1,646,325
		A			130,985	1,509,510
	Administración del Programa MEF	P				1,590,490
		P(a)			168,306	1,582,413.39
		A			42,091	527,770.39
	Auditoría SUNAT	P				141,600
		P(a)			31,891	117,474
		A			0	85,583

Total Cost

	Total Cost	P				73,033,000
		P(a)			15,242,950	74,969,536.28
		A			6,770,072	44,903,220.28

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Aplicativo tributario adquirido	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/06/2020
	Equipamiento nuevo no intrusivo adquirido y en funcionamiento	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/02/2020
	Equipos informáticos adquiridos	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/06/2020
	Evaluación intermedia y final MEF realizadas	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	10/06/2020
	Funcionarios de la DGPIP capacitados en temas de tributación sectorial	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/06/2020
	Línea de Base MEF	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	10/06/2020
	Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal diseñado e implementado en 50 GLL	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	10/06/2020
	Sistema de cuenta única diseñado e implantado	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/02/2020
	Sistema de gestión documentaria de la DGPIP implementado	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	10/06/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
