

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1228	Chief of Operations Validation Date	10/17/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/16/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Create Integrated Health Networks	Loan Number	4726/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	SORIO, RITA ELIZABETH	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Las obras para este programa no han comenzado aún pero están siguiendo los procedimientos puestos en marcha en el PGAS. El organismo ejecutor ha preparado Evaluaciones Ambiental y Social (EVAP) preliminar para la non objecion del banco.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1228	125,000,000	125,000,000	32,825,000	0	157,825,000	125,000,000	0	0.00%	125,000,000
Aggregated	125,000,000	125,000,000	32,825,000	0	157,825,000	125,000,000	0	0.00%	125,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

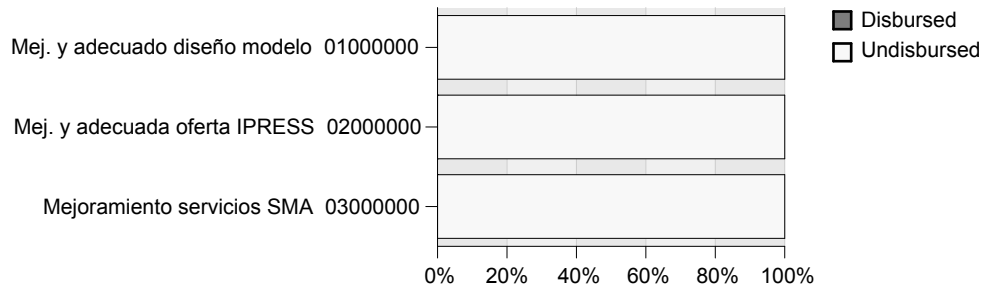

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Calidad de los servicios en el primer nivel de atención mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.3	Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria–total	Porcentaje	29.00	2017	P		24.60
					P(a)		24.60
					A		

Details

Means of verification: Registros Administrativos SIS - MINSA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria– hombres (Seguimiento de género)				P		36.50
					P(a)		36.50
					A		
	Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria– mujeres (Seguimiento de género)				P		23.60
					P(a)		23.60
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.4	Tasa de mortalidad por servicios de salud de baja calidad	Porcentaje	20.80	2017	P		17.50
					P(a)		17.50
					A		

Details

Means of verification: Centro Nacional de Epidemiología,Prevención y Control de las Enfermedades (MINSA)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Capacidades de oferta de servicios de salud mejoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.1	Porcentaje de mujeres de 30 a 59 años que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado	%	88.10	2017	P			92.00
					P(a)			92.00
					A			

Details

Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.2	Porcentaje de personas de 40 a 59 años que se han realizado un chequeo para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses	%	34.60	2017	P			38.00
					P(a)			38.00
					A			

Details

Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.3	Porcentaje de personas que han donado sangre de manera voluntaria	%	5.36	2017	P			8.00
					P(a)			8.00
					A			

Details

Means of verification: PRONAHEBAS (MINSA)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.4	Porcentaje de despachos de ambulancia requeridos y no atendidos	%	46.00	2017	P			41.00
					P(a)			41.00
					A			

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Registros Administrativos - SAMU (MINSA)

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.5	Porcentaje de personas de 15 años o más con diagnóstico de diabetes mellitus que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses	%	71.54	2017	P			74.50
					P(a)			74.50
					A			

Details

Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.6	Porcentaje de personas de 15 años o más con diagnóstico de hipertensión que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses	%	62.30	2017	P			70.00
					P(a)			70.00
					A			

Details

Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.6	Beneficiarios que reciben servicios de salud	# of beneficiaries	2,850,000.00	2017	P			3,049,000.00
					P(a)			3,049,000.00
					A			

Details

Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES E INEI

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.7	Porcentaje de usuarios de consulta externa que se sintieron "satisfechos" o "muy satisfechos" con la atención recibida	%	78.80	2016	P			84.00
					P(a)			84.00
					A			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details											
Means of verification: Encuesta Nacional de Satisfaccion de usuarios de salud - SUSALUD											
Pro-Gender			No			Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024			
1.8	Porcentaje de usuarios de consulta externa que calificaron el tiempo de espera para la atención en el establecimiento de salud con una evaluación de 6 o más (en escala de 1 a 10)	%	77.20	2016	P			83.50			
					P(a)			83.50			
					A						
Details											
Means of verification: Encuesta Nacional de Satisfaccion de usuarios de salud - SUSALUD											
Pro-Gender			No			Pro-Ethnicity			No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejoramiento y adecuado diseño del modelo de organización de IPRESS en las Redes Integradas de Salud (RIS)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Modelo de atención con énfasis en el nuevo patrón de carga de enfermedad rediseñado	Modelo	P		1		339,595
			P(a)		1		339,595
			A	0	0	0	0
1.2	Guías clínicas y protocolos de atención a enfermedades crónicas no transmisibles diseñados: diabetes, cáncer de mama, enfermedades mentales, hipertensión	Protocolos	P	5	17	195,671	545,013
			P(a)	0	17	30,000	545,013
			A	0	0	0	0
1.3	Profesionales de salud (médicos, enfermeros) capacitados en la aplicación de guías clínicas y protocolos	Profesionales	P		1,600		461,045
			P(a)		1,600		461,045
			A	0	0	0	0
1.4	Modelos de organización, gestión y financiamiento de las redes integradas de salud elaborados	Modelo	P		1	508,834	7,033,701
			P(a)		1	0	7,033,701
			A	0	0	0	0
1.5	Plan de desarrollo de competencias de recursos humanos para actuación en red, elaborado y validado por el MINSA	Plan	P		1	21,962	834,692
			P(a)		1	0	834,692
			A	0	0	0	0
1.6	Guía de atención y manejo de casos de violencia en mujeres con enfoque de género revisado y fortalecido	Guía	P		1		50,598
			P(a)		1		50,598
			A	0	0	0	0
1.7	Estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo de atención para los actores del sistema, aprobada	Estrategia	P		1	345,446	624,934
			P(a)		1	0	624,934
			A	0	0	0	0
1.8	Talleres para sensibilización sobre atención y los Servicios Médicos de Apoyo (SMA) centralizados	Taller	P		25		453,937
			P(a)		25		453,937
			A	0	0	0	0
1.9	Estudios técnicos de redes elaborados	Informe	P		7		1,308,055
			P(a)		7		1,308,055
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Mejoramiento y adecuada oferta en las IPRESS en el Primero Nivel de Atención de Lima Metropolitana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Establecimientos de salud 24 horas diseñados	Establecimiento de salud	P		5		4,689,612
			P(a)		5		4,689,612
			A	0	0	0	0
2.2	Establecimientos de salud 24 horas remodelados	Establecimiento de salud	P		5		39,494,271
			P(a)		5		39,494,271
			A	0	0	0	0
2.3	Establecimientos de salud 24 horas equipados	Establecimiento de salud	P		5		17,167,019
			P(a)		5		17,167,019
			A	0	0	0	0
2.4	Establecimientos de salud 24 horas operando	Establecimiento de salud	P		5		150,000
			P(a)		5		150,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejoramiento de los servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
3.1	Central de SMA, diseñada	Central	P		1	383,707	1,287,981
			P(a)		1	0	1,287,981
			A	0	0	0	0
3.2	Central de SMA, construida	Central	P		1		23,040,751
			P(a)		1		23,040,751
			A	0	0	0	0
3.3	Manual operativo con reglas de funcionamiento de la central de SMA elaborado	Manual operativo	P		2		420,002
			P(a)		2		420,002
			A	0	0	0	0
3.4	Central de SMA, equipamiento de laboratorio instalado	Equipamiento	P		1		9,098,132
			P(a)		1		9,098,132
			A	0	0	0	0
3.5	Central de SMA, equipamiento de lectura de imágenes instalado	Equipamiento	P		1		2,274,533
			P(a)		1		2,274,533
			A	0	0	0	0
3.6	Central de SMA, equipamiento de banco de sangre instalado	Equipamiento	P		1		6,823,599
			P(a)		1		6,823,599
			A	0	0	0	0
3.7	Central de SMA, equipamiento de atención prehospitalaria instalado	Equipamiento	P		1		1,137,267
			P(a)		1		1,137,267
			A	0	0	0	0
3.8	Central de SMA, equipamiento complementario instalado (cadena de frío, gases, etc.)	Equipamiento	P		1		3,411,800
			P(a)		1		3,411,800
			A	0	0	0	0
3.9	Diseño de los servicios de la central con sus protocolos funcionales de coordinación con la red completados	Protocolo	P		1		394,998
			P(a)		1		394,998
			A	0	0	0	0
3.10	Profesionales de SMA capacitados	Profesionales	P		65		913,001
			P(a)		65		913,001
			A	0	0	0	0
3.11	Puesta en marcha de la central de SMA	Central	P		1		200,000
			P(a)		1		200,000
			A	0	0	0	0
3.12	Campañas de sensibilización de la población sobre los SMA	Campañas de sensibilización	P		6		3,450,000
			P(a)		6		3,450,000
			A	0	0	0	0
3.13	Equipos médicos hospitalarios reemplazados (7 tomógrafos, 1 resonador, 3 mamógrafos, 65 rayos x)	Equipos médicos	P	11	65	3,432,583	21,895,464
			P(a)	6	65	3,210,630	21,895,464
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Gestión	P			1,663,022	8,575,000
		P(a)			997,813.2	8,575,000
		A			728,010	987,901
	Monitoreo y evaluación	P			300,000	1,500,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Monitoreo y evaluación	P(a)			0	1,500,000
		A			0	0
	Auditorias	P			50,000	250,000
		P(a)			0	250,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			6,901,225	157,825,000
		P(a)			4,238,443.2	157,825,000
		A			728,010	987,901

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo de atención para los actores del sistema, aprobada	Indicador 1.7 , se adicionó la palabra "aprobada" al final de la redacción del nombre del indicador.	Modify Output	Modify Output name	ANAROSAC	10/14/2020
	Mejoramiento de los servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana	Se actualizó el nombre de componente según contrato de préstamo.	Modify Component	Modify Component Name	ANAROSAC	10/15/2020
	Mejoramiento y adecuada oferta en las IPRESS en el Primero Nivel de Atención de Lima Metropolitana	Se ha corregido el nombre del componente según contrato de préstamo.	Modify Component	Modify Component Name	RITAS	10/15/2020
	Mejoramiento y adecuado diseño del modelo de organización de IPRESS en las Redes Integradas de Salud (RIS)	Se ha corregido el nombre del Componente de acuerdo al Contrato de Préstamo.	Modify Component	Modify Component Name	RITAS	10/15/2020
	Modelos de organización, gestión y financiamiento de las redes integradas de salud elaborados	indicador 1.4 , se adicionó la palabra "elaborados"	Modify Output	Modify Output name	ANAROSAC	10/14/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Project Design
Stakeholder Priorities
