

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1159	Chief of Operations Validation Date	10/17/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/15/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Improvement of Foreign Trade Facilitation Services Through the Single Window(VUC	Loan Number	3546/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	Sector/Subsector	TRADE-TRADE FACILITATION, TRADE LOGISTICS AND CUSTOMS
Team Leader	MEJIA RIVAS, ISABEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1159	20,000,000	20,000,000	41,900,000	0	61,900,000	20,000,000	7,610,000	38.05%	12,390,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	41,900,000	0	61,900,000	20,000,000	7,610,000	38.05%	12,390,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

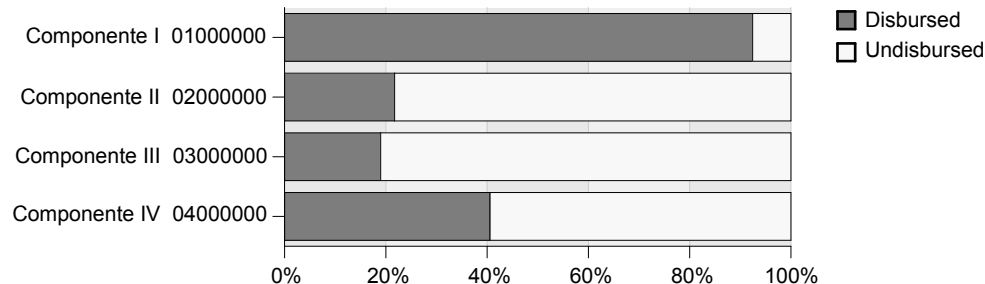

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejorar la competitividad del sector transable a través de la reducción de costos de transacción asociados al comercio exterior

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2023			
0.0	Ranking "Trading accross borders", Doing Business Report, Banco Mundial	Posición en el ranking "Trading accross borders", Doing Business Report, Banco Mundial	88.00	2016	P		85.00	85.00			
					P(a)		85.00	85.00			
					A						
Details											
Means of verification: Medición 2021 Doing Business											
Pro-Gender			No			Pro-Ethnicity			No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Reducción del número de días promedio para la tramitación de las operaciones de comercio exterior

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2023
0.0	Número de días promedio para llevar a cabo los trámites y permisos en la VUCE	días promedio de tramitación	12.67	2016	P		10.67	10.67
					P(a)		10.67	10.67
					A			
Details								
Means of verification: Datos de extraídos de la VUCE								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 1: Reducción a los costos logísticos promedio en las operaciones de comercio exterior

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2023
1.0	Índice de desempeño logístico, Banco Mundial	Posición en el ranking Índice de desempeño logístico, Banco Mundial	80.00	2016	P		77.00	77.00
					P(a)		77.00	77.00
					A			
Details								
Means of verification: Estudio Banco Mundial								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Simplificación de los procesos y procedimientos de comercio exterior

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Nuevo flujograma de procesos de comercio exterior consensuado con las entidades involucradas	Flujograma	P		1		3,170,000
			P(a)		1	88,394.82	2,440,000
			A	0	1	77,353	2,411,197.25
1.2	Reporte sobre Talleres de Trabajo	Talleres	P		3		30,000
			P(a)	0	4		8,620.79
			A	0	4	0	8,620.79
1.3	Reporte sobre Homologación de datos	Reporte	P		1		500,000
			P(a)	1	1	39,803.67	266,000
			A	0	0	38,686.9	262,421.9
1.4	Instrumentos de control y manejo de riesgos diseñados e implementados en las entidades de control	Entidades	P		6		400,000
			P(a)		6	0	400,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente II: Diseño y puesta en marcha de la VUCE 2.0

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Nueva plataforma tecnológica de la VUCE 2.0 en funcionamiento, incorporando nuevas y modernas funcionalidades	Plataforma VUCE	P		1	3,157,000	19,152,000
			P(a)		1	2,899,506	19,151,999.97
			A	0	0	1,043,328.6	2,391,611.97
2.2	Reporte sobre infraestructura de hardware para la VUCE 2.0	Reporte	P	1	1		2,745,000
			P(a)	0	1	512,539.41	2,745,000
			A	0	0	367,650.2	1,398,950.51
2.3	Entidades de control que cuentan con nueva infraestructura de software y hardware necesaria para integrarse a la VUCE 2.0	Entidades	P		8	567,000	6,603,000
			P(a)		8	2,098,945	6,603,000.58
			A	0	0	421,268.1	985,545.08
2.4	Interoperabilidad con VUCE de otros países en funcionamiento	Países con los que se interope	P	1	3		500,000
			P(a)	0	3	7,750.5	500,000.01
			A	0	3	3,158.3	17,514.23
2.5	Reporte sobre el Sistema de información de las zonas de tratamiento especial diseñado y en funcionamiento	Reporte	P		1		500,000
			P(a)		1	143,969.6	1,200,379.21
			A	0	0	683.9	51,463.4

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III: Servicios de información para el comercio exterior

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.1	Sistemas de información sobre servicios logísticos y de comercio exterior (portal especializado logístico, sistema de trazabilidad fitosanitaria, sistema de regulaciones de comercio exterior, sistema Penx, sistema de Marketplace) diseñados y en funcionamiento	Sistemas	P	2	5	1,273,333	6,900,000
			P(a)	0	5	634,505.3	6,900,000
			A	0	0	258,528.1	414,888.86
3.2	Sistema de comunidad portuaria del Callao en funcionamiento	Plataforma	P		1	483,333	3,250,000
			P(a)		1	421,036.3	3,535,000.01
			A	0	0	204,848.8	393,487.32
3.3	Reporte sobre el Sistema de información de inteligencia comercial	Reporte	P		1	683,333	5,250,000
			P(a)		1	60,574.1	5,249,999.97
			A	0	0	16,742.5	448,291.69
3.4	Reporte sobre Sistemas para empresas implementados	Reporte	P		1	900,000	3,100,000
			P(a)		1	0	3,100,000
			A	0	0	0	69,105.64
3.5	Programas de e-learning de capacitación a usuarios privados y entidades de control implementados	Programas	P		5	275,000	1,200,000
			P(a)		5	0	1,200,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Componente IV: Transferencia de conocimiento y gestión del cambio

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
4.1	Estrategias iniciadas de transferencia de conocimiento y mejores prácticas	Estrategias	P	2	4	250,000	1,500,000
			P(a)	0	5	2,571.4	1,499,999.98
			A	0	5	0	211,015.88
4.2	Estrategias implementadas de gestión del cambio	Estrategias	P	1	3	400,000	1,900,000
			P(a)	0	1	55,627.8	1,900,000.01
			A	0	1	8,302.3	122,723.08

Other Cost

	Gestión del Proyecto: Unidad de Gestión	P			790,000	3,950,000
		P(a)			570,807.9	2,939,031.35
		A			292,002.8	1,628,827.89
	Gestión del Proyecto: Adecuación física para la Unidad Ejecutora	P			60,000	300,000
		P(a)			197,926.3	1,310,968.2
		A			94,059.7	981,663.89
	Gestión del Proyecto: Evaluaciones	P				600,000
		P(a)			4,680	449,999.93
		A			0	14,905.43
	Gestión del Proyecto: Auditorías	P			70,000	350,000
		P(a)			84,582.4	499,999.99
		A			0	134,480.25

Total Cost

	Total Cost	P			8,908,999	61,900,000
		P(a)			7,823,220.5	61,900,000
		A			2,826,613.2	11,946,715.06

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Entidades de control que cuentan con nueva infraestructura de software y hardware necesaria para integrarse a la VUCE 2.0	Los retrasos iniciales del proyecto junto con demoras en la ejecución han provocado la necesidad de ampliar el plazo de último desembolso por dos años. Estos cambios forman parte de la replanificación de actividades. Los gastos asignados a esta categoría durante este semestre corresponden: Instalación y configuración de servidores blade y servicios conexos, avances en la ejecución de consultoría de usabilidad, culminación del desarrollo de mejoras en la funcionalidades de software de MR para DIGEMID, relevamiento de información de infraestructura y servicios tecnológicos de las entidades relacionadas a la VUCE y ZEE.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CJMARTINEZ	10/07/2020
	Estrategias implementadas de gestión del cambio	Estos gastos incluyen: Honorarios de especialista en Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/06/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	AOKUMA	10/06/2020
	Estrategias iniciadas de transferencia de conocimiento y mejores prácticas	Los retrasos iniciales del proyecto junto con demoras en la ejecución han provocado la necesidad de ampliar el plazo de último desembolso por dos años. Estos cambios forman parte de la replanificación de actividades. Los productos recopilados como avances en este punto ya superaban los establecidos como objetivos del Programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/06/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SANTIAGOED	10/06/2020
	Interoperabilidad con VUCE de otros países en funcionamiento	Los retrasos iniciales del proyecto junto con demoras en la ejecución han provocado la necesidad de ampliar el plazo de último desembolso por dos años. Estos cambios forman parte de la replanificación de actividades. Este proyecto fue realizado con fondos ajenos del Programa, superando los objetivos planteados. Aunque siguen quedando acciones pendientes para fortalecer el trabajo realizado, se da por cumplido el objetivo. Los gastos reportados corresponden a Parte de los honorarios del Coordinador Técnico.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/06/2020
	Nueva plataforma tecnológica de la VUCE 2.0 en funcionamiento, incorporando nuevas y modernas funcionalidades	Los retrasos iniciales del proyecto junto con demoras en la ejecución han provocado la necesidad de ampliar el plazo de último desembolso por dos años. Estos cambios forman parte de la replanificación de actividades. Este proyecto es el eje principal del Programa e incluye una gran variedad de acciones y plataformas que se interconectan. Aun en 2020 se están finalizando algunas de las especificaciones y contrataciones más complejas, esperando su finalización en 2023.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/06/2020
	Reporte sobre Sistemas para empresas implementados	Los retrasos iniciales del proyecto junto con demoras en la ejecución han provocado la necesidad de ampliar el plazo de último desembolso por dos años. Estos cambios forman parte de la replanificación de actividades. Este punto incluye el desarrollo de varias plataformas cuyos tiempos de finalización son variados, planificando su terminación para 2023	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/06/2020
	Reporte sobre el Sistema de información de inteligencia comercial	Los retrasos iniciales del proyecto junto con demoras en la ejecución han provocado la necesidad de ampliar el plazo de último desembolso por dos años. Estos cambios forman parte de la replanificación de actividades. Se espera que la totalidad de acciones relacionadas a este producto se finalicen en 2022	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/06/2020
	Reporte sobre el Sistema de información de las zonas de tratamiento especial diseñado	Los retrasos iniciales del proyecto junto con demoras en la ejecución han provocado la necesidad de ampliar el plazo de último desembolso por dos años. Estos cambios forman parte de la replanificación de actividades.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a	SANTIAGOED	10/06/2020

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	y en funcionamiento	La licitacion de ZEE ha sido adjudicada en 2020 y se espera su finalizacion en 2022		change in the Financial P(a).		
	Sistema de comunidad portuaria del Callao en funcionamiento	<p>Los retrasos iniciales del proyecto junto con demoras en la ejecucion han provocado la necesidad de ampliar el plazo de último desembolso por dos anos. Estos cambios forman parte de la replanificación de actividades.</p> <p>El Componente Portuario está aun en diseno en 2020. Se espera comenzar su implementacion en 2021.</p> <p>Los gastos asignados a este rubro en este semestre corresponden a: Plan Director (adelanto), honorarios de supervisor internacional del Plan Director, especialista internacional en gestión de puertos y comunidades portuarias, apoyo en la gestión de la implementación del Sistema de Comundiad Portuaria, entre otros.</p>	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SANTIAGOED	10/06/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
Project Monitoring & Evaluation
