

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PR-L1097	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/12/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	11/06/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Project to Support Extended School Days and Improved Transportation Conditions for Students Attending Rural Official Schools	<b>Loan Number</b>	3660/OC-PR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO	<b>Sector/Subsector</b>	EDUCATION-PRIMARY EDUCATION
<b>Team Leader</b>	PEREZ ALFARO, MARCELO A.	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Paraguay
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE PARAGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1097	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	1,229,444	6.15%	18,770,556
<b>Aggregated</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>1,229,444</b>	<b>6.15%</b>	<b>18,770,556</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

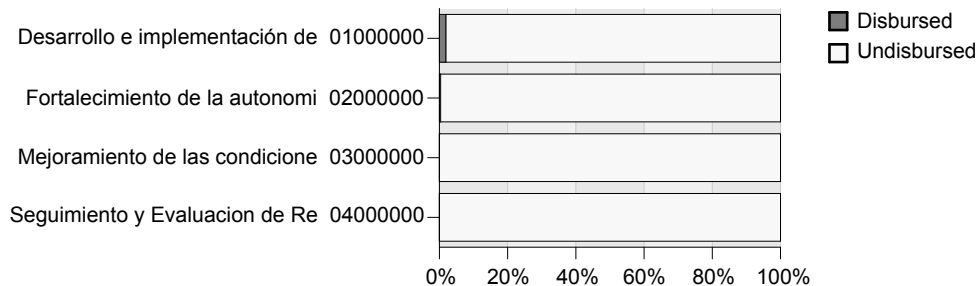

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Mejora en aprendizajes en 2º ciclo en Lenguaje

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Diferencia en el puntaje de la prueba de lenguaje entre los alumnos de 2º ciclo que estén expuestos a JEE y los que no (en desviación estándar)	Desviación estándar	0.00	2017	P		0.00
					P(a)	0.10	0.10
					A		0.00
Details							
Means of verification: Pruebas de rendimiento académico administradas a los estudiantes.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Impact Nbr. 1:** Mejora en aprendizajes en 2º Ciclo en Matemáticas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Diferencia en el puntaje de la prueba de matemáticas entre los alumnos de 2° ciclo que están expuestos a JEE y los que no (en desviaciones estándar)	Desviación estándar	0.00	2017	P		0.00
					P(a)	0.10	0.10
					A		0.00
Details							
Means of verification: Pruebas de rendimiento académico administradas a los estudiantes.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Escuelas con Jornada Escolar Extendida Implementadas

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	# Escuelas que implementan jornada escolar extendida	Escuela	71.00	2016	P	0.00	0.00		664.00			664.00
					P(a)	0.00	0.00				300.00	300.00
					A	0.00	0.00					0.00

#### Details

**Means of verification:** Informes de Rendición de Cuentas de las escuelas aprobados por el MEC

**Observations:** Implementadas implica que la escuela reporta en los informes de rendición de cuentas que funciona en horario extendido.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Escuelas con proyectos educativos gestionados de manera autónoma

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	# Escuelas que gestionan de manera autónoma sus proyectos educativos	Escuela	0.00	2016	P	0.00	0.00		664.00			664.00
					P(a)	0.00	0.00				300.00	300.00
					A	0.00	0.00					0.00

#### Details

**Means of verification:** Proyectos Educativos Institucionales aprobados por el MEC

**Observations:** Una escuela que gestiona de manera autónoma tiene al menos un proyecto educativo institucional aprobado.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Escuelas con pilotos de transporte aplicados para sus estudiantes

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	# Escuelas que aplican pilotos de transporte de sus estudiantes	Escuela	0.00	2016	P	0.00	0.00		80.00			80.00
					P(a)	0.00	0.00		21.00			21.00
					A	0.00	0.00					0.00

#### Details

**Means of verification:** Informes de Monitoreo del MEC

**Observations:** La aplicación de pilotos implica que al menos un estudiante se transporta a la escuela utilizando bicicleta o recursos derivados de subsidios o transferencias del proyecto.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 3:** Estudiantes beneficiados por la extensión de jornada escolar

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.0	# Estudiantes de primaria beneficiados por la extensión de jornada escolar	# of students	16,000.00	2016	P	0.00	0.00			156,000.00			156,000.00
					P(a)	0.00	0.00				52,506.00	52,506.00	
					A	0.00	0.00					0.00	
Details													
Means of verification: Informes estadísticos del MEC													
Observations: Indicador Sectorial (CSI). Los estudiantes beneficiados son los inscritos en los Ciclos 1º y 2º de la EEB en las escuelas que implementan JEE.													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
	Female				P	0.00	0.00			78,000.00			78,000.00
					P(a)	0.00	0.00					26,253.00	26,253.00
					A	0.00	0.00						0.00
	Male				P	0.00	0.00			78,000.00			78,000.00
					P(a)	0.00	0.00					26,253.00	26,253.00
					A	0.00	0.00						0.00

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Desarrollo e implementación de innovaciones pedagógicas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Producto 1: Materiales para innovaciones pedagógicas elaborados y en condiciones de ser utilizados	Cantidad de materiales educati	P	0	4	0	3,621,000
			P(a)	0	580,000	0	3,062,821
			A	0	0	0	0
1.2	Producto 2: Implementación de innovaciones pedagógicas	Innovaciones pedagógicas imple	P	300	664	3,923,019	9,790,279
			P(a)	0	3	80,000	6,980,363
			A	0	0	19,380.12	272,500.12
1.3	Producto 3: Diseño y adecuaciones de Escuelas del Siglo XXI	Escuelas adecuadas	P		0		0
			P(a)		200	0	1,168,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la autonomía de las instituciones educativas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Producto 4: Talleres de intercambio de experiencias docentes entre escuelas realizados	Taller	P	22	48	33,899	118,646
			P(a)	0	24	0	233,685
			A	0	0	0	0
2.2	Producto 5: Talleres en escuelas de apoyo al vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia realizados	Taller	P	30	664	67,117	234,909
			P(a)	0	600	0	333,550
			A	0	0	0	0
2.3	Producto 6: Talleres de formación y asesoría para los Equipos de Gestión de Instituciones Educativas Escolares realizados	Taller	P	16	16	7,855	568,377
			P(a)	0	600	0	333,334
			A	0	0	0	0
2.4	Producto 7: Talleres de formación para Consejos Escolares realizados	Taller	P	300	664	27,900	101,174
			P(a)	0	600	0	0
			A	0	0	0	0
2.5	Producto 8: Sistema software para el monitoreo de la gestión escolar diseñado e instalado	Software	P	30	664	116,428	439,090
			P(a)	0	1	0	360,000
			A	0	0	0	0
2.6	Producto 9: Paquetes para Oficinas de Coordinación Departamental de Supervisión entregados	Equipos	P	0	1	47,900	378,923
			P(a)	0	300	50,000	120,000
			A	0	0	13,340.42	19,927.42

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del área rural

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Producto 10: Estudio de soluciones de transporte aprobado	Documento	P	0	1	0	28,000
			P(a)	1	1	0	55,049
			A	0	0	0	0
3.2	Producto 11: Adquisición de buses escolares recibida	Documento	P	3,500	7,000	371,901	818,182
			P(a)	0	21	0	2,000,000
			A	0	0	0	0
3.3	Producto 12: Transferencias a las municipalidades para pilotos de transporte completadas	Transferencia	P	67	134	629,891	2,204,618
			P(a)	0	56	0	935,000
			A	0	0	0	0
3.4	Producto 13: Estudio de evaluación económica de las opciones de transporte	Documento	P	0	1	0	24,000
			P(a)	0	1	0	29,702
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 4 Seguimiento y Evaluación de los Resultados

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
4.1	Producto 14: Estudio de evaluación de proceso	Documento	P	1	1	0	51,000
			P(a)	0	1	0	45,000
			A	0	0	0	0
4.2	Producto 15: Estudio de evaluación de impacto del Proyecto	Documento	P	0	1	0	539,000
			P(a)	0	1	0	431,200
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Administración del Proyecto	P			159,273	962,802
		P(a)			50,000	731,418
		A			31,124.03	51,577.03
	Auditoría del Proyecto	P			24,000	120,000
		P(a)			15,000	107,308
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P			5,409,183	20,000,000
		P(a)			195,000	16,926,430
		A			63,844.57	344,004.57

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Producto 10: Estudio de soluciones de transporte aprobado	A solicitud del JEP se requiere la necesidad de modificar el PMR a los efectos de reflejar la realidad del proyecto. El proyecto se vio afectado por la situación del COVID-19 y otros percances en la ejecución, el ajuste del P(a) 2020 se vio necesario en los aspectos financieros de la operación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	11/06/2020
	Producto 14: Estudio de evaluación de proceso	A solicitud del JEP se requiere la necesidad de modificar el PMR a los efectos de reflejar la realidad del proyecto. El proyecto se vio afectado por la situación del COVID-19 y otros percances en la ejecución, el ajuste del P(a) 2020 se vio necesario en los aspectos financieros de la operación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	11/06/2020
	Producto 15: Estudio de evaluación de impacto del Proyecto	A solicitud del JEP se requiere la necesidad de modificar el PMR a los efectos de reflejar la realidad del proyecto. El proyecto se vio afectado por la situación del COVID-19 y otros percances en la ejecución, el ajuste del P(a) 2020 se vio necesario en los aspectos financieros de la operación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	11/06/2020
	Producto 1: Materiales para innovaciones pedagógicas elaborados y en condiciones de ser utilizados	A solicitud del JEP se requiere la necesidad de modificar el PMR a los efectos de reflejar la realidad del proyecto. El proyecto se vio afectado por la situación del COVID-19 y otros percances en la ejecución, el ajuste del P(a) 2020 se vio necesario en los aspectos financieros de la operación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	11/06/2020
	Producto 2: Implementación de innovaciones pedagógicas	A solicitud del JEP se requiere la necesidad de modificar el PMR a los efectos de reflejar la realidad del proyecto. El proyecto se vio afectado por la situación del COVID-19 y otros percances en la ejecución, el ajuste del P(a) 2020 se vio necesario en los aspectos financieros de la operación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	11/06/2020
	Producto 3: Diseño y adecuaciones de Escuelas del Siglo XXI	A solicitud del JEP se requiere la necesidad de modificar el PMR a los efectos de reflejar la realidad del proyecto. El proyecto se vio afectado por la situación del COVID-19 y otros percances en la ejecución, el ajuste del P(a) 2020 se vio necesario en los aspectos financieros de la operación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	11/06/2020
	Producto 4: Talleres de intercambio de experiencias docentes entre escuelas realizados	A solicitud del JEP se requiere la necesidad de modificar el PMR a los efectos de reflejar la realidad del proyecto. El proyecto se vio afectado por la situación del COVID-19 y otros percances en la ejecución, el ajuste del P(a) 2020 se vio necesario en los aspectos financieros de la operación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	11/06/2020
	Producto 5: Talleres en escuelas de apoyo al vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia realizados	A solicitud del JEP se requiere la necesidad de modificar el PMR a los efectos de reflejar la realidad del proyecto. El proyecto se vio afectado por la situación del COVID-19 y otros percances en la ejecución, el ajuste del P(a) 2020 se vio necesario en los aspectos financieros de la operación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	11/06/2020
	Producto 6: Talleres de formación y asesoría para los Equipos de Gestión de Instituciones Educativas Escolares realizados	A solicitud del JEP se requiere la necesidad de modificar el PMR a los efectos de reflejar la realidad del proyecto. El proyecto se vio afectado por la situación del COVID-19 y otros percances en la ejecución, el ajuste del P(a) 2020 se vio necesario en los aspectos financieros de la operación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	11/06/2020
	Producto 8: Sistema software para el monitoreo de la gestión escolar diseñado e instalado	A solicitud del JEP se requiere la necesidad de modificar el PMR a los efectos de reflejar la realidad del proyecto. El proyecto se vio afectado por la situación del COVID-19 y otros percances en la ejecución, el ajuste del P(a) 2020 se vio necesario en los aspectos financieros de la operación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	11/06/2020
	Producto 9: Paquetes para Oficinas de Coordinación Departamental de Supervisión entregados	A solicitud del JEP se requiere la necesidad de modificar el PMR a los efectos de reflejar la realidad del proyecto. El proyecto se vio afectado por la situación del COVID-19 y otros percances en la ejecución, el ajuste del P(a) 2020 se vio necesario en los aspectos financieros de la operación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	11/06/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
Stakeholder Priorities
