

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1152	Chief of Operations Validation Date	10/17/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/12/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Improvement and Expansion of employment Center Services for Formal Job placement	Loan Number	3547/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-LABOR INTERMEDIATION SYSTEMS
Team Leader	ROSAS SHADY, G. DAVID	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1152	30,000,000	30,000,000	8,900,000	0	38,900,000	30,000,000	6,442,750	21.48%	23,557,250
Aggregated	30,000,000	30,000,000	8,900,000	0	38,900,000	30,000,000	6,442,750	21.48%	23,557,250

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

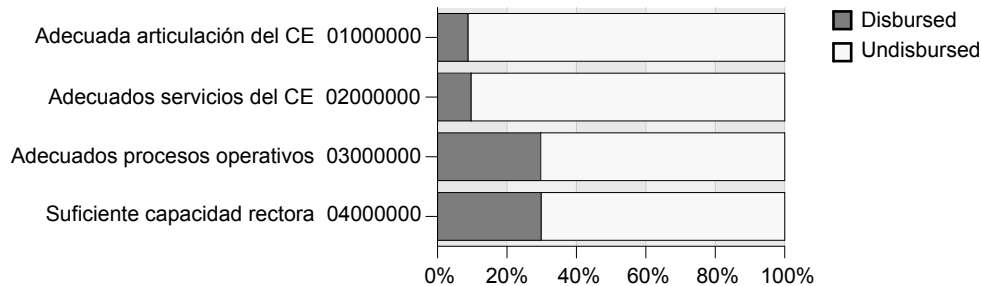

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Incrementar la contratación formal (mejorar la incidencia)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
0.0	Incidencia de contratación formal de jóvenes capacitados por el CE y vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE	Por ciento	10.70	2013	P		17.00	
					P(a)		17.00	
					A			
Details								

Means of verification: Tratado: SILNET, Planilla

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
0.1	Incidencia de contratación formal de jóvenes vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE pero no capacitados por el CE	Por ciento	10.70	2013	P		15.00	
					P(a)		15.00	
					A			
Details								

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Incrementar la calidad de la contratación formal (mejorar la pertinencia)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.0	Salarios de jóvenes contratados formalmente capacitados por el CE y vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE	Promedio de salario real por hora	5.49	2013	P		8.00	
					P(a)		8.00	
					A			
Details								

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.1	Salarios de jóvenes contratados formalmente vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE pero no capacitados por el CE	Promedio de salario real por hora	5.49	2013	P		6.00	
					P(a)		6.00	
					A			
Details								

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Reducir los costos de la contratación formal (mejorar la eficiencia)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
2.0	Tiempo medio de búsqueda de empleo formal de jóvenes capacitados por el CE y vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE	Por ciento		2015	P		7.00	
					P(a)		7.00	
					A			

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
2.1	Tiempo medio de búsqueda de empleo formal de jóvenes vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE pero no capacitados por el CE	Por ciento		2015	P		5.00	
					P(a)		5.00	
					A			

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Adecuada articulación del Centro de Empleo con el sector productivo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Pilotos de atención en clúster empresariales implementados	Piloto	P		2	257,758	321,629
			P(a)		2	2,402	44,068
			A		0	1,201	1,201
1.2	Eventos de articulación ejecutados	Evento	P	22	112	212,903	1,083,870
			P(a)	10	112	15,165	793,701
			A	8	72	6,006	760,375
1.3	Nuevos servicios complementarios de la estrategia implementados, con personal capacitado	Servicio	P		1		1,004,785
			P(a)	1	1	46,607	2,233,234
			A	0	0	0	0
1.4	Asistencia técnica BT-Triage implementada	Servicio	P		1	711,271	2,717,419
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
1.5	Unidades de análisis con el sector productivo creadas e implementadas, con personal capacitado	Unidad de análisis	P		7	1,177,494	5,059,083
			P(a)		7	524,925	7,221,731
			A		0	84,462	96,396
1.6	Plan de medios de difusión al sector productivo implementado	Plan	P		1	1,014,419	3,726,034
			P(a)		1	324,577	3,620,085
			A		0	0	0

Component Nbr. 2 Adecuados servicios del Centro de Empleo para los jóvenes

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Instrumento de diagnóstico de necesidades de empleabilidad diseñado e implementado, con personal capacitado	Instrumento	P		1		240,469
			P(a)		1	37,387	250,342
			A		1	37,387	250,342
2.2	Beneficiarios del servicio de capacitación laboral implementado	# of beneficiaries	P	2,600	2,600	2,593,290	3,167,321
			P(a)	0	2,600	331,306	350,650
			A	0	0	379,296	398,640
2.3	Asistencia Técnica en Capacitación Laboral implementada	Servicio	P	1	1	306,581	766,452
			P(a)	1	1	0	1,303,335
			A	0	0	0	530,530
2.4	Pilotos diseñados e implementados (aprendizaje y mentoría)	Piloto	P	2	2	1,914,172	4,496,127
			P(a)	0	2	0	4,005,201
			A	0	0	0	8,939
2.5	Servicios rediseñados e implementados, con personal capacitado (ABE y CUL)	Servicios	P	1	2	365,806	2,132,718
			P(a)	0	2	1,658,319	4,893,559
			A	0	1	28,664	375,617

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Adecuados procesos operativos del Centro de Empleo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Estudio de arquitectura realizado	Estudio	P		1		221,444
			P(a)	0	1	235,135	636,159
			A	0	1	119,283	129,316
3.2	Hardware/Software aplicados	Software/Hardware	P		1	886,800	5,901,384
			P(a)		1	516,959	2,038,803
			A		0	0	27,849
3.3	Oficinas de centro de empleo con procesos mejorados y acondicionadas	Oficina	P	5	9	343,974	1,199,211
			P(a)	1	9	1,871,466	4,647,078
			A	1	4	1,052,784	2,300,327

Component Nbr. 4 Suficiente capacidad rectora del MTPE con los Gobiernos Regionales para la inserción laboral juvenil

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
4.1	Unidad organizacional del Centro de Empleo fortalecido	Unidad	P	1	1	389,532	1,192,847
			P(a)	1	1	578,124	1,957,026
			A	0	0	251,695	652,969
4.2	Sistemas de monitoreo y evaluación de calidad de servicios y de supervisión de gestión diseñado e implementado	Sistema	P		2	863,653	1,703,937
			P(a)	0	2	30,030	1,036,629
			A	0	0	59,459	145,670
4.3	Mecanismo presupuestal de incentivos entre GN-GR implementado	Mecanismo	P	1	1	96,871	96,871
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Remuneraciones	P			541,408	2,849,033
		P(a)			332,548	2,634,352
		A			267,981	1,976,051
	Gastos administrativos	P			27,636	140,483
		P(a)			53,143	508,189
		A			17,237	360,046
	Auditoría	P			70,000	350,000
		P(a)			70,000	343,641
		A			0	133,641
	Evaluaciones	P			115,789	549,998
		P(a)			201,666	403,332
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			11,889,357	38,921,115
		P(a)			6,829,759	38,921,115
		A			2,305,455	8,147,909

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Asistencia Técnica en Capacitación Laboral implementada	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas físicas y financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	10/12/2020
	Beneficiarios del servicio de capacitación laboral implementado	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas físicas y financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	10/12/2020
	Estudio de arquitectura realizado	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas físicas y financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	10/12/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIMITRAS	10/08/2020
	Eventos de articulación ejecutados	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas físicas y financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	10/12/2020
	Hardware/Software aplicados	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas físicas y financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	10/12/2020
	Instrumento de diagnóstico de necesidades de empleabilidad diseñado e implementado, con personal capacitado	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas físicas y financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/08/2020
	Nuevos servicios complementarios de la estrategia implementados, con personal capacitado	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas físicas y financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	10/12/2020
	Oficinas de centro de empleo con procesos mejorados y acondicionadas	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas físicas y financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	10/12/2020
	Pilotos de atención en clúster empresariales implementados	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas físicas y financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	10/12/2020
	Pilotos diseñados e implementados (aprendizaje y mentoría)	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas físicas y financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	10/12/2020
	Plan de medios de difusión al sector productivo implementado	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas físicas y financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	10/12/2020
	Servicios rediseñados e implementados, con personal capacitado (ABE y CUL)	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas físicas y financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	10/12/2020
	Sistemas de monitoreo y evaluación de calidad de servicios y de supervisión de gestión diseñado e implementado	La Unidad Ejecutora presentó al Banco la actualización de las metas físicas y financieras del Proyecto en base a la actualización del POA 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	10/12/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
