

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1110	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/23/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/23/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support the National Integrated Care System	<b>Loan Number</b>	3706/OC-UR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	<b>Sector/Subsector</b>	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	SANCHEZ, MARIO ALBERTO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Uruguay
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1110	50,000,000	50,000,000	15,000,000	0	65,000,000	50,000,000	32,969,753.85	65.94%	17,030,246.15
Aggregated	50,000,000	50,000,000	15,000,000	0	65,000,000	50,000,000	32,969,753.85	65.94%	17,030,246.15

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

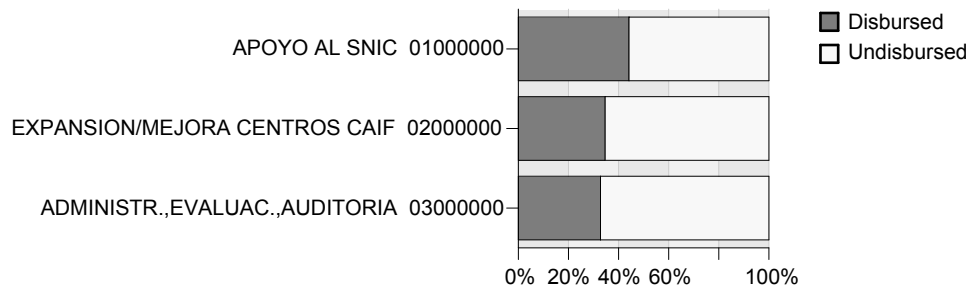

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Contribuir a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de las personas en situación de dependencia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

**Observation:** Específicamente se apoyará el fortalecimiento del SNIC y la expansión de servicios de calidad para menores de tres años.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.0	Niños en nuevos centros CAIF con puntaje ASQ-3 por debajo de un umbral crítico.	% niños en nuevos centros CAIF	14.00	2016	P		10.00
					P(a)		10.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informes SNIC/DINEM-INAU

**Observations:** ASQ-3 es una herramienta de detección precoz de rezagos en el desarrollo infantil.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.1	Centros CAIF nuevos con puntaje ITES-R entre 5 y 7.	% centros CAIF	0.00	2016	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informes SNIC/DINEM-INAU

**Observations:** ITES-R es un instrumento de medición de calidad en centros para niños.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.2	Brecha en la carga global de trabajo entre mujeres y hombres de Q1.	hs semanales de trabajo	9.00	2016	P		7.00
					P(a)		7.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** EUT 2013 y 2019

**Observations:** Línea de base a partir de EUT 2013 y seguimiento EUT 2019.

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.3	Carga de trabajo no remunerado de cuidado	hs semanales	21.20	2016	P		20.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

0.3	infantil.	de cuidado infantil	21.20	2016	P(a)		20.00	20.00
					A			
Details								
Means of verification: EUT 2013 y 2019								
Observations: Línea de base a partir de EUT 2013 y seguimiento EUT 2019. En el caso de este indicador, hay una línea de base y una meta para mujeres (21.2) y otra para varones (14.8)								
Pro-Gender	Yes			Pro-Ethnicity	No			
	Mujeres				P		20.00	20.00
					P(a)		20.00	20.00
					A			
	Varones				P		16.00	16.00
					P(a)		16.00	16.00
					A			

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Contribuir a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de las personas en situación de dependencia en el marco del SNIC.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Porcentaje de cuidadores registrados en el RNC.	%	0.00	2016	P	25.00	50.00	50.00
					P(a)	25.00	50.00	50.00
					A	25.00		

#### Details

**Means of verification:** Sistemas de información del SNC

**Observations:** En comparación con estimación de universo de la SNC

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.1	Porcentaje de instituciones prestadoras de servicios registradas en el RNC.	%	0.00	2016	P	75.00	100.00	100.00
					P(a)	75.00	100.00	100.00
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Sistemas de información del SNC

**Observations:** En comparación con estimación de universo de la SNC

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.2	Porcentaje de usuarios registrados en el RNC.	%	0.00	2016	P	50.00	100.00	100.00
					P(a)	50.00	100.00	100.00
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Sistemas de información del SNC

**Observations:** En comparación con estimación de universo de la SNC

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.3	Porcentaje de instituciones formadoras de RRHH registradas en el RNC.	%	0.00	2016	P	50.00	100.00	100.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.3	Porcentaje de instituciones formadoras de RRHH registradas en el RNC.	%	0.00	2016	P(a)	50.00	100.00	100.00
					A	100.00		
Details								
Means of verification: Sistemas de información del SNC								
Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.4	Número de postulaciones para prestaciones.	#	0.00	2016	P	3,500.00	5,000.00	5,000.00
					P(a)	3,500.00	5,000.00	5,000.00
					A	10,000.00		
Details								
Means of verification: Sistemas de información del SNC								
Observations: Las prestaciones a considerar son: Asistente Personal, Tele asistencia, Centro de día, y Casa comunitaria Definir postulación como: beneficiario elegible (cumple requisitos) y está ingresado en el RNC.								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.5	Porcentaje de personas con conocimiento de derechos y prestaciones en el marco del SNIC.	%	0.00	2016	P	25.00	50.00	50.00
					P(a)	25.00	50.00	50.00
					A	46.00		
Details								
Means of verification: Informes SNIC								
Observations: Informe producido a partir de encuesta a ser realizada por la SNC								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.6	Porcentaje de trabajadores de CAIF nuevos, formados según nueva currícula.	%	0.00	2016	P	50.00	80.00	80.00
					P(a)	50.00	80.00	80.00
					A	0.00		
Details								
Means of verification: Informes semestrales de avance, e informe específico sobre calidad de centros.								

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Observations:** Se mide sobre los centros CAIF nuevos operando en el momento de medición

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.7	Porcentaje de usuarios satisfechos por al pertinencia de las innovaciones del PI.	%	60.00	2016	P	80.00	90.00	90.00
					P(a)	80.00	90.00	90.00
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informes semestrales de avances del programa.

**Observations:** Medición que forma parte de la agenda de conocimiento del SNIC

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.8	Porcentaje de niños de los CAIF pertenecientes a hogares elegibles para AFAM Plan de Equidad (condición de vulnerabilidad socioeconómica)	%	64.00	2016	P	68.00	72.00	72.00
					P(a)	68.00	72.00	72.00
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos y visita de inspección in loco.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.9	Tasa de matriculación de los nuevos centros CAIF (niños/cupos)	tasa niños/cupos	0.00	2016	P	85.00	95.00	95.00
					P(a)	85.00	95.00	95.00
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos INAU

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

# RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la instalación y funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Diseño del Portal de Cuidados aprobado por SNIC.	Portal	P	0	1	0	561,645
			P(a)	0	1	0	136,759.08
			A	0	1	0	92,839.08
1.2	Nuevas funcionalidades del Portal de Cuidados habilitadas con carga de datos de casos reales.	# nuevas funcionalidades	P	5	5	864,301	4,036,083
			P(a)	4	5	1,585,325	4,746,287.23
			A	4	4	792,662.45	3,953,624.68
1.3	Diseño de Registro Nacional de Cuidados aprobado por SNIC.	Documento - diseño RNC	P	0	1	39,528	150,898
			P(a)	0	1	0	1,007,975
			A	0	1	0	0
1.4	Módulos del Registro Nacional de Cuidados en funcionamiento.	# módulos RNC	P	5	5	151,112	878,722
			P(a)	1	4	1,177,875.62	2,915,754.24
			A	1	1	588,937.81	2,326,816.43
1.5	Personas valoradas en relación a su situación de dependencia.	# personas valoradas	P	2,000	10,500	369,938	1,544,144
			P(a)	1,615	18,127	175,854.28	727,139.67
			A	1,615	16,127	87,927.14	462,229.53
1.6	Campañas de comunicación implementadas.	# campañas de comunicación	P	1	4	30,500	3,318,400
			P(a)	1	5	22,025.12	1,277,808.95
			A	1	5	22,025.12	689,834.95
1.7	Encuestas de opinión realizadas.	# encuestas de opinión	P	1	5	0	85,400
			P(a)	0	5	0	97,543.1
			A	0	3	0	78,023.1
1.8	Iniciativas territoriales de comunicación financiadas e implementadas.	# iniciativas territoriales de	P	30	120	0	1,046,875
			P(a)	0	74	0	828,328.78
			A	0	74	0	828,328.78
1.9	Líneas de trabajo que cuentan con productos comunicacionales.	# líneas de trabajo	P	3	15	118,035	1,007,573
			P(a)	3	15	115,195.18	1,197,819.77
			A	2	12	57,597.59	1,011,538.18
1.10	Estudios de la agenda de conocimiento publicados en el sitio web.	# estudios	P	2	12	97,042	1,197,186
			P(a)	2	12	10,848.45	900,286.75
			A	2	9	10,848.45	174,053.75
1.11	Informes de avances y resultados de la agenda de conocimiento del SNIC elaborados y aprobados por SNIC y DINEM/MIDES.	# informes de avance y resulta	P	1	3	71,370	339,484
			P(a)	1	5	50,534.37	391,298.16
			A	1	4	37,900.78	293,197.57
1.12	Prestaciones reguladas.	# prestaciones reguladas	P	4	28	123,983	880,418
			P(a)	0	25	56,641.2	696,901.07
			A	0	21	28,320.6	439,754.47
1.13	Diseño de un censo de centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisado por MEC o ANEP)	# instrumentos de medición de	P	0	3	0	36,600
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
1.14	Centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisados por MEC o ANEP) censados	Documento - diseño de instrume	P	0	1	0	133,379
			P(a)	0	1	0	261,191
			A	0	0	0	70,627
1.15	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de formación del SNIC.	currícula de cursos	P	0	1	75,386	608,653
			P(a)	0	1	103,027.47	380,389.59

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.15	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de formación del SNIC.	currícula de cursos	A	0	1	45,945.14	205,515.26
1.16	Modelo de supervisión de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por MEC.	Documento - modelo de supervis	P	0	1	0	442,491
			P(a)	0	1	72,030.84	323,657.61
			A	0	1	31,851.39	164,041.16
1.17	Centros de educación y cuidado infantil supervisados por MEC con el nuevo modelo.	# de centros de educación y cu	P	980	980	51,546	851,717
			P(a)	1,203	1,203	75,045.74	669,755.76
			A	1,203	1,203	50,030.49	479,776.51
1.18	Diseño de instrumento de medición de la calidad de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por INAU y MEC.	Documento - diseño instrumento	P	0	1	0	61,000
			P(a)	0	1	0	41,590.76
			A	0	1	0	41,590.76
1.19	Centros de educación y cuidado infantil evaluados con el instrumento de medición de calidad.	# centros de educación y cuida	P	640	980	0	91,500
			P(a)	230	980	0	366,000
			A	230	0	0	0
1.20	Pilotos de innovaciones en primera infancia implementados.	# pilotos de innovaciones	P	5	5	152,959	1,039,311
			P(a)	6	5	200,211.28	935,046.23
			A	5	5	81,957.78	556,114.73

#### Component Nbr. 2 Expansión y mejora de la calidad de Centros de Atención a la Infancia y Familia (CAIF)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Centros CAIF nuevos que cuentan con dotación de personal (técnico y de gestión) adecuado.	# centros CAIF	P	112	142	34,047	122,001
			P(a)	77	129	0	0
			A	77	77	0	0
2.2	Centros CAIF construidos.	# centros CAIF	P	35	50	10,649,793	37,939,310
			P(a)	19	29	5,882,457.01	37,285,143.44
			A	19	0	1,375,881.87	15,184,292.3
2.3	Centros CAIF que implementan el Programa de Parentalidades Comprometidas	# centros CAIF	P	70	70	48,800	592,787
			P(a)	70	70	118,792.02	765,211.79
			A	187	0	50,878.48	501,869.25
2.4	Centros de educación y cuidado infantil de INAU (CAIF, Nuestros Niños y CAPI) evaluados con el instrumento de medición de calidad de los centros validado.	# centros de educación y cuida	P	540	600	160,401	666,270
			P(a)	540	600	89,615.53	528,743.06
			A	10	0	34,990.55	233,290.08

#### Component Nbr. 3 Ejecución, evaluación y monitoreo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	Mediciones para la evaluación de impacto de CAIF realizadas.	# mediciones	P	1	3	0	915,000
			P(a)	0	3	0	0
			A	0	1	0	0

#### Other Cost

	Administración y ejecución del proyecto	P			1,436,330	6,393,153
		P(a)			255,601.35	2,941,668.11
		A			177,411.65	2,173,278.41
	Evaluación y Auditoría	P			10,000	60,000
		P(a)			8,843	43,487.7
		A			0	19,487.7

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Imprevistos	P				
		P(a)				5,534,213.15
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			14,485,071	65,000,000
		P(a)			9,999,923.46	65,000,000
		A			3,475,167.29	29,980,123.68

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Campañas de comunicación implementadas.	Se ajustó en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
	Centros CAIF construidos.	Se ajustó en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
				Modify Physical EOP P(a)	VALENTINAT	10/05/2020
	Centros CAIF nuevos que cuentan con dotación de personal (técnico y de gestión) adecuado.	Se ajustó en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Physical EOP P(a)	VALENTINAT	10/22/2020
	Centros CAIF que implementan el Programa de Parentalidades Comprometidas	Se ajustó el nombre del programa. Por error se había cargado como Parentalidades Positivas, cuando el mismo se llamó Parentalidades Comprometidas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
				Modify Output name	VALENTINAT	10/05/2020
	Centros de educación y cuidado infantil de INAU (CAIF, Nuestros Niños y CAPI) evaluados con el instrumento de medición de calidad de los centros validado.	Se ajustó el valor histórico en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
				Modify Physical Historical Actual	VALENTINAT	10/05/2020
	Centros de educación y cuidado infantil evaluados con el instrumento de medición de calidad.	Se ajustó el valor histórico en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	VALENTINAT	10/05/2020
	Centros de educación y cuidado infantil supervisados por MEC con el nuevo modelo.	Se ajustó el valor histórico en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
				Modify Physical EOP P(a)	VALENTINAT	10/22/2020
				Modify Physical Historical Actual	VALENTINAT	10/05/2020
	Centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisados por MEC o ANEP) censados	Se ajustó en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de	Se ajustó en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a	VALENTINAT	10/22/2020

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	formación del SNIC.			change in the Financial P(a).		
	Diseño de Registro Nacional de Cuidados aprobado por SNIC.	Se ajustó el valor histórico en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VALENTINAT	10/05/2020
				Modify Physical Historical Actual	VALENTINAT	10/05/2020
	Diseño de un censo de centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisado por MEC o ANEP)	Se ajustó en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
	Estudios de la agenda de conocimiento publicados en el sitio web.	Se ajustó en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
	Informes de avances y resultados de la agenda de conocimiento del SNIC elaborados y aprobados por SNIC y DINEM/MIDES.	Se ajustó en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
	Líneas de trabajo que cuentan con productos comunicacionales.	Se ajustó en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
	Mediciones para la evaluación de impacto de CAIF realizadas.	Se ajustó en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIMITRAS	10/22/2020
	Modelo de supervisión de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por MEC.	Se ajustó el valor histórico en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a	VALENTINAT	10/05/2020

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Modelo de supervisión de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por MEC.	Se ajustó el valor histórico en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	change in the Physical P(a).		
				Modify Physical Historical Actual	VALENTINAT	10/05/2020
	Módulos del Registro Nacional de Cuidados en funcionamiento.	Se ajustó en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
				Modify Physical EOP P(a)	VALENTINAT	10/22/2020
	Nuevas funcionalidades del Portal de Cuidados habilitadas con carga de datos de casos reales.	Se ajustó en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
				Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
	Personas valoradas en relación a su situación de dependencia.	Se ajustó el valor histórico en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
	Pilotos de innovaciones en primera infancia implementados.	Se ajustó en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
	Prestaciones reguladas.	Se ajustó el valor histórico en base a una revisión con la Unidad Ejecutora (se adjunta acta de la reunión).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	10/22/2020
	Prestadores Integrales de Servicios de Salud que reciben equipamiento o insumos necesarios para la atención hospitalaria de usuarios positivos de COVID-19	A fines de marzo de 2020, el Gobierno de Uruguay solicitó al Banco reorientar recursos del proyecto sin asignar a la compra de equipamiento para camas de terapia intensiva, en preparación a los impactos de la pandemia. Uruguay ha sido uno de los países menos afectados por COVID a nivel mundial, por lo que finalmente el Gobierno decidió no utilizar esos recursos. De esta forma el producto, que no estaba previsto en la programación inicial ni en la de 2020 ha sido desactivado.	Modify Output	Inactivate Output	MARIOSAN	10/23/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIMITRAS	10/21/2020

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

#### Lesson Learned - Categories

Project Monitoring & Evaluation
