

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1135	Chief of Operations Validation Date	10/22/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support Agricultural Public Management II	Loan Number	3800/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA	Sector/Subsector	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Team Leader	HINTZE, LUIS HERNANDO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1135	7,600,000	7,600,000	400,000	0	8,000,000	7,600,000	4,005,387.29	52.70%	3,594,612.71
Aggregated	7,600,000	7,600,000	400,000	0	8,000,000	7,600,000	4,005,387.29	52.70%	3,594,612.71

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

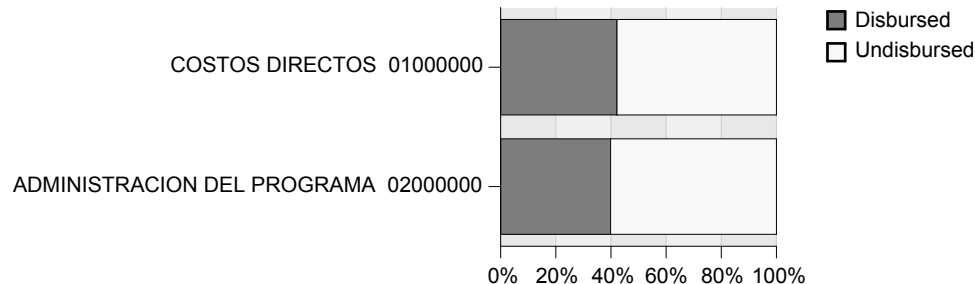

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Incrementar el valor de las exportaciones agroalimentarias de Uruguay

Observation: Indicador incluye únicamente carne, lácteos y granos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Valor de las exportaciones	Miles de U\$S	4,060.00	2015	P	4,400.00
					P(a)	4,400.00
					A	

Details

Means of verification: Uruguay XXI

Observations: Indicador incluye únicamente carne, lácteos y granos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Impact Nbr. 1: Incrementar los mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias

Observation: Suma de mercados de carne, lácteos y granos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias de Uruguay	Número de Mercados	302.00	2015	P	312.00
					P(a)	312.00
					A	

Details

Means of verification: MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

Observations: Suma de mercados de carne, lácteos y granos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Disminución del costo de trámites de exportación correspondientes al MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) en carne y lácteos

Observation: Estimado con base en 262.000 t de carne y 118.934 t de lácteos, año 2015

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Costo de trámites por tonelada - Carne	U\$S	5.55	2015	P		2.78
					P(a)		2.78
					A		

Details

Means of verification: Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

Observations: Estimado con base en 262.000 t de carne, año 2015

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Costo de trámites por tonelada - Lácteos	U\$S	2.15	2015	P		1.07
					P(a)		1.07
					A		

Details

Means of verification: Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

Observations: Estimado con base en 118.934 t de lácteos, año 2015

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)

Observation: El rubro de línea de base es pesca; los que se prevé incorporar son carne, lácteos y granos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)	Rubros	1.00	2015	P		4.00
					P(a)		4.00
					A		

Details

Means of verification: VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior) de Uruguay XXI

Observations: El rubro de línea de base es Pesca; los que se prevé incorporar son carnes, lácteos y granos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Disminución de observaciones de inocuidad en exportaciones de alimentos

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.0	Notificaciones anuales RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)	Número de notificaciones	6.00	2013	P		4.00
					P(a)		4.00
					A		
Details							
Means of verification: Reporte Anual del Food and Feed Safety Alerts (RASFF)							
Observations: Línea de base es promedio 2012-2014. Valor de fin de proyecto, Promedio 2021 - 2023							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 3: Mejora en la eficiencia del laboratorio

Observation: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
3.0	Plazo promedio para completar análisis - Servicios Ganaderos	Días	7.00	2015	P		3.00
					P(a)		3.00
					A		
Details							
Means of verification: MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)							
Observations: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
3.1	Plazo promedio para completar análisis - Servicios Agrícolas	Días	10.00	2015	P		5.00
					P(a)		5.00
					A		
Details							
Means of verification: MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)							
Observations: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Mejora de los servicios provistos por el MGAP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Herramienta Notificación Electrónica (HNE) operativa	Cantidad de Notificaciones ele	P	9,720	32,400	31,732	236,327
			P(a)	0	32,400	27,621	236,328.14
			A	0	0	22,669	187,051.14
1.2	Base de Datos de Domicilios Electrónicos constituida (BDDE)	Domicilios electrónicos consti	P	2,000	10,000	15,732	178,305
			P(a)	0	10,000	27,621	178,305.57
			A	0	0	22,669	128,449.57
1.3	Herramienta Expediente Electrónico (HEE) operativa	% de expedientes gestionados p	P	40	100	87,665	538,379
			P(a)	0	100	101,370	548,378.11
			A	0	0	44,755	381,099.11
1.4	Oficinas Clave (Equipadas, con Expediente Electrónico y funcionarios capacitados) implantadas en todas las unidades ejecutoras del MGAP	Oficinas clave	P	4	9	34,732	359,168
			P(a)	0	9	33,162	359,168.55
			A	0	0	17,836	162,836.55
1.5	100% de trámites cuentan con gestión total disponible vía web (línea de base 17%)	% de trámites con gestión tota	P	10	83	180,988	935,309
			P(a)	40	171	128,734	935,309.33
			A	30	161	75,269	457,898.33
1.6	Oficina MGAP de Treinta y Tres en campus Interinstitucional en territorio	Oficina construida y operanodo	P	0	1	24,424	710,471
			P(a)	0	1	258,326	710,471.16
			A	0	0	18,787	161,828.16
1.7	Centros Administrativos Regionales con gestión total	Centros Administrativos	P	1	4	17,471	348,033
			P(a)	0	4	24,086	348,033.66
			A	0	0	20,167	292,048.66
1.8	Funcionarios MGAP capacitados según Plan de Especialización en Gobierno Electrónico	Funcionarios Capacitados por e	P	5	25	62,256	320,535
			P(a)	13	49	8,176	320,534.94
			A	13	44	6,693	81,298.94

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2. Fortalecimiento de la gestión de la inocuidad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Sistema Integral de Gestión de Laboratorios (SIGLA) desarrollado e implantado	% de avance en desarrollo e im	P	20	100	165,485	925,743
			P(a)	13	100	141,755	925,742.26
			A	0	55	3,118	523,117.26
2.2	Laboratorios MGAP con SIGLA implantado	Laboratorios integrados al SIG	P	0	10	160,742	899,030
			P(a)	3	18	141,755	787,989.27
			A	0	3	3,118	343,884.27
2.3	Laboratorio de alimentos de origen animal funcionando	Grado de avance de obra y equi	P	20	100	84,742	724,030
			P(a)	0	100	333,664	835,072.16
			A	0	20	170,741	666,286.16
2.4	Análisis de sustancias en laboratorios agrícola y pesquero con sistema de gestión de calidad implementados según lineamientos UNIT-ISO 17025	No. de sustancias	P	2	23	4,742	119,030
			P(a)	3	23	4,255	119,029.18
			A	0	9	3,118	70,900.18
2.5	Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP	Protocolos aprobados	P	2	8	4,742	76,713
			P(a)	2	8	994	76,713.44
			A	1	5	938	16,239.44
2.6	Capacitación en análisis de riesgo aplicado a inocuidad	Reportes del observatorio	P	300	1,200	102,742	273,713
			P(a)	150	1,639	2,494	273,713.31
			A	90	1,129	2,438	63,169.31
2.7	Observatorio de exigencias y tendencias de exportación	Reportes del observatorio	P	6	24	54,742	226,713
			P(a)	18	71	17,381	226,711.94
			A	18	61	18,662	68,780.94
2.8	Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente operativo	Barreras Sanitarias con sistem	P	0	3	4,742	598,758
			P(a)	4	10	193,327	598,758.35
			A	3	5	55,966	200,126.35

Other Cost

	Administración del Programa (seguimiento, evaluación, auditorías)	P			102,010	529,743
		P(a)			72,309.93	529,742.38
		A			40,494	244,785.45

Total Cost

	Total Cost	P			1,139,689	8,000,000
		P(a)			1,517,030.93	8,010,001.75
		A			527,438	4,049,799.82

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	100% de trámites cuentan con gestión total disponible vía web (línea de base 17%)	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/07/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	10/08/2020
	Análisis de sustancias en laboratorios agrícola y pesquero con sistema de gestión de calidad implementados según lineamientos UNIT-ISO 17025	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/07/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	10/08/2020
	Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente operativo	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/07/2020
	Base de Datos de Domicilios Electrónicos constituida (BDDE)	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	10/08/2020
	Capacitación en análisis de riesgo aplicado a inocuidad	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	10/08/2020
	Centros Administrativos Regionales con gestión total	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/07/2020
	Funcionarios MGAP capacitados según Plan de Especialización en Gobierno Electrónico	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/07/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIMITRAS	10/07/2020
	Herramienta Expediente Electrónico (HEE) operativa	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	10/08/2020
	Herramienta Notificación Electrónica (HNE) operativa	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	10/08/2020
	Laboratorio de alimentos de origen animal funcionando	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/07/2020
	Laboratorios MGAP con SIGLA implantado	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/07/2020
	Observatorio de exigencias y tendencias de exportación	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/07/2020

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Observatorio de exigencias y tendencias de exportación	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIMITRAS	10/07/2020
	Oficina MGAP de Treinta y Tres en campus Interinstitucional en territorio	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/07/2020
	Oficinas Clave (Equipadas, con Expediente Electrónico y funcionarios capacitados) implantadas en todas las unidades ejecutoras del MGAP	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	10/08/2020
	Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	10/08/2020
	Sistema Integral de Gestión de Laboratorios (SIGLA) desarrollado e implantado	Los ajustes responden a la replanificación realizada por la Unidad Ejecutora en el contexto de cambio de gobierno y ajuste presupuestal del año 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/07/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
