

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1067	Chief of Operations Validation Date	10/27/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/26/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Strengthening of Integrated Health Networks in the Department of Potosi	Loan Number	2614/BL-BO, 2614/BL-BO-1, 2614/BL-BO-2
Executing Agency	MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	BUSCARONS CUESTA, LUIS	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	Bolivia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Debido a incumplimientos en las áreas de derechos de propiedad para la construcción del hospital, licencias ambientales (LASP). Se construyó el hospital de Llalagua en territorio indígena se establecieron acuerdos con el ayllu Chullpa y se acordaron medidas de compensación específicas que no se han cumplido, se desarrolló un plan de acción correctiva por primera vez en 2016, el cual no fue cumplido. La misión de supervisión del año 2020 mostró muy pocos avances en estas áreas identificadas, aunque el equipo BID ha realizado un esfuerzo conjunto, la reacción de las entidades ejecutoras para resolver los temas pendientes es insuficiente. Por los reiterados incumplimientos la clasificación de desempeño ha cambiado a Insatisfactorio.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1067	35,000,000	35,000,000	7,270,000	0	42,270,000	35,000,000	35,000,000	100.00%	0
Aggregated	35,000,000	35,000,000	7,270,000	0	42,270,000	35,000,000	35,000,000	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

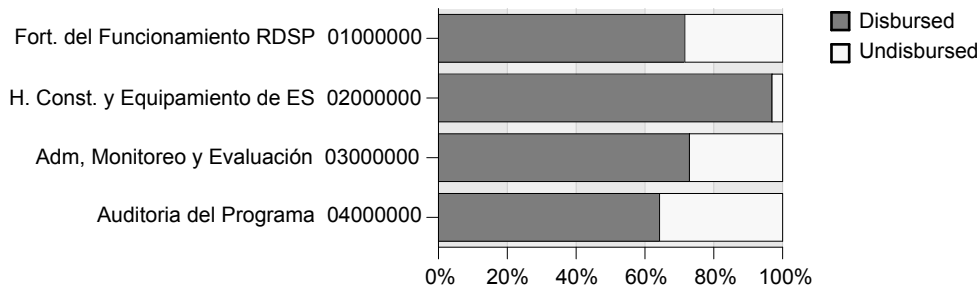

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mortalidad materno infantil en el Departamento de Potosi reducida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2021
1.1	Tasa de mortalidad infantil por 1000 NV	por 1000 NV	50.00	2003	P								30.00
					P(a)								30.00
					A				0.00		30.00		

Details

Means of verification: Encuesta Nacional de Demografia y Salud

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2021
1.2	Razon de Mortalidad materna en el Departamento de Potosi	Razon	310.00	2008	P								100.00
					P(a)								100.00
					A				0.00		100.00		

Details

Means of verification: Encuesta Nacional de Demografia y Salud

Observations: Existe discrepancias entre las cifras de fuentes nacionales (Ministerio de Salud) e internacionales (OMS/OPS) para este indicador, siendo los internacionales en el rango de 350 - 400 para Potosí. Adicionalmente, es probable que en los primeros años de ejecución, se registrarán más muertes por mejoras en el registro. (2015, esta por publicarse un estudio específico sobre mortalidad materna a partir del levantamiento de información en puestos "Centinela")

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2021
1.3	Tasa de Mortalidad neonatal	por 1000 NV	27.00	2003	P								0.00
					P(a)								11.18
					A				0.00		11.18		

Details

Means of verification: Encuesta Nacional de Demografia y Salud

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Acceso a servicios de salud de calidad en el Departamento de Potosi mejorado

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2021
1.1	Cobertura de Parto Institucional	porcentaje	36.00	2010	P							55.00
					P(a)							55.00
					A			0.00	50.00	64.40		

Details

Means of verification: SNIS Departamental (Potosí)

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2021
1.2	Mujeres con complicación obstétrica atendidas en Hospital	Porcentaje	56.00	2010	P							80.00
					P(a)							80.00
					A			0.00		20.10		

Details

Means of verification: Registros hospitalarios

Observations: El proyecto deberá establecer un sistema de monitoreo específico para este indicador.

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2021
1.3	Disponibilidad de mantenimiento de equipos médicos y no médicos por nivel de establecimientos de salud	Porcentaje	10.00	2011	P							50.00
					P(a)							50.00
					A			0.00		0.00		

Details

Means of verification: Informes específicos del proyecto.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2021
1.4	Establecimientos de Salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes en cuanto a infraestructura, equipo y Recursos Humanos	Número	2011	P								200.00
				P(a)								13.00
				A				0.00		13.00		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details													
Means of verification: Informes de Servicio Departamental de Salud, al final del proyecto se puede verificar con el Estudio de Brechas													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2021
1.5	Recursos Humanos con capacitación CONE por tipo de establecimiento de salud	Personas	50.00	2011	P								200.00
					P(a)							200.00	
					A				0.00		0.00		
Details													
Means of verification: Informe específico del proyecto.													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2021
1.6	Personas Atendidas por un paquete básico de servicios de salud, que incluye parto institucional (madre y niño)	# of beneficiaries	1,902.00	2013	P	0.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00			5,000.00
					P(a)	0.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00			5,000.00
					A		0.00	0.00	0.00		20,271.00		
Details													
Means of verification: Registro del Bono Juana Azurduy													
Observations: Se considerará al binomio Madre - Hijo que ha recibido atención al parto y atención post-parto													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No							
	Indigenous					P							
						P(a)							5,000.00
						A					20,271.00		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la Red Departamental de Potosi

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Diagnosticos del sector salud realizados.	Estudio	P		3		100,000
			P(a)		3		128,305.14
			A		3		128,305.14
1.2	Plan de promoción de salud implementado	Plan	P		1		1,018,000
			P(a)		1	9,943	348,015.79
			A		1	9,943	337,326.79
1.3	Obstetricas incorporadas al sistema de salud	Personas	P		30		210,000
			P(a)		30		535,612
			A		30		535,612
1.4	Personal de los centros de primer nivel capacitado	Personas	P		200		200,000
			P(a)	34	306	10,904	177,071.15
			A	34	306	10,903.73	177,070.88
1.5	Sistema de Comunicación de referencias y urgencias implementado	Sistema	P		1		500,000
			P(a)		1	6,768	1,460,697.77
			A		1	1,100	1,454,502.77
1.6	Protocolo de referencia y retorno elaborado y/o adecuado	Documento	P		1		75,000
			P(a)		1		5,002.48
			A		1		5,002.48
1.7	Unidad de transporte para referencias y urgencias incorporada	Unidad	P		1		450,000
			P(a)		1		311,867
			A		1		311,867
1.8	Estrategia de Gestión Institucional de la Red Departamental implementada	Estrategia	P		1		1,314,000
			P(a)		1	0	1,495,500.3
			A		1	0	1,490,993.3
1.9	Personas capacitadas en mantenimiento de equipo médico-industrial, gestión financiera-administrativa y/o gestión de infraestructura y personal	Personas	P		90		280,000
			P(a)	65	90	33,964	327,508.02
			A	100	125	7,754	296,486.02
1.10	Sistema de Gestión de Medicamentos implementado	Sistema	P		1		68,000
			P(a)	0	1	0	61,747.76
			A	0	1	0	37,494.76

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Inversiones en infraestructura y equipamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Hospital "Madre Obrera" de Llalagua diseñado	Hospital	P		1		310,000
			P(a)		1		452,429.71
			A		1		452,429.71
2.2	Hospital "Madre Obrera" de Llalagua construido	Hospital	P		1		6,730,000
			P(a)		1	531,990.28	12,488,745.89
			A		1	12,224	11,968,979.61
2.3	Hospital "Madre Obrera" de Llalagua equipado	Hospital	P		1		2,106,000
			P(a)		1	81,912.46	1,224,358.27
			A		1	81,912.45	1,224,358.26
2.4	Hospital Ocuri construido	Hospital	P		1		4,200,000
			P(a)		1	711,222.53	6,987,895.8
			A		1	20,000	6,037,970.01
2.5	Hospital de Ocurí equipado	Hospital	P		1		1,180,000
			P(a)		1		516,210.22
			A		1		516,210.22
2.6	Hospitales de Ocurí y Llalagua operando	Hospital	P		2		4,220,000
			P(a)	0	2	20,489	4,220,000
			A	0	0	16,895	43,527
2.7	Centro de coordinación de urgencias construido	Centro	P		1		450,000
			P(a)		1		1,049,893.47
			A		1		1,049,893.47
2.8	Establecimientos de salud ampliados y/o remodelados	Establecimiento	P		1		2,800,000
			P(a)		7		2,732,912.87
			A		7		2,732,912.87
2.9	Establecimientos de salud construidos	Establecimiento	P		2		1,800,000
			P(a)		2	3,000	1,942,152.62
			A		2	3,000	1,942,152.62
2.10	Establecimientos de salud equipados	Establecimiento	P		8		8,549,185
			P(a)		11	0	2,030,260.46
			A		11	0	2,030,175.9

Component Nbr. 3 Administracion y Monitoreo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
3.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Administración y/o fortalecimiento institucional MSD y SEDES	P			740,000
		P(a)		93,604	1,546,357
		A		83,159	1,482,022
	Auditorías	P			200,000
		P(a)		40,816.33	225,000.04
		A		8,163	172,264.03

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Imprevistos	P				995,000
		P(a)				0
		A				0
	Monitoreo y evaluación	P				1,100,000
		P(a)			0	137,316.06
		A			0	117,316.06
	Administración y/o fortalecimiento institucional FPS	P				2,674,815
		P(a)				1,865,140.18
		A			0	1,849,018.88

Total Cost

	Total Cost	P				42,270,000
		P(a)			1,544,613.6	42,270,000
		A			255,054.18	36,393,891.78

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Intra/Inter Coordination
