

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1285	Chief of Operations Validation Date	04/12/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/14/21
Last Update	03/26/21	Country Representative Validation Date	04/28/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Provincial Management Strengthening Program II	Loan Number	4753/OC-AR
Executing Agency	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
Team Leader	GOMEZ REINO, JUAN LUIS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La operación aún no es elegible. Hay un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) completo, pero que aún requiere ser fortalecido con un Plan de Gestión de Sustancias Peligrosas, un Protocolo para la Gestión de riesgos de desastres naturales, y un Programa de Seguridad Vial y Protección de la Comunidad. El Área Ambiental y Social (AAS) de la agencia ejecutora tiene capacidad para gestionar los aspectos ambientales, sin embargo, carece de personal social, que deberá ser asignado o contratado previo al primer desembolso.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1285	150,000,000	150,000,000	0	50,000,000	200,000,000	150,000,000	0	0.00%	150,000,000
Aggregated	150,000,000	150,000,000	0	50,000,000	200,000,000	150,000,000	0	0.00%	150,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

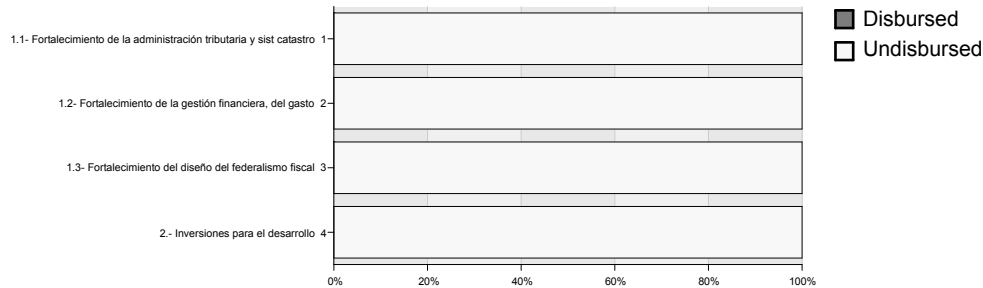

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Reducción del déficit financiero

Observation: Se eliminaron 4 indicadores como se acordó en el taller de arranque. SDV eliminó los indicadores en Marzo de 2021 porque el sistema no permitió al equipo eliminarlos al arranque. Los documentos de soporte son EZSHARE-9318490003-15, EZSHARE-9318490003-13, EZSHARE-9318490003-22

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Déficit total financiero (como % de ingresos) de las provincias participantes . Buenos Aires	%	3.70	2019	2024	P	1.90
						A	

Details

Means of verification: Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			
	No		

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Déficit total financiero (como % de ingresos) de las provincias participantes . Datos agregados para las restantes 11 jurisdicciones priorizadas: Chaco, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro, Entre Ríos; Formosa, La Pampa y Misiones	%	2.90	2019	2024	P	1.10
						A	

Details

Means of verification: Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			
	No		

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: RESULTADO #1: Incremento en la participación de impuestos de baja distorsión en los ingresos

Observation: Datos administrativos de las provincias, Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior. La mejora en la recaudación del impuesto inmobiliario se dará con intervenciones en los pilares del sistema: catastro, registro de la propiedad y sistema de rentas, en función de las debilidades específicas de cada provincia.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.0	Recaudación del impuesto inmobiliario consolidado (% de los ingresos totales de la provincia) en las provincias participantes	% (ARS\$/ ARS\$)	0.14	2019	P		1.40	1.40	2.30	2.30	3.50	3.50
					A							

Details

Means of verification: Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV

Observations: La mejora en la recaudación del impuesto inmobiliario se dará con intervenciones en los pilares del sistema: catastro, registro de la propiedad y sistema de rentas, en función de las debilidades específicas de cada provincia

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 2: RESULTADO #2: Incremento de la eficiencia del gasto

Observation: Informe ASAP. Tomando como base los mandatos que la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal (N° 25.917) establece en el artículo 7° (texto actualizado por el artículo 4° de la Ley N° 27.428) para las jurisdicciones provinciales, se ha confeccionado un índice de cumplimiento que pondera los diferentes requerimientos establecidos en la misma, de modo de poder realizar un ranking de cumplimiento. Se caracterizan 4 grupos, el Grupo I las jurisdicciones de mejor desempeño hasta llegar al Grupo IV las de peor desempeño. Las metas esperadas para las del Grupo i son de una mejora del 3%, Grupo II del 5%, grupo III del 8% y grupo IV del 10% (a medio término, y del 5%, 10%, 15% y 20% respectivamente para la meta final (Grupo I: Entre Ríos, San Juan, Tucumán, Río Negro y Santa Fe; Grupo II: Caho y Misiones; Grupo III: Santa Cruz y La Pampa, Grupo IV: Buenos Aires, Formosa y Santiago del Estero)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.0	Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal	% Provincias	58.60	2019	P		58.60	58.60	61.60	61.60	67.10	67.10
					A							

Details

Means of verification: Reporte del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal

Observations: La certificación se hace en base a los requerimientos establecidos en el artículo 9 de la Ley N° 27.428. Esta certificación está orientada por criterios de reducción en los tiempos de reporte de información financiera y seguimiento en la ejecución de gasto. Para las provincias participantes se estimaron indicadores PEFA que evalúan los desvíos en la ejecución del gasto. Misiones D; Jujuy D; Río Negro D; Entre Ríos C; Tierra del Fuego D; y Chaco D. Se espera que la certificación eleve la calificación en al menos un nivel.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 3: RESULTADO #3: Incremento de la inversión

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
3.3	Inversión (% del gasto total) en las provincias participantes. Alta: Buenos Aires Misiones, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero	(ARS\$/ ARS\$)	13.30	2019	P			17.80		20.00	20.00
					A						

Details

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
3.4	Inversión (% del gasto total) en las provincias participantes. Mediana: Entre Ríos Formosa, La Pampa, Río Negro	(ARS\$/ ARS\$)	9.30	2019	P				12.20		15.00	15.00
					A							

Details

Means of verification: Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
3.5	Inversión (% del gasto total) en las provincias participantes. Baja: Chaco, Santa Cruz y Tucumán	(ARS\$/ ARS\$)	3.40	2019	P				6.70		10.00	10.00
					A							

Details

Means of verification: Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I. Fortalecimiento de la administración tributaria y financiera. Subcomponente 1.1. Fortalecimiento de la administración tributaria y sistemas de catastro

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Sistemas de Información Territorial instalados	# of agencies	P		5		6,700,000
			P(a)		3		6,700,000
			A		0		0
1.2	N° de GP con Sistemas de Registros de la Propiedad modernizados	# of agencies	P		3		3,719,615
			P(a)		2		3,719,615
			A		0		0
1.3	N° de GP con Sistemas de Administración Tributaria modernizados	# of agencies	P		4		5,830,385
			P(a)		4		5,830,385
			A		0		0

Component Nbr. 2 Componente I. Fortalecimiento de la administración tributaria y financiera. Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de la gestión financiera, del gasto público y de la inversión provincial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	N° de GP con Planes Estratégicos de Desarrollo	Provincias	P		6		2,362,500
			P(a)		6		2,362,500
			A		0		0
2.2	N° de Diagnósticos del estado de integralidad y modernización de los sistemas de administración financiera	Diagnósticos	P		12		405,000
			P(a)		12		405,000
			A		0		0
2.3	N° de GP con Sistemas y/o Módulos de Administración Financiera modernizados	Provincias	P		4		2,982,500
			P(a)		4		2,982,500
			A		0		0
2.4	N° de GP con Sistemas de Inversión Pública fortalecidos	Provincias	P		5		2,700,000
			P(a)		5		2,700,000
			A		0		0
2.5	N° de GP con sistemas de gestión orientados a la mejora de servicios, desarrollados y/o fortalecidos	Provincias	P		5		1,700,000
			P(a)		5		1,700,000
			A		0		0

Component Nbr. 3 Componente I. Fortalecimiento de la administración tributaria y financiera. Subcomponente 1.3. Fortalecimiento del diseño del Federalismo Fiscal Argentino

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
3.1	Software de sistema de información socioeconómica de las economías regionales fortalecido	Software	P		1		902,527
			P(a)		1		902,527
			A		0		0
3.2	Estudio de indicadores y medición del costo de prestación de servicio realizado/publicado	Estudios	P		3		863,214
			P(a)		3		863,214
			A		0		0
3.3	Estudios de diseño del Sistema Tributario Provincial realizado/publicado	Estudios	P		5		1,244,231
			P(a)		5		1,244,231
			A		0		0
3.4	Estudio de cálculo del PBG	Estudios	P		3		490,028
			P(a)		3		490,028
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Componente II. Inversiones para el desarrollo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
4.1	N° de obras financiadas por el Fondo Inicial	Obras Recibidas	P		12		75,150,000
			P(a)		12		75,150,000
			A		0		0
4.2	N° de obras financiadas por el Fondo Complementario	Obras Recibidas	P		8		45,850,000
			P(a)		8		45,850,000
			A		0		0
4.3	Fondo de contingencias, ajustes y preinversión	Obras Recibidas	P		1		5,000,000
			P(a)		1		5,000,000
			A		0		0

Component Nbr. 5 Componente III. Apoyo a la sustentabilidad fiscal provincial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
5.1	N° de GP con Sistemas de gestión Catastral implementados	# of agencies	P		6		8,424,000
			P(a)		6		8,424,000
			A		0		0
5.2	N° de GP con Sistemas de Administración Tributaria implementados	# of agencies	P		6		8,073,000
			P(a)		6		8,073,000
			A		0		0
5.3	N° de GP con Planes Estratégicos de Desarrollo y proyectos de inversión de sectores estratégicos formulados	Provincias	P		6		5,265,000
			P(a)		8		5,265,000
			A		0		0
5.4	Estudios que cuantifican los programas provinciales con criterio de equidad de género aprobado/publicado	Estudio	P		4		4,914,000
			P(a)		4		4,914,000
			A		0		0
5.5	Organismo de Valuaciones para un Sistema de Información Territorial Federal estipulado en la Ley N° 27.429, creado y operativo	Organismo	P		1		4,212,000
			P(a)		1		4,212,000
			A		0		0
5.6	Proyectos de Fortalecimiento Institucional Organos Rectores	Proyectos	P		3		4,212,000
			P(a)		3		4,212,000
			A		0		0

Other Cost

	Administración y gestión del programa	P				9,000,000
		P(a)				9,000,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P				200,000,000
		P(a)				200,000,000
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	N° de GP con Planes Estratégicos de Desarrollo y proyectos de inversión de sectores estratégicos formulados	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VANINAD	03/24/2021
	N° de GP con Sistemas de Administración Tributaria modernizados	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	JGOMEZREINO	03/22/2021
	N° de GP con Sistemas de Registros de la Propiedad modernizados	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VANINAD	03/24/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	JGOMEZREINO	03/22/2021
	N° de GP con Sistemas de Administración Tributaria implementados	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	JGOMEZREINO	03/22/2021
	N° de GP con Sistemas de gestión Catastral implementados	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	JGOMEZREINO	03/22/2021
	Sistemas de Información Territorial instalados	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VANINAD	03/24/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	JGOMEZREINO	03/22/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Stakeholder Priorities
