

PMR Public Report

Operation Number	BO-L1198	Chief of Operations Validation Date	04/19/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/19/21
Last Update	04/16/21	Country Representative Validation Date	05/13/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to improve accessibility to maternal and Neonatal health services in Bolivia	Loan Number	4612/BL-BO, 4612/BL-BO-1, 4612/BL-BO-2
Executing Agency	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO, EQUIPAMIENTO MÉDICO, AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y MISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	BUSCARONS CUESTA, LUIS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Bolivia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Se evidencia avances limitados en relación con la situación encontrada en la misión del 2019, esto debido al contexto de pandemia del COVID 19 que ha paralizado las actividades previstas, especialmente las referidas a la realización de documentos de analisis sociambientales, PGAS y realizacion de consultas publicas.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1198	275,000,000	275,000,000	0	0	275,000,000	275,000,000	53,986,998	19.63%	221,013,002
Aggregated	275,000,000	275,000,000	0	0	275,000,000	275,000,000	53,986,998	19.63%	221,013,002

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

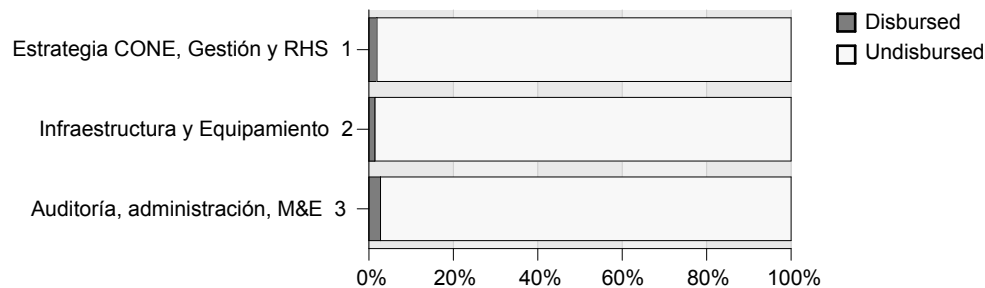

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Morbi-mortalidad materna y neonatal reducida

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	1. Razón de mortalidad materna en el país	Razón	160.00	2011	-	P	140.00
						A	

Details

Means of verification: Estudio de mortalidad / Ministerio de Salud

Observations: Se utilizó para la línea de base la metodología de las hermanas y autopsia verbal post censal 2012 CRF, indicador#2

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	2. Tasa de mortalidad neonatal en el país	Tasa	27.00	2008	-	P	22.00
						A	

Details

Means of verification: Estudio de mortalidad / Ministerio de Salud

Observations: Línea de base: Último valor estimado a través de encuesta poblacional ENDSA 2008

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: 1. Calidad y Accesibilidad de los cuidados obstétricos, neonatales y de la Planificación Familiar, incrementada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.1	Partos atendidos en establecimientos de salud	%	71.44	2017	P		85.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE

Observations: En las 9 redes de salud priorizadas para el año 2017 (información SNIS-VE cerrada)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.2	Partos atendidos en hospital/centro integral de salud	%	53.07	2017	P		63.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE

Observations: En las 9 redes de salud priorizadas para el año 2017 (información SNIS-VE cerrada)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.3	Mujeres embarazadas que reciben atención prenatal antes de la semana 20	%	89.06	2017	P		94.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE

Observations: En las 9 redes de salud priorizadas para el año 2017 (información SNIS-VE cerrada)

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.4	Mujeres que reciben al menos 4 controles obstétricos	%	73.18	2017	P		85.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observations: En las 9 redes de salud priorizadas para el año 2017 (información SNIS-VE cerrada)

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.5	Recién nacidos que reciben atención posnatal antes de las 48 horas	%	65.28	2017	P		75.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE

Observations: En las 9 redes de salud priorizadas para el año 2017 (información SNIS-VE cerrada)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.6	Mujeres en edad fértil que utilizan métodos modernos de Planificación Familiar (PF)	%	42.21	2017	P		55.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE

Observations: En las 9 redes de salud priorizadas para el año 2017 (información SNIS-VE cerrada)

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.7	Embarazadas desnutridas	%	7.37	2017	P		5.50
					A		

Details

Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE

Observations: En las 9 redes de salud priorizadas para el año 2017 (información SNIS-VE cerrada)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.8	Prevalencia de bajo peso a nacer	Tasa	27.41	2017	P		18.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observations: En las 9 redes de salud priorizadas para el año 2017 (información SNIS-VE cerrada)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.9	Frecuentación hospitalaria (internamiento) (desagregado entre hombres y mujeres)	Tasa	141.20	2017	P	190.00
					A	

Details

Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE

Observations: En los 9 Hospitales 2º nivel priorizados

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Mujeres - Línea base = 99,22 mujeres x 1000 Hbts				P	125.00
					A	
	Hombres - Línea base = 41,98 varones x 1000 Hbts				P	65.00
					A	

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.10	Frecuentación hospitalaria (consultas) (desagregado entre hombres y mujeres)	Tasa	1,344.42	2017	P	1,550.00
					A	

Details

Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE

Observations: En los 9 Hospitales 2º nivel priorizados

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Mujeres - Línea base = 781,63 mujeres x 1000 Hbts				P	900.00
					A	
	Hombres - Línea base = 562,79 varones x 1000 Hbts				P	650.00
					A	

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.10	Egresos hospitalarios (beneficiarios que reciben servicios de salud).	Personas	20,568.00	2017	P	26,739.00
					A	

Details

Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observations: En los 9 Hospitales 2° nivel priorizados CRF, indicador#9

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No
	Mujeres - Línea base = 14,453			P	18,789.00
				A	
	Hombres - Línea base = 6,115			P	7,950.00
				A	

Specific Development Objectives Nbr. 2: 2. Capacidad resolutive de la red de servicios de salud, incrementada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.1	Tasa de mortalidad neonatal hospitalaria temprana en el municipio de El Alto (la tasa es por 1,000 NV)	Tasa	1.91	2017	P		1.30
					A		

Details

Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE

Observations: En el Municipio de El Alto

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.2	Referencias hospitalarias recibidas AJO (Adecuada – Justificada – Oportuna, promedio)	%	30.00	2018	P		51.00
					A		

Details

Means of verification: SIRECO

Observations: En las redes de salud priorizadas. La línea de base determinada a partir de las redes Los Andes y Potosí (sistema SIRECO)

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No
	Adecuadas - Línea base = 26%			P	51.00
				A	
	Justificadas - Línea base = 35%			P	51.00
				A	
	Oportunas - Línea base = 29%			P	51.00
				A	

Specific Development Objectives Nbr. 3: 3. Capacidad de gestión y eficiencia de las redes y establecimientos de salud, incrementadas

Observation:

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.1	Estancia media en los hospitales de 2do nivel intervenidos	Días	3.50	2017	P		3.10
					A		
Details							
Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE							
Observations: En los 9 Hospitales de 2º nivel priorizados							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.2	Egresos por cama	Número	72.10	2017	P		85.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE							
Observations: En los 9 Hospitales de 2º nivel priorizados							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.3	Ocupación de camas	%	52.61	2017	P		75.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE							
Observations: En los 9 Hospitales de 2º nivel priorizados							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.4	Unidad Ponderada de Asistencia (UPA) producidas por personal asistencial en hospitales de 2do nivel intervenidos	Número	865.75	2017	P		975.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE							
Observations: En los 9 Hospitales de 2º nivel priorizados							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.5	Costo de la UPA en hospitales de 2do nivel intervenidos	Bs/UPA	481.28	2017	P		460.00
					A		
Details							
Means of verification: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. SNIS-VE							
Observations: En los 9 Hospitales de 2º nivel priorizados							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Estrategia CONE, gestión y formación de Recurso Humano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	1.1 Estrategia CONE implementada	Redes	P		15	170,000	1,125,000
			P(a)		15		499,999.9
			A		0		0
1.2	1.2 Programa de mejora continua de la calidad en CONE, elaborado e implementado	Redes	P		15	300,000	1,125,000
			P(a)		15		500,000
			A		0		0
1.3	1.3 Plataformas de capacitación comunitarias para la captación y control de embarazadas, desarrolladas y funcionando	Redes	P		15		750,000
			P(a)		15		400,000
			A		0		0
1.4	1.4 Programas de Información, Educación y Comunicación (IEC) para el cambio de comportamiento en relación con la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar implementados	Redes	P		15	56,044	250,000
			P(a)		15	29,776	141,752
			A		0	21,528	32,612
1.5	1.5 Intervenciones de mejora de situación nutricional de mujeres embarazadas y neonatos implementadas en establecimientos de salud (EESS) de las redes intervenidas	Establecimientos de Salud	P		200	85,744	250,000
			P(a)		200		250,000
			A		0		0
1.6	1.6 Licenciadas en enfermería obstétrica incorporadas en las redes a nivel comunitario	Personas	P	20	60	360,000	2,160,000
			P(a)	25	60	53,360	1,808,037
			A	18	18	61,397	61,397
1.7	1.7 Fortalecimiento del sistema de compras centralizada de insumos y medicamentos del sector implementado	Sistema	P		1	46,784	200,000
			P(a)		1		150,000
			A		0		0
1.8	1.8 Fortalecimiento del sistema de Bancos/depositos de Sangre Segura implementado	Sistema	P		1	50,000	600,000
			P(a)		1		300,000
			A		0		0
1.9	1.9 Fortalecimiento de los sistemas de referencia y contra-referencia de 15 redes implementado	Sistema	P		15	257,000	1,375,000
			P(a)		15		800,000
			A		0		0
1.10	1.10 Modelo de gestión en los hospitales que incremente la eficiencia y calidad de atención implementado en 15 hospitales intervenidos	Hospitales	P	1	15	84,846	750,000
			P(a)		15		600,000
			A		0		0
1.11	1.11 Fortalecimiento de los sistemas de gestión a nivel municipal y coordinaciones de red implementado	Cuadro de mando	P		2	50,000	2,056,000
			P(a)		2		981,600
			A		0		0
1.12	1.12 Sistemas de información para gestión clínica implementados	Sistema	P		1	50,000	4,000,000
			P(a)		1		3,600,000
			A		0		0
1.13	1.13 Metodología RAMOS de vigilancia de mortalidad materna implementada en Potosí	Estudio	P	1	1	209,000	209,000
			P(a)		1		209,000
			A		0		0
1.14	1.14 Fortalecimiento de capacidades clínico-diagnósticas y terapéuticas del personal de salud mediante programas de formación completado	Redes	P		15		200,000
			P(a)		15		150,000
			A		0		0
1.15	1.15 Formación en gestión hospitalaria destinada a los cuadros directivos de los hospitales, redes de salud y SEDES	Personas	P		70		350,000
			P(a)		70		300,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.15	1.15 Formación en gestión hospitalaria destinada a los cuadros directivos de los hospitales, redes de salud y SEDES	Personas	A		0		0
1.16	1.16 Becas de formación finalizadas para médicos especialistas a incorporarse a los hospitales del programa	Personas	P		50		1,200,000
			P(a)		50		909,611.1
			A		0		0
1.17	Establecimientos de salud fortalecidos para la atención del COVID-19 (insumos, medicamentos, reactivos, instrumental, equipamiento y otros)	Establecimientos de salud	P		0		0
			P(a)	18	18	1,368,794	1,368,794
			A	18	18	1,368,794	1,368,794
1.18	Establecimientos de salud fortalecidos para la atención del CONE (insumos, medicamentos, reactivos, instrumental, equipamiento y otros)	Establecimientos de salud	P		0		0
			P(a)	0	15	0	3,631,206
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Infraestructura y equipamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	2.1 Equipamiento Hospital El Alto Norte completado	Hospital Equipado	P	1	1	1,290,840	1,302,282
			P(a)	0	1	210,529	1,339,368
			A	0	0	69,869	69,869
2.2	2.2 Equipamiento Hospital El Alto Sur completado	Hospital Equipado	P	1	1	4,220,153	4,220,153
			P(a)	0	1	930,395	6,169,518
			A	0	0	157,007	157,007
2.3	2.3 Equipamiento Hospital de Ocurí completado	Hospital Equipado	P	1	1	4,386,939	4,386,939
			P(a)	0	1	837,692	3,512,821
			A	0	0	713,516	713,516
2.4	2.4 Equipamiento Hospital de Llallagua completado	Hospital Equipado	P	1	1	8,426,226	8,426,226
			P(a)	0	1	1,537,615	7,313,892
			A	0	0	1,552,101	1,552,101
2.5	2.5 Equipamiento Hospital Tercer Nivel de Potosí completado	Hospital Equipado	P		1	24,931,520	31,164,400
			P(a)		1	0	31,164,400
			A		0	0	0
2.6	2.6 Hospitales de segundo nivel construidos, equipados y operando	Hospital	P		8	17,145,343	120,688,000
			P(a)		8	0	116,054,392
			A		0	0	31,358.47
2.7	2.7 Hospital de segundo nivel Puerto Suárez, equipado y operando	Hospital	P		1	1,929,915	5,439,759
			P(a)		1		5,439,759
			A		0		0
2.8	2.9 Hospital Materno, Infantil y Pediátrico de 3er nivel, diseñado	Diseño	P		1	799,350	1,095,000
			P(a)		1		1,095,000
			A		0		0
2.9	2.10 Hospital Materno, Infantil y Pediátrico de 3er nivel, construido	Hospital	P		1		39,747,880
			P(a)		1		39,747,800
			A		0		0
2.10	2.11 Hospital Materno, Infantil y Pediátrico de 3er nivel, equipado	Hospital Equipado	P		1		26,780,000
			P(a)		1		26,780,000
			A		0		0
2.11	2.12 Supervisión del diseño y construcción, y asistencia técnica para la puesta en marcha del Hospital de 3er nivel realizada	Hospital	P		1	137,712	1,377,120
			P(a)		1		1,377,120
			A		0		0
2.12	2.13 Planes de apertura y/o migración de los nuevos hospitales, elaborados	Plan	P		9		100,000
			P(a)		9		100,000
			A		0		0
2.13	2.14 Asistencia técnica para puesta en marcha y acompañamiento de hospitales 2do y 3er nivel, completada	Planes	P		9		2,600,000
			P(a)		9	138,655	2,600,000
			A		0	113,123	113,123
2.14	Establecimientos de salud equipados para la atención de COVID 19	Establecimientos de salud	P		0		0
			P(a)	15	19	4,239,291	7,005,930
			A	19	19	4,246,943	4,246,943

Other Cost

3.1 Equipos ejecutores del programa contratados (Especialistas técnicos, sociales y ambientales, contratados) - AISEM	P			974,347	4,550,000
	P(a)			229,000	4,550,000
	A			123,495	229,184
3.2 Asistencia para incrementar capacidades técnicas de la AISEM	P			50,000	300,000
	P(a)			0	300,000
	A			0	0
3.3 Auditoria - AISEM	P			50,000	250,000
	P(a)			20,000	250,000
	A			0	0
3.4 Equipos ejecutores del programa contratados (Especialistas técnicos, sociales y ambientales, contratados) - UGESPRO	P			450,000	2,150,000
	P(a)			264,973	2,150,000
	A			262,541	264,360
3.5 Auditoría UGESPRO	P			50,000	250,000
	P(a)			0	250,000
	A			0	0
3.6 Evaluación y monitoreo	P			50,000	300,000
	P(a)			0	300,000
	A			0	0
3.7 Evaluación de impacto	P				900,000
	P(a)				900,000
	A				0

Total Cost

Total Cost	P			66,611,763	275,000,000
	P(a)			9,860,080	275,000,000
	A			8,690,314	8,840,264.47

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.1 Estrategia CONE implementada	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/09/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	04/01/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/09/2021
	1.10 Modelo de gestión en los hospitales que incremente la eficiencia y calidad de atención implementado en 15 hospitales intervenidos	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	1.11 Fortalecimiento de los sistemas de gestión a nivel municipal y coordinaciones de red implementado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	1.12 Sistemas de información para gestión clínica implementados	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	1.13 Metodología RAMOS de vigilancia de mortalidad materna implementada en Potosí	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	1.14 Fortalecimiento de capacidades clínico-diagnósticas y terapéuticas del personal de salud mediante programas de formación completado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	1.16 Becas de formación finalizadas para médicos especialistas a incorporarse a los hospitales del programa	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	04/08/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	1.2 Programa de mejora continua de la calidad en CONE, elaborado e implementado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/09/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/09/2021
	1.3 Plataformas de capacitación comunitarias para la captación y control de embarazadas, desarrolladas y funcionando	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	1.4 Programas de Información, Educación y Comunicación (IEC) para el cambio de comportamiento en relación con la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar implementados	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	1.5 Intervenciones de mejora de situación nutricional de mujeres embarazadas y neonatos implementadas en establecimientos de salud (EESS) de las redes intervenidas	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	04/01/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Unit of Measure	JOYCEE	04/08/2021
	1.6 Licenciadas en enfermería obstétrica incorporadas en las redes a nivel comunitario	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/09/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	03/18/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/09/2021
	1.7 Fortalecimiento del sistema de compras centralizada de insumos y medicamentos del sector implementado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.8 Fortalecimiento del sistema de Bancos/depósitos de Sangre Segura implementado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	1.9 Fortalecimiento de los sistemas de referencia y contra-referencia de 15 redes implementado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	2.1 Equipamiento Hospital El Alto Norte completado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	04/01/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Unit of Measure	JOYCEE	04/08/2021
	2.10 Hospital Materno, Infantil y Pediátrico de 3er nivel, construido	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	04/01/2021
	2.11 Hospital Materno, Infantil y Pediátrico de 3er nivel, equipado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Unit of Measure	JOYCEE	04/08/2021
	2.12 Supervisión del diseño y construcción, y asistencia técnica para la puesta en marcha del Hospital de 3er nivel realizada	Modify Output	Modify Unit of Measure	JOYCEE	04/08/2021
	2.13 Planes de apertura y/o migración de los nuevos hospitales, elaborados	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	2.14 Asistencia técnica para puesta en marcha y acompañamiento de hospitales 2do y 3er nivel, completada	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	2.14 Plan de apertura y puesta en marcha de hospitales de 2do y 3er nivel	Modify Output	Modify Unit of Measure	JOYCEE	04/09/2021
	2.2 Equipamiento Hospital El Alto Sur completado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	04/01/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Unit of Measure	JOYCEE	04/08/2021
	2.3 Equipamiento Hospital de Occurí completado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	04/01/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Unit of Measure	JOYCEE	04/08/2021
	2.4 Equipamiento Hospital de Llalagua completado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	04/01/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Unit of Measure	JOYCEE	04/08/2021

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	2.5 Equipamiento Hospital Tercer Nivel de Potosí completado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Unit of Measure	JOYCEE	04/08/2021
	2.6 Hospitales de segundo nivel construidos, equipados y operando	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	04/15/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	2.7 Hospital de segundo nivel Puerto Suárez, equipado y operando	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	2.9 Hospital Materno, Infantil y Pediátrico de 3er nivel, diseñado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	Establecimientos de salud equipados para la atención de COVID 19	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JOYCEE	04/01/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	Establecimientos de salud fortalecidos para la atención del CONE (insumos, medicamentos, reactivos, instrumental, equipamiento y otros)	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021
	Establecimientos de salud fortalecidos para la atención del COVID-19 (insumos, medicamentos, reactivos, instrumental, equipamiento y otros)	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	JOYCEE	04/12/2021
			Modify Means of Verification	JOYCEE	04/12/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity
