

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	CO-L1243	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/18/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/29/21
<b>Last Update</b>	03/29/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/13/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Strengthen Public Sector Strategic Management Capacities	<b>Loan Number</b>	4848/OC-CO
<b>Executing Agency</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	<b>Sector/Subsector</b>	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
<b>Team Leader</b>	ARISI, DIEGO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Colombia
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE COLOMBIA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1243	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	3,104,629.54	20.70%	11,895,370.46
<b>Aggregated</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>3,104,629.54</b>	<b>20.70%</b>	<b>11,895,370.46</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

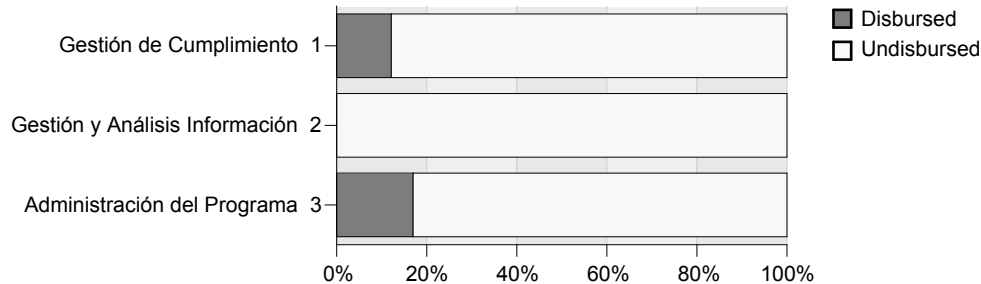

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Mejora en la efectividad gubernamental

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Índice de Efectividad Gubernamental (IEG)	Número	-0.07	2017	2023	P	0.15
						A	

#### Details

**Means of verification:** Fuente: Worldwide Governance Indicators (WGI) project - Banco Mundial Responsable de recolección y reporte de datos: Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento (CGC - recolección) - Unidad Ejecutora (UEP) DAPRE (reporte)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<b>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</b>			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Mejora en la capacidad de gestión de cumplimiento de PG

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Mejora en la calificación del gobierno en el índice de la Revisión de Capacidad de Cumplimiento (RCC - Delivery Capacity Review)	Número	2.21	2018	P	0.00	2.21	2.60	2.60	3.00	3.00
					A	0.00	2.21				
Details											
Means of verification: Fuente: RCC (BID)											
Observations: Responsable de recolección y reporte de datos: CGC (recolección) - (UEP) Dapre (reporte)											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Mejora en la gestión de PG mediante el uso de TIC

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Prioridades gestionadas mediante el uso de datos masivos, analítica de datos y herramientas de visualización	Número	1.00	2018	P	0.00	1.00	3.00	5.00	6.00	6.00
					A	0.00	1.00				
Details											
Means of verification: Fuente: Sistema de Gestión y Análisis de Información Gerencial de la Presidencia de la República											
Observations: Responsable de recolección y reporte de datos: CGC (recolección) - Unidad Ejecutora (UEP) Dapre (reporte)											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Fortalecimiento de capacidades de gestión de cumplimiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Modelo de Gestión del Cumplimiento (MGC) y plan de capacitación para aplicarlo en los ministerios y agencias responsables de implementar Prioridades Gubernamentales (PG) diseñado e implementado	Documento (MGC y plan de capac	P	0	1	457,910	500,000
			P(a)	0	1	260,895	500,000
			A	0	0	200,963.73	200,963.73
1.2	Funcionarios capacitados en el Modelo de Gestión del Cumplimiento (MGC)	Funcionarios capacitados	P	0	200	98,500	500,000
			P(a)	0	200	0	500,000
			A	0	0	0	0
1.3	Evaluaciones rápidas (Deep Dives) y/o estrategias especializadas de intervención para apoyar la gestión de la ejecución y el cumplimiento de Prioridades Gubernamentales (PG) realizadas	Documento (Evaluaciones/Estrat	P	10	18	834,000	1,500,000
			P(a)	10	18	834,000	1,500,000
			A	11	12	759,662.7	808,935.91
1.4	Coordinación e incorporación de buenas prácticas y conocimiento público privado al seguimiento y análisis de las Prioridades Gubernamentales (PG) realizada	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	93,700	500,000
			P(a)	1	5	93,700	500,000
			A	1	2	83,372.75	99,461.63
1.5	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 1 realizado – PG1	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	62,900	359,500
			P(a)	1	5	62,900	359,500
			A	1	2	53,229.79	64,268.24
1.6	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 2 realizado – PG2	Documento (análisis y seguimie	P	1	4	62,900	359,500
			P(a)	1	4	62,900	359,500
			A	1	1	46,524.23	46,524.23
1.7	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 3 realizado – PG3	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	67,200	359,500
			P(a)	1	5	67,200	359,500
			A	1	2	63,232.65	76,465.04
1.8	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 4 realizado – PG4	Documento análisis y seguimien	P	1	5	62,900	274,500
			P(a)	1	5	62,900	274,500
			A	1	2	51,720.29	58,026.78
1.9	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 5 realizado – PG5	Documento (análisis y seguimie	P	1	4	54,900	274,500
			P(a)	1	4	54,900	274,500
			A	1	1	39,899.05	39,899.05
1.10	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 6 realizado – PG6	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	62,900	274,500
			P(a)	1	5	62,900	274,500
			A	1	2	53,285.55	62,916.68
1.11	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 7 realizado – PG7	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	62,900	274,500
			P(a)	1	5	62,900	274,500
			A	1	2	59,734.04	71,328.46
1.12	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 8 realizado – PG8	Documento (análisis y seguimie	P	1	4	39,300	274,500
			P(a)	1	4	39,300	274,500
			A	1	1	31,115.54	31,115.54
1.13	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 9 REDAP (Transparencia) realizado – PG9	Documento (análisis y seguimie	P	1	4	145,400	274,500
			P(a)	1	4	145,400	274,500
			A	1	1	99,514.47	99,514.47
1.14	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 9 REDAP (Simplificación y digitalización de trámites) realizado - PG9	Documento (análisis y seguimie	P	1	5	145,400	274,500
			P(a)	1	5	145,400	274,500
			A	1	2	106,148.27	122,305.92
1.15	Diagnósticos en temas clave para la definición del plan de cumplimiento de la REDAP realizados	Documento (diagnósticos en dos	P	2	2	781,500	850,000
			P(a)	0	2	0	850,000

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.15	Diagnósticos en temas clave para la definición del plan de cumplimiento de la REDAP realizados	Documento (diagnósticos en dos	A	0	0	0	0
1.16	Plan de cumplimiento de la REDAP con base en los diagnósticos realizados diseñado e implementado	Documento (plan de cumpliment	P	0	1	14,184	1,124,000
			P(a)	0	1	14,184	1,124,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Fortalecimiento de capacidades de gestión y análisis de información

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Funcionalidades de analítica de datos definidas e integración de sistemas de información del gobierno para analizar datos que afectan la gestión de Prioridades Gubernamentales (PG) desarrolladas	Sistema (software)	P	0	1	394,000	3,000,000
			P(a)	0	1	283,500	3,000,000
			A	0	0	272,833.48	272,833.48
2.2	Herramienta de visualización de información georreferenciada diseñada e implementada	Sistema (software)	P	0	1	0	1,000,000
			P(a)	0	1	0	1,000,000
			A	0	0	0	0
2.3	Funcionarios capacitados y actividades de gestión del cambio realizadas	Funcionarios capacitados	P	0	200	98,500	500,000
			P(a)	0	200	0	500,000
			A	0	0	0	0
2.4	Servicios de infraestructura y software adquiridos y operando	Documento (inventario de servi	P	1	4	283,300	1,500,000
			P(a)	0	4	0	1,500,000
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Coordinación y asistencia técnica	P			248,500	816,000
		P(a)			248,500	816,000
		A			199,949.28	206,957.7
	Auditorías	P			37,500	150,000
		P(a)			37,500	150,000
		A			19,793.87	19,793.87
	Evaluaciones	P			0	60,000
		P(a)			0	60,000
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P			4,108,294	15,000,000
		P(a)			2,538,979	15,000,000
		A			2,140,979.69	2,281,310.73

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Coordinación e incorporación de buenas prácticas y conocimiento público privado al seguimiento y análisis de las Prioridades Gubernamentales (PG) realizada	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JULIANAPAR	03/12/2021
	Evaluaciones rápidas (Deep Dives) y/o estrategias especializadas de intervención para apoyar la gestión de la ejecución y el cumplimiento de Prioridades Gubernamentales (PG) realizadas	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JULIANAPAR	03/12/2021
	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 1 realizado – PG1	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JULIANAPAR	03/12/2021
	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 3 realizado – PG3	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JULIANAPAR	03/12/2021
	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 4 realizado – PG4	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JULIANAPAR	03/12/2021
	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 6 realizado – PG6	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JULIANAPAR	03/12/2021
	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 7 realizado – PG7	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JULIANAPAR	03/12/2021
	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 9 REDAP (Simplificación y digitalización de trámites) realizado - PG9	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JULIANAPAR	03/12/2021

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
