

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	DR-L1080	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/12/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	05/03/21
<b>Last Update</b>	04/07/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/06/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Women City	<b>Loan Number</b>	4551/OC-DR
<b>Executing Agency</b>	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA	<b>Sector/Subsector</b>	SOCIAL INVESTMENT
<b>Team Leader</b>	VILLANUEVA, MARIA TERESA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Dominican Republic
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DOMINICANA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	There was an outstanding liability from 2020 when the land in Santiago was negatively impacted (natural habitat - some trees and bushes were cleared but the perimeter line of trees and 3 mango trees were kept) without an Environmental Impact Assessment (EIA)and without informing the Bank. However, the recent site visit confirmed that the negative impact was not significant. Furthermore, the EA is committed to the completion of the EIA (including compensation measures for the land clearing) and consultations for the Santiago construction site and to update the EIA for the Santo Domingo construction site. The EA is currently working on corrective actions to complete the ESIA and to ensure that IDB policies are fully respected		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1080	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	77,973.52	0.39%	19,922,026.48
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	77,973.52	0.39%	19,922,026.48

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

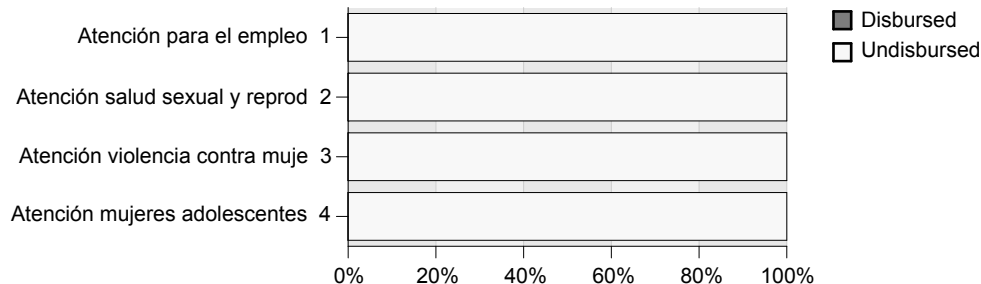

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 0:** Reducir la Tasa de mortalidad materna

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Tasa de mortalidad materna en el Gran Santo Domingo y Santiago	Tasa	85.10	2014	-	P	84.50
						A	

#### Details

**Means of verification:** Ministerio de Salud Pública

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

**General Development Objectives Nbr. 1:** Reducir la Tasa de mortalidad por cáncer de mama y cérvico uterino

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Tasa de mortalidad por cancer cérvico-uterino y de mama en el GSD y Santiago	Tasa	26.80	2015	-	P	26.40
						A	

#### Details

**Means of verification:** OMS (Número de muertes) y ONE (Proyecciones de Población)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 3:** Aumentar la tasa de ocupación laboral femenina

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
3.1	Tasa de ocupación laboral (TOL) femenina	%	39.70	2015	-	P	39.90
						A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

**General Development Objectives Nbr. 4:** Disminuir la violencia íntima de pareja

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
4.0	Mujeres (15-64 años), alguna vez casadas o unidas, que han sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses por parte de la pareja o ex pareja en el territorio objetivo.	%	17.80	2013	-	P	16.30
						A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta para Evaluación de Impacto

**Pro-Gender** Yes **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 5:** Reducir la tasa de Embarazo en Adolescentes

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
5.0	Mujeres (15-19 años) que al momento de la encuesta ya tuvieron hijos o están embarazadas por primera vez en el territorio objetivo	%	17.80	2013	-	P	16.20
						A	

#### Details

**Means of verification:** SIUBEN

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			
	No		

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Incrementar el porcentaje de mujeres de 15-64 años ocupadas en el territorio objetivo.

**Observation:** Los indicadores que se han eliminado y han sido sustituidos por otros indicadores son aquellos que la consultoría para revisar, actualizar líneas de base y fuentes de verificación en mayo 2020, indicó que no eran medibles y/o que las fuentes de verificación habían desaparecido. Las metas de los indicadores de provisión de servicios en los territorios objetivo se han estimado en función de las proyecciones realizadas por la consultoría, teniendo en cuenta el impacto de COVID19 en la recaudación de recursos públicos. Las metas de la provisión de servicios del modelo de atención integral a la mujer se han estimado con base en los datos observados en el primer año de funcionamiento de Ciudad Mujer en El Salvador. Las metas y líneas de base se revisarán y actualizarán cuando se disponga de datos observados para proyectar el impacto económico del COVID en 2020.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Tasa de ocupación femenina en el territorio objetivo	%	43.50	2019	P				22.71	22.71
					A					

#### Details

**Means of verification:** Encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, BCRD

**Observations:** Redacción del indicador: La redacción del indicador varía respecto de la inicialmente recogida en la MR para que coincida con la variable que recoge esta información en el sistema nacional que se toma como fuente de verificación. Racionalidad de los datos: La población femenina ocupada en 2019 en Santo Domingo es de 110.941 personas. La población de mujeres de 10 a 64 años en Santo Domingo Norte en 2019 es de 254 mil personas. La tasa media de variación anual de 2017-2019 para Santo Domingo Norte se ha estimado en 1,0260%. El efecto de la pandemia COVID19 en la destrucción de empleo en República Dominicana se ha estimado en un 50% siguiendo estimaciones del Ministerio de Trabajo. El aporte del modelo integral de atención a la mujer se estima en 2023 de un 0,01% en Santo Domingo Norte.

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Mujeres entre 16 y 64 años que han recibido capacitación laboral en el territorio objetivo	%	5.80	2019	P				4.20	10.60
					A					

#### Details

**Means of verification:** Numerador: INFOTEP; Denominador: Encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, BCRD

**Observations:** Redacción del indicador: la redacción del indicador varía respecto de la inicialmente recogida en la MR debido a que el concepto "económicamente activas" no está presente en el sistema estadístico nacional, por lo que se ha eliminado de la redacción del indicador. El rango de edad se ha corregido para hacerlo coincidir con los que utiliza la fuente de verificación seleccionada. Racionalidad de los datos: La meta proyectada se basa en datos estimados del efecto de la pandemia COVID en el déficit público y el recorte de servicios públicos no sanitarios, previniéndose una reducción de aproximadamente un 25% de la oferta de capacitación de INFOTEP en el territorio objetivo. El aporte del primer centro de atención integral a la mujer en Santo Domingo Norte para el primer año se estima en un 0,2%.

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Mujeres que han recibido servicios de autonomía económica a través del modelo integral de atención a la mujer y que han accedido a una entrevista laboral en un plazo máximo de 3 meses posterior a finalizar su capacitación	#	0.00	2020	P				34.00	34.00
					A					

#### Details

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Means of verification:** Registro del sistema de atención integral a la mujer

**Observations:** Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provisión d

**Pro-Gender** Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Mujeres que han completado cursos de capacitación empresarial a través del modelo integral de atención a la mujer.	#	0.00	2020	P				116.00	116.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Registro del sistema de atención integral a la mujer

**Observations:** Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

**Pro-Gender** Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.4	Mujeres que han completado cursos de formación técnico-vocacional a través del modelo integral de atención a la mujer	#	0.00	2020	P				391.00	391.00
					A					

#### Details

**Means of verification:** Registro del sistema de atención integral a la mujer

**Observations:** Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** 2. Reducir la tasa de mortalidad materna y por cáncer de mama y cérvico-uterino en mujeres de 15 años o más en el territorio objetivo

**Observation:** La eliminación de los indicadores de mortalidad materna se justifica con los informes de la consultoría de revisión de indicadores que muestra que la medición es compleja y los datos poco precisos. Los datos de citología y mamografía publicados por los sistemas nacionales se refieren únicamente a las pruebas realizadas en centros públicos de tercer nivel. Se recomienda gestionar con el Ministerio de salud para que la citología y mamografía referida por el Centro a lugares de 1 y 2 nivel, así como las hechas en el mismo centro, sean incorporadas en las estadísticas.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Promedio de controles prenatales realizados por nacimiento en el territorio objetivo	#	0.46	2019	P					0.57	0.57
					A						

#### Details

**Means of verification:** Servicio Nacional de Salud y proyecciones de población de la ONE

**Observations:** Redacción del indicador: el concepto de "embarazo no deseado" no existe como tal en el sistema nacional de estadísticas. Tampoco existe el dato de "número de controles prenatales por mujer o por nacimiento", por lo que no es posible saber cuántos controles se hace cada mujer, el sistema únicamente recoge cuántos controles prenatales se realizan en los centros públicos de tercer nivel de atención. La opción más aproximada al espíritu de medición del indicador es el promedio de controles por nacimiento. Racionalidad de los datos: El indicador muestra el número promedio de controles prenatales que se realizan por nacimiento. La meta incluye el impacto de los datos estimados de producción en el centro de atención integral a la mujer.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.1	Mujeres que se practicaron una citología vaginal o prueba detectora de cáncer vaginal en el territorio objetivo.	%	1.30	2019	P					4.63	4.63
					A						

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas Ministerio de Salud Pública y proyección de datos de población de la ONE

**Observations:** Redacción del indicador: se elimina el rango de edad previsto en la redacción original del indicador en la MR del diseño, porque el sistema nacional no permite filtrar por edad la información. Para el denominador, se ha tomado el rango de edad en el que la población femenina dominicana estar sexualmente activa. Racionalidad de los datos: Los datos se refieren a los servicios provistos por los centros públicos donde se realizan estas pruebas (centros de tercer nivel). Mujeres que se practican las pruebas como % del total de mujeres entre los 14 y los 64 años en el territorio objetivo. La contribución del modelo de atención integral se estima en función de los datos previstos de atención y se cifra para el año 2023 en un 22% de incremento directo del número de citologías realizadas en el territorio objetivo. La tendencia de los últimos datos observados en el territorio objetivo es descendiente; sin embargo, puesto que el número de citologías que se practican en centros de tercer nivel es

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.2	Mujeres que se practicaron una mamografía en el territorio objetivo.	%	5.26	2019	P					4.29	4.29
					A						

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas Ministerio de Salud Pública y proyección de datos de población de la ONE

**Observations:** Redacción del indicador: se elimina el rango de edad previsto en la redacción original del indicador en la MR del diseño, porque el sistema nacional no permite filtrar por edad la información. Para el denominador, se ha tomado el rango de edad originalmente establecido en la MR (40-64 años). Racionalidad de los datos: La estimación de la meta se realiza aplicando la tasa media de crecimiento de las mamografías en el territorio objetivo teniendo en cuenta el dato observado de 2019 y del primer trimestre de 2020. La tendencia de estos datos es decreciente. Esta tasa negativa de crecimiento se proyecta linealmente al 2023. A este dato estimado se aplica la corrección de la contribución del modelo de atención integral en el primer año de funcionamiento (2023), que se estima en un incremento del 53% del número de mamografías realizadas en el territorio objetivo. (Ver ficha del indicador en el informe de consultoría adjunto a esta matriz en el sistema - EZSHARE-1449899531-6).

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.3	Mujeres que se practicaron control prenatal a través del modelo integral de atención a la mujer en el año	#	0.00	2020	P					2,000.00	0.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Registro del sistema de atención integral a la mujer

**Observations:** Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.4	Mujeres que practicaron una citología cervical o prueba detectora de cáncer cervical a través del modelo integral de atención a la mujer en el año	#	0.00	2020	P					2,007.00	2,007.00
					A						

#### Details

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.5	Mujeres que se practicaron una mamografía a través del modelo integral de atención a la mujer en el año	#	0.00	2020	P					1,349.00	1,349.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Registro del sistema de atención integral a la mujer

**Observations:** Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** 3. Reducir la prevalencia de violencia contra la mujer (violencia íntima de pareja -física o sexual) en el territorio objetivo.

**Observation:** No existe registro de datos de violencia en el territorio objetivo. Por lo que la consultoría de la revisión de indicadores recomendó incluir únicamente indicadores de provisión del servicio a través del modelo de atención integral a la mujer



## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Mujeres víctimas de violencia que han sido atendidas a través del modelo integral de atención a la mujer en el año	#	0.00	2020	P					365.00	365.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Registro del sistema de atención integral a la mujer

**Observations:** Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

**Pro-Gender**

No

**Pro-Ethnicity**

No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.1	Mujeres atendidas en el modulo de violencia de género del modelo de atención integral a la mujer que han sido referidas desde otro módulo del modelo	%	0.00	2020	P					80.30	80.30
					A						

#### Details

**Pro-Gender**

No

**Pro-Ethnicity**

No

**Specific Development Objectives Nbr. 4:** 4. Reducir el porcentaje de mujeres adolescentes de 15-19 años embarazadas en el territorio objetivo.

**Observation:** Meta de embarazo adolescente en el territorio objetivo es superior a la línea de base porque de acuerdo al informe de la consultoría de revisión de líneas de base en los últimos años se observa una tendencia creciente relevante. La hipótesis es que los servicios de atención integral a la mujer adolescente mitigaran la tendencia creciente en el territorio objetivo

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.0	Nacimientos de mujeres adolescentes (12-19 años) respecto del total de mujeres adolescentes en el territorio objetivo	%	6.33	2019	P					11.37	11.37
					A						

#### Details

**Means of verification:** Servicio Nacional de Salud y proyección de población de la ONE

**Observations:** Redacción del indicador: se adapta la redacción para que el indicador coincida en su nomenclatura con la variable que mide el sistema nacional. El rango de edad se cambia para alinearse con la definición de "adolescente" utilizada en las estadísticas nacionales. Racionalidad de los datos: El informe de consultoría (EZSHARE-1449899531-6) resalta la tendencia creciente de la variable en los dos últimos datos observados por el Servicio Nacional de Salud en los territorios objetivo. La hipótesis es que los servicios de atención integral a la mujer adolescentes contribuyan a reducir la pendiente con un impacto esperado de reducción de embarazo adolescente en un 0,28% en 2023, de acuerdo a los datos previstos de atención a adoelscentes; sin embargo, este impacto no logra en el primer año de funcionamiento invertir la tendencia creciente de embarazo adolescente en el territorio objetivo.

**Pro-Gender**

Yes

**Pro-Ethnicity**

No

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	----------

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

		Measure		Year							
4.1	Mujeres (12 y 19 años) que son atendidas a través del modelo integral de atención a la mujer	#	0.00	2020	P					674.00	674.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Registro del sistema de atención integral a la mujer

**Observations:** Justificación para la inclusión del indicador: los datos de producción de los Centros estaban inicialmente identificados en la MR aprobada en diseño como "Productos", en tanto que se tenía la idea de que los dos últimos años de ejecución del préstamo, se estarían operando los Centros. Sin embargo, este supuesto se basaba en una subestimación de los tiempos que requieren los procesos de adquisición y construcción y del costo de la obra. Una detallada planificación realizada durante la misión de arranque de la operación mostró que se podía alcanzar a operar el centro de Santo Domingo por un plazo de 6 meses antes de la fecha de vencimiento del préstamo y que dicha operación se debería financiar con presupuesto nacional ordinario. En este nuevo contexto los datos de producción se entienden como un resultado de la inversión financiada por la operación de préstamo, no como un producto financiado por la operación. Racionalidad de los datos: La meta se establece con el dato observado de provi

**Pro-Gender**

No

**Pro-Ethnicity**

No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Atención integral para el empleo y la generación de ingresos de las mujeres.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Estudio de Detección de Necesidades de Capacitación y Demanda Laboral para Orientar la Oferta de Cursos Técnico-Profesional con Enfoque de Género en los Territorios de los CEDIMU, adaptado	Número	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A	0	0		0
1.2	Programa de pasantías implementado	Número	P	0	1	0	285,000
			P(a)	0	1	0	285,000
			A	0	0		0
1.3	Taller de capacitación empresarial diseñado	Número	P	0	1	0	20,000
			P(a)	0	1	0	20,000
			A	0	0		0
1.4	Programa de capacitación técnico - vocacional diseñado	Número	P	0	1	0	15,000
			P(a)	0	1	0	15,000
			A	0	0		0
1.5	Programa de formación a funcionarias del módulo de autonomía económica, implementado	Programa	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A	0	0		0

## Component Nbr. 2 Atención integral en SSR para las mujeres.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Centros con equipamiento médico especializado (mamógrafo, sonógrafo, colposcopio)	Número	P	0	2	0	900,000
			P(a)	0	2	0	900,000
			A	0	0		0
2.2	Programa de formación a funcionarias del Módulo de SSR, implementado	Programa	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A	0	0		0

## Component Nbr. 3 Atención integral para la prevención y atención a la VCM.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.1	Programa, manuales y materiales de capacitación en la Atención Integral y Manejo Efectivo de Casos de VCM, diseñado	Número	P	0	1	0	20,000
			P(a)	0	1	0	20,000
			A	0	0		0
3.2	Tallere de capacitación comunitaria para la prevención de violencia dirigidos a hombres y mujeres, diseñado	Número	P	0	1	0	20,000
			P(a)	0	1	0	20,000
			A	0	0		0
3.3	Programa de formación a funcionarias del Módulo de Atención Integral para la prevención y atención a la VCM, implementado	Programa	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A	0	0		0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 4 Atención integral a mujeres adolescentes.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
4.1	Diseño y evaluación de intervención piloto para cambio de comportamiento en prevención del embarazo adolescente, implementado	Número	P	0	1	0	120,000
			P(a)	0	1	0	120,000
			A	0	0		0
4.2	Programa de formación a funcionarias Módulo de Atención Integral a Mujeres Adolescentes, implementado	Número	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A	0	0		0

## Component Nbr. 5 Construcción y equipamiento de los CCM y fortalecimiento institucional.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
5.1	Centro de Santo Domingo construido y equipado	Número	P	0	1	0	11,072,000
			P(a)	0	1	0	6,230,000
			A	0	0		0
5.2	Centro de Santiago construido y equipado	Número	P	0	1	0	4,725,000
			P(a)	0	1	0	6,800,000
			A	0	0		0
5.3	Módulo de registro, monitoreo e interoperatividad del Sistema de Información, operativo	Número	P	0	1	0	385,000
			P(a)	0	1	0	2,200,000
			A	0	0		0
5.4	Sistema de gestión administrativa , operativo	Número	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A	0	0		0
5.5	Estrategia de comunicación implementada	Número	P	0	1	0	420,000
			P(a)	0	1	0	330,000
			A	0	0		0
5.6	Taller de capacitación en habilidades para la vida para beneficiarias, diseñado	Número	P	0	1	0	20,000
			P(a)	0	1	0	20,000
			A	0	0		0
5.7	Manual operativo y de funciones elaborado	Número	P	0	1	0	105,800
			P(a)	0	1	0	250,000
			A	0	0		0

## Other Cost

Gestión del Proyecto	P			70,000	406,000
	P(a)			70,000	875,767
	A			55,767	55,767
Auditorias Anuales	P			0	70,000
	P(a)			0	70,000
	A				0
Evaluaciones	P			0	100,000
	P(a)			0	40,000
	A				0
Imprevistos	P			0	1,136,200
	P(a)			0	1,624,233
	A				0

Total Cost

	Total Cost	P			70,000	20,000,000
		P(a)			70,000	20,000,000
		A			55,767	55,767

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Centro de Santiago construido y equipado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AWILDAC	03/16/2021
	Centro de Santo Domingo construido y equipado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AWILDAC	03/16/2021
	Estrategia de comunicación implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AWILDAC	03/16/2021
	Manual operativo y de funciones elaborado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AWILDAC	03/16/2021
	Módulo de registro, monitoreo e interoperatividad del Sistema de Información, operativo	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AWILDAC	03/16/2021

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
Project Monitoring & Evaluation
