

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	NI-L1143	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	05/06/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	05/11/21
<b>Last Update</b>	05/06/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/14/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Programa Multisectorial de Atención a Determinantes de la Salud en el Corredor Seco	<b>Loan Number</b>	4422/BL-NI, 4422/BL-NI-1, 4422/BL-NI-2
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE SALUD	<b>Sector/Subsector</b>	HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
<b>Team Leader</b>	PINZON ENCISO, LEONARDO ENRIQUE	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Nicaragua
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE NICARAGUA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	<p>Anteriormente la AE no había tomado acciones acordadas en resolver los impactos potenciales que afectaban a un grupo de vendedores semipermanentes (menos de 10) fuera del antiguo hospital. La resolución de este asunto es una cláusula contractual (4.8 sobre los vendedores operando en frente del antiguo hospital). Por ello el desempeño socioambiental era parcialmente insatisfactorio.</p> <p>Sin embargo, después de haber insistido de la importancia de resolver este asunto por parte del Banco durante los últimos dos años, la MINSA confirmó su compromiso y su disponibilidad de resolver dicho asunto de forma plena poniendo en práctica la metodología de encuesta y análisis de impacto y medidas de mitigación ya elaborada al final del 2020.</p> <p>Aunque de manera atrasada, el MINSA presentó al final de la misión la encuesta y el informe de análisis de impactos y medidas de mitigación y el Banco procederá a revisar de manera oportuna los documentos enviados.</p>		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
NI-L1143	133,000,000	133,000,000	5,306,210	0	138,306,210	133,000,000	41,033,292.24	30.85%	91,966,707.76
<b>Aggregated</b>	<b>133,000,000</b>	<b>133,000,000</b>	<b>5,306,210</b>	<b>0</b>	<b>138,306,210</b>	<b>133,000,000</b>	<b>41,033,292.24</b>	<b>30.85%</b>	<b>91,966,707.76</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

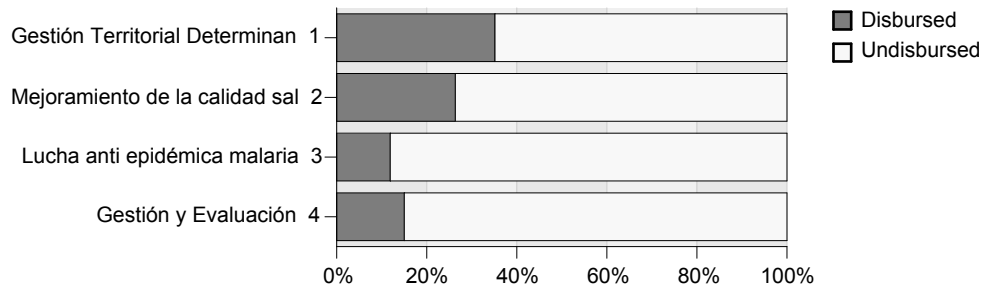

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Mortalidad Materna e infantil reducidas

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Razón de mortalidad materna Estelí	Muertes por 100.000 nacidos vivos	19.80	2015	2028	P	16.63
						A	

#### Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Razón de mortalidad materna Jinotega	Muertes por 100.000 nacidos vivos	116.80	2015	2028	P	109.79
						A	

#### Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	Razón de mortalidad materna Matriz	Muertes por 100.000 nacidos vivos	66.80	2015	2028	P	59.80
						A	

#### Details

Means of verification: Evaluación final del programa

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.3	Razón de mortalidad materna Matagalpa	Muertes por 100.000 nacidos vivos	25.00	2015	2028	P	16.00
						A	

#### Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.4	Razón de mortalidad materna Nueva Segovia	Muertes por 100.000 nacidos vivos	18.60	2015	2028	P	17.11
						A	

#### Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
--	-----------	-----------------	----------	---------------	------------------------------	--	--------

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

0.5	Mortalidad en la niñez por neumonía Estelí	Muertes por 100.000 menores de 5 años	34.90	2015	2028	P	26.18
						A	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.6	Mortalidad en la niñez por neumonía Jinotega	Muertes por 100.000 menores de 5 años	25.30	2015	2028	P	18.98
						A	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.7	Mortalidad en la niñez por neumonía Madriz	Muertes por 100.000 menores de 5 años	31.90	2015	2028	P	23.93
						A	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.8	Mortalidad en la niñez por neumonía Matagalpa	Muertes por 100.000 menores de 5 años	51.30	2015	2028	P	38.48
						A	

#### Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.9	Mortalidad en la niñez por neumonía Nueva Segovia	Muertes por 100.000 menores de 5 años	25.20	2015	2028	P	18.90
						A	

#### Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
--	-----------	-----------------	----------	---------------	------------------------------	--	--------

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

0.10	Mortalidad en la niñez por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Estelí	Muertes por 100.000 menores de 5 años	7.80	2015	2028	P	5.85
						A	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.11	Mortalidad en la niñez por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Jinotega	Muertes por 100.000 menores de 5 años	4.00	2015	2028	P	3.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.12	Mortalidad en la niñez por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Madriz	Muertes por 100.000 menores de 5 años	9.10	2015	2028	P	6.80
						A	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.13	Mortalidad en la niñez por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Matagalpa	Muertes por 100.000 menores de 5 años	5.50	2015	2028	P	4.10
						A	

#### Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.14	Mortalidad en la niñez por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Nueva Segovia	Muertes por 100.000 menores de 5 años	2.80	2015	2028	P	2.20
						A	

#### Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

No

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años Jinotega	Porcentaje	27.80	2012	2028	P	24.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<b>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</b>			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años Madriz	Porcentaje	29.50	2012	2028	P	26.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<b>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</b>			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años Nueva Segovia	Porcentaje	27.70	2012	2028	P	24.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa



## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development            bjective indicator target is            expected tobe observed by            the operation's "Fully            Justified" date            inConvergence (CO)</p>			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 2:** Mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles reducida

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
2.0	Tasa estandarizada por edad de mortalidad por cáncer cérvico uterino Estelí	Por 100.000 mujeres 15 y más años	14.30	2015	2028	P	13.80
						A	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<b>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</b>			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
2.2	Tasa estandarizada por edad de mortalidad por cáncer cérvico uterino Jinotega	Por 100.000 mujeres 15 y más años	6.80	2015	2028	P	6.30
						A	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<b>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</b>			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
2.3	Tasa estandarizada por edad de mortalidad por cáncer cérvico uterino Matriz	Por 100.000 mujeres 15 y más años	11.00	2015	2028	P	10.50
						A	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development bjective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
2.4	Tasa estandarizada por edad de mortalidad por cáncer cérvico uterino Matagalpa	Por 100.000 mujeres 15 y más años	12.60	2015	2028	P	12.10
						A	

#### Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development bjective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
2.5	Tasa estandarizada por edad de mortalidad por cáncer cérvico uterino Nueva Segovia	Por 100.000 mujeres 15 y más años	21.80	2015	2028	P	21.00
						A	

#### Details

Means of verification: Evaluación final del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development bjective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 3:** Reducción de la prevalencia de malaria.

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
3.0	Número de casos	Número de casos	10,944.00	2017	2028	P	2,000.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Gestión territorial de determinantes de la salud mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.0	Hospitalización de menores de 5 años por EDA en Madrid	Hospitalizaciones en <5a por 1,000 niños <5a	2.10	2015	P	1.74	1.74
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.2	Hospitalización de menores de 5 años por EDA en Jinotega	Hospitalizaciones en <5a por 1,000 niños <5a	1.90	2015	P	1.58	1.58
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.3	Hospitalización de menores de 5 años por EDA en Nueva Segovia	Hospitalizaciones en <5a por 1,000 niños <5a	1.90	2015	P	1.58	1.58
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.4	Hogares en los que consumen agua con calidad adecuada	%	0.00	2018	P	8.00	8.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Observations: Elaborar Línea de base en 2018 y medición final en el 2022. Las encuestas se levantarán a través del MINSA como acciones de vigilancia. Meta: mejora en 8 puntos porcentuales							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.5	Velocidad promedio (camioneta, autobús) en las vías recolectoras principales rurales intervenidas	Km/Hra	20.00	2017	P	40.00	40.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Observations: Municipios de Quilalí-Wiwilí. Vías recolectoras: conectan las comunidades rurales a la unidad de salud cabecera del municipio.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Calidad de atención de la salud mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Ingreso oportuno de las puérperas (puerperio mediato)	%	65.30	2014	P	92.73	92.73
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Observations: Corresponde al puerperio mediato. Promedio nacional							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.2	Niños menores de 24 meses atendidos con el esquema de alimentación infantil y nutricional comunitaria	%	35.00	2016	P	60.00	60.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.3	Niños de 0-23 meses con cobertura para todas las vacunas según el esquema oficial del programa nacional de inmunización	%	83.00	2015	P	95.00	95.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final del programa							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.4	Adolescentes que acceden a servicios de planificación familiar	%	22.50	2012	P	28.13	28.13
					A		

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.5	Personas que requieren cuidados especiales y acceden a servicios de rehabilitación comunitaria de acuerdo a la condición de salud	%	7.00	2014	P	14.00	14.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

**Observations:** Cuidados especiales: rehabilitación por discapacidad primaria o secundaria a enfermedad crónica o accidente.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.6	Personas mayores de 25 años en quienes se realizan acciones de captación oportuna de enfermedades crónicas: Diabetes, Hipertensión, Sobrepeso/obesidad, Cáncer cervical, Enfermedad renal crónica	%	20.00	2017	P	40.00	40.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

**Observations:** Las acciones de detección requieren tener participación comunitaria, estrategias de sensibilización, continuidad con protocolos de diagnóstico y manejo en atención primaria y en el segundo nivel a través de la estrategia de redes del MOSAFC

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.7	Pacientes con enfermedades crónicas que inician proceso de diagnóstico y tratamiento inmediato	%	50.00	2017	P	85.00	85.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

**Observations:** Las acciones de detección requieren tener participación comunitaria, estrategias de sensibilización, continuidad con protocolos de diagnóstico y manejo en atención primaria y en el

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

segundo nivel a través de la estrategia de redes del MOSAFC

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.8	Cobertura hospitalaria cirugía electiva	% entre cirugías realizadas con el total de programadas	66.38	2015	P	81.38	81.38
					A		

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

**Observations:** Se espera aumento por la mayor oferta de servicios hospitalarios. Porcentaje de cirugía programada en relación con el total de cirugías realizadas

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Numero de casos de malaria reducidos

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.0	Establecimientos de salud reportando al sistema de vigilancia según norma nacional	%	70.00	2014	P	90.00	90.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

**Observations:** Indicadores del Plan Estratégico de la Respuesta Nacional a la Malaria 2014-2018-MINSA

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.2	Casos diagnosticados que reciben tratamiento dentro de las primeras 24 horas	%	70.00	2014	P	95.00	95.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del programa

**Observations:** Indicadores del Plan Estratégico de la Respuesta Nacional a la Malaria 2014-2018-MINSA

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----



## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Gestión territorial de determinantes de la salud (Alcance: municipios de Quilalí, Wiwili, Las Sabanas)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Planes de Inversión (PI) anuales ejecutados y supervisados	Planes	P	3	3	138,000	510,000
			P(a)	2	3	209,835.2	597,100.64
			A	2	0	156,441.08	334,985.29
1.2	Unidades de salud (puestos de salud, centros de salud y casas maternas), del área priorizada habilitados con acceso mejorado a agua y saneamiento	# of beneficiaries	P	6	15	468,000	1,300,000
			P(a)	9	16	689,500	1,236,223.63
			A	0	6	900.96	178,155.64
1.3	Familias del área rural con paquete de apoyo a prácticas saludables en el hogar y entorno	Familias con paquetes	P	1,000	3,000	750,000	2,500,000
			P(a)	0	3,000	150,000	2,465,000
			A	0	0	0	0
1.4	Km de caminos mejorados con mantenimiento mayor	Kilómetros	P	10	38.64	8,497,092	15,762,210
			P(a)	0	38.64	8,058,524.56	27,027,813
			A	0	0	8,581,824.88	8,581,824.88
1.5	Km de caminos con mantenimiento básico	Kilómetros	P		38.64		1,459,200
			P(a)	0	38.64	0	1,459,200
			A	0	0	0	0
1.6	Rutas de transporte colectivo en caminos intervenidos por el programa, con medidas regulatorias de optimización del servicio	Rutas	P		2	137,500	805,000
			P(a)	0	2	0	575,000
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2. Mejoramiento de la calidad de la atención en salud (Alcance: nacional y 5 SILAIS priorizados)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Normas de alimentación infantil (Programa Comunitario de Salud y Nutrición -PROCOSAN, Lactancia Materna, Alimentación y Nutrición) actualizadas e implementadas en municipios	Municipios	P	15	50	250,000	1,070,000
			P(a)	35	80	916,616.69	1,001,837.55
			A	35	50	459,096.31	465,979.05
2.2	Municipios con la estrategia de promoción de la salud de las y los adolescentes implementada	Municipios	P	15	50	240,000	760,000
			P(a)	15	50	200,000	645,000
			A	15	15	236,222.65	236,222.65
2.3	Protocolos de detección y manejo oportuno de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) y para atención a personas con necesidades especiales (cuidados especiales), actualizados y aprobados, incluye guía comunitaria	Protocolos o guías	P	7	10	150,000	170,000
			P(a)	2	5	1,020,857.31	1,065,857.31
			A	2	4	27,842.08	27,842.08
2.4	Pacientes crónicos nuevos captados en el censo	# of beneficiaries	P	8,000	32,300	120,000	484,500
			P(a)	0	32,300	0	341,500
			A	0	0	0	0
2.5	Pacientes crónicos censados y con tres registros de atención en el último año	# of beneficiaries	P	10,000	32,000	82,500	504,750
			P(a)	0	32,000	0	324,750
			A	0	0	0	0
2.6	Pacientes con necesidades especiales nuevos captados en censo	# of beneficiaries	P	500	4,000	15,000	125,000
			P(a)	0	1,500	74,650.54	260,000
			A	0	0	38,933.67	49,283.13
2.7	Pacientes con necesidad especial, con protocolo semestral de seguimiento cumplido en el último semestre	# of beneficiaries	P	1,000	4,000	10,000	40,000
			P(a)	0	4,000	0	40,000
			A	0	0	0	0
2.8	Municipios dotados de medios de transporte para la supervisión del Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC)	Municipios	P	30	30	750,000	750,000
			P(a)	30	30	600,000	661,896.9
			A	30	30	661,896.9	661,896.9
2.9	Personal capacitado en el Marco de Gestión Ambiental y Social	Personal	P	100	250	10,000	32,500
			P(a)	100	250	5,000	18,371.65
			A	100	100	1,811.73	1,811.73
2.10	Talleres de mantenimiento de equipos y unidades móviles del SILAIS Madriz, Estelí, Matagalpa y Jinotega, remplazados y/o habilitados	Talleres	P	2	4	792,500	1,020,000
			P(a)	2	4	934,600	805,645.44
			A	2	3	408,349.02	408,349.02
2.11	Hospital Departamental de Nueva Segovia, remplazado y equipado	# of beneficiaries	P		1	22,696,500	64,615,900
			P(a)	0	1	15,681,357.24	59,844,733.08
			A	0	0	12,816,901.63	15,554,853.59
2.12	Hospital de Jalapa construido y equipado	Hospital	P		1	6,909,600	12,689,600
			P(a)	0	1	260,000	15,522,744.34
			A	0	0	0	0
2.13	Hospital de Estelí rehabilitado y equipado	Hospital	P	1	1	607,900	1,500,000
			P(a)	0	1	258,484.28	496,217.81
			A	0	0	0	7,515.72
2.14	Hospital Primario de Wiwilí (JI) y Waslala (MT) remplazados y equipados	Hospital	P	1	2	6,382,000	9,035,000
			P(a)	0	2	917,480.04	9,773,808.92
			A	0	0	65,480.04	65,480.04
2.15	Hospital Primario de San Juan de Limay rehabilitado y equipado	Hospital	P	1	1	893,000	900,000
			P(a)	0	1	430,530.8	695,763.7

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.15	Hospital Primario de San Juan de Limay rehabilitado y equipado	Hospital	A	0	0	0	6,069.2
2.16	Unidades de Salud de la Trinidad (ES) mejorados	Unidades de Salud	P		1	841,000	1,500,000
			P(a)	0	2	8,700	1,531,391.69
			A	0	0	8,257.36	8,257.36
2.17	Salas de fisioterapia en Unidad de Salud cabecera construidas y equipadas	Salas	P	31	37	244,800	1,341,000
			P(a)	0	10	882,000	1,041,959.38
			A	0	0	265,497.4	265,497.4
2.18	Salas de fisioterapia en Unidades de Salud cabecera equipadas	Salas	P		0		0
			P(a)	0	12	324,000	324,000
			A	0	0	0	0
2.19	Costeo de las atenciones de servicios de salud	Estudio	P		0		0
			P(a)	1	1	30,000	30,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 3 Componente 3. Lucha antipidémica y erradicación de la malaria (Alcance: Bilwi, Las Minas, RACCS, Chinandega y 5 SILAIS Priorizados)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.1	Centro Nacional de Diagnóstico y red de Laboratorios de Referencia con equipamiento modernizado	Centros	P	1	1	530,000	1,030,000
			P(a)	0	10	207,002.2	1,030,000
			A	0	0	83,848	83,848
3.2	Laboratorio epidemiológico regional en Estelí construido y equipado	Laboratorio	P	1	1	634,000	650,000
			P(a)	0	1	445,885.78	3,702,377.26
			A	0	0	0	7,514.22
3.3	Bodega Regional de insumo construida y equipada	Bodega	P		1	1,010,000	2,596,500
			P(a)	0	1	254,985.77	2,703,465.63
			A	0	0	0	7,514.23
3.4	Municipios con plan de gestión de riesgo asociado al agua implementado	Municipios	P	36	36	450,000	1,800,000
			P(a)	15	36	153,480	384,645.4
			A	15	0	65,143.38	66,484.99
3.5	Municipios con gestión de focos implementada	Municipios	P	15	35	545,786	1,273,500
			P(a)	37	69	3,185,759.01	4,552,935
			A	37	62	1,390,737.49	2,097,470.34
3.6	Municipios equipados y con plan anual de control de vectores implementados	Municipios	P	28	28	600,000	2,400,000
			P(a)	28	28	324,500	494,166.67
			A	28	28	303,533.67	359,609.45

## Other Cost

Gestión del Programa	P			500,000	2,146,550
	P(a)			603,424.56	1,568,407.34
	A			380,158.31	585,816.21
Evaluación	P			300,000	450,000
	P(a)			0	450,000
	A			0	0
Auditoría	P			28,350	220,000
	P(a)			35,850	220,000
	A			12,640	12,640
Costos Financieros	P			1,000,000	6,450,000

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Costos Financieros	P(a)			400,000	6,450,000
		A			285,999.5	449,623.94

## Total Cost

	Total Cost	P			56,673,528	138,306,210
		P(a)			37,263,023.98	149,341,812.34
		A			26,251,516.06	30,524,545.06

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Bodega Regional de insumo construida y equipada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/24/2021
	Centro Nacional de Diagnóstico y red de Laboratorios de Referencia con equipamiento modernizado	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ALMAS	03/25/2021
	Familias del área rural con paquete de apoyo a prácticas saludables en el hogar y entorno	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/24/2021
	Hospital Departamental de Nueva Segovia, remplazado y equipado	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	ALMAS	03/25/2021
	Hospital Primario de San Juan de Limay rehabilitado y equipado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/24/2021
	Hospital Primario de Wiwilí (JI) y Waslala (MT) remplazados y equipados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/24/2021
	Hospital de Estelí rehabilitado y equipado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/24/2021
	Hospital de Jalapa construido y equipado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/24/2021
	Km de caminos mejorados con mantenimiento mayor	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/25/2021
	Laboratorio epidemiológico regional en Estelí construido y equipado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/24/2021
	Municipios con gestión de focos implementada	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ALMAS	03/25/2021
	Municipios con plan de gestión de riesgo asociado al agua implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/24/2021
	Municipios dotados de medios de transporte para la supervisión del Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/24/2021
	Municipios equipados y con plan anual de control de vectores implementados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/24/2021
	Normas de alimentación infantil (Programa Comunitario de Salud y Nutrición -PROCOSAN, Lactancia Materna, Alimentación y Nutrición) actualizadas e implementadas en municipios	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/24/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ALMAS	03/25/2021
	Pacientes con necesidad especial, con protocolo semestral de seguimiento cumplido en el último semestre	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	ALMAS	05/04/2021
	Pacientes con necesidades especiales nuevos captados en censo	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	ALMAS	05/04/2021
	Pacientes crónicos censados y con tres registros de atención en el último año	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	ALMAS	05/04/2021
	Pacientes crónicos nuevos captados en el censo	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	ALMAS	05/04/2021
	Personal capacitado en el Marco de Gestión Ambiental y Social	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/25/2021
	Planes de Inversión (PI) anuales ejecutados y supervisados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/24/2021

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Rutas de transporte colectivo en caminos intervenidos por el programa, con medidas regulatorias de optimización del servicio	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/29/2021
	Salas de fisioterapia en Unidad de Salud cabecera construidas y equipadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/24/2021
	Talleres de mantenimiento de equipos y unidades móviles del SILAIS Madriz, Estelí, Matagalpa y Jinotega, remplazados y/o habilitados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/24/2021
	Unidades de Salud de la Trinidad (ES) mejorados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/24/2021
	Unidades de salud (puestos de salud, centros de salud y casas maternas), del área priorizada habilitados con acceso mejorado a agua y saneamiento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALMAS	03/24/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ALMAS	03/25/2021

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Project Monitoring & Evaluation
