

PMR Public Report

Operation Number	PE-L1130	Chief of Operations Validation Date	04/06/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/08/21
Last Update	03/31/21	Country Representative Validation Date	04/12/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Projects for Tax and Customs management Consolidation	Loan Number	3214/OC-PE
Executing Agency	SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	PEREZ RINCON, BELINDA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1130	15,000,000	15,000,000	58,030,000	0	73,030,000	15,000,000	12,836,703	85.58%	2,163,297
Aggregated	15,000,000	15,000,000	58,030,000	0	73,030,000	15,000,000	12,836,703	85.58%	2,163,297

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

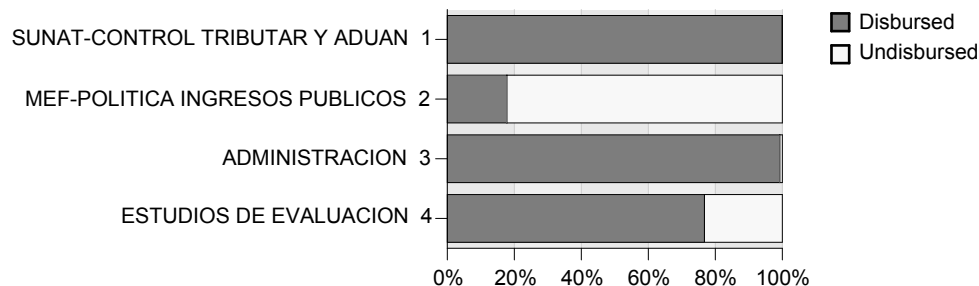

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Incrementar los ingresos estructurales del gobierno general, medido como porcentaje del PIB

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Ingresos estructurales del gobierno general / PIB	%	21.20	2013	-	P	21.90
						A	

Details

Means of verification: Marco macroeconómico multianual (MMM) - MEF

Observations: La meta final se actualizará en función del MMM del año 2017

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Mejorar la efectividad para controlar el cumplimiento del universo de administrados a nivel nacional y lograr una adecuada gestión de política de ingresos públicos, con énfasis en la recaudación tributaria municipal

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
0.0	Porcentaje de contribuyentes sobre los cuales se realiza el control de la deuda tributaria	%	30.00	2012	P		100.00
					A		

Details

Means of verification: Reportes de Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario (INCT)

Observations: El indicador se refiere a contribuyentes de actividad empresarial

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
0.1	Ratio de acciones de fiscalización no conformes (auditorías más verificaciones)	%	69.50	2012	P		74.00
					A		

Details

Means of verification: INCT

Observations: Se espera mejorar este indicador a través de gestión integral de riesgos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
0.2	Crecimiento porcentual anual del número de intervenciones con incidencia como resultado del control aduanero	%	3.90	2013	P		8.00
					A		

Details

Means of verification: Estadísticas de la Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización Aduanera

Observations: Se espera mejorar este indicador a través del equipamiento aduanero

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
0.3	Reducción de las horas de caída al año del sistema virtual PDT	horas	12.21	2012	P		2.00
					A		

Details

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Reportes de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información

Observations: Se espera mejorar este indicador a través de la mejora de la arquitectura informática de SUNAT

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
0.4	Crecimiento porcentual anual de la recaudación del impuesto predial en ciudades principales tipo A y B	%	11.50	2012	P		12.50
					A		

Details

Means of verification: Reportes de Contaduría General de la República - MEF

Observations: Se espera mejorar este indicador a través de la implementación del nuevo SRTM

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
0.5	Porcentaje de expedientes sin respuesta luego de 30 días de recibidos	%	74.00	2014	P		10.00
					A		

Details

Means of verification: Reportes de gestión de la DGPIP

Observations: Se espera alcanzar las metas de este indicador con las actividades de mejora de la gestión de la DGPIP

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Mejoramiento de la efectividad del control tributario y aduanero del universo de administrados a nivel nacional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Sistema de cuenta única diseñado e implantado	Sistema	P		1		13,996,798
			P(a)	0.2	1	5,022,393	19,025,970
			A	0.2	0.6	5,778,088	9,147,856
1.2	Sistema de gestión inductiva (CRM) diseñado e implantado	Sistema	P		1		6,720,733
			P(a)	0.02	1	199,458	1,995,476
			A	0.02	1	189,290	1,995,476
1.3	Sistema de gestión de riesgo diseñado e implantado	Sistema	P		1		6,243,586
			P(a)	0	1	403,656	7,071,604
			A	0	1	374,774	6,680,536
1.4	Modelo de gestión coordinada de fronteras (GCF) diseñado	Modelo	P		1		2,063,500
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
1.5	Equipamiento nuevo no intrusivo adquirido y en funcionamiento	Equipamiento no intrusivo	P		62		12,455,558
			P(a)	0	59	5,020,671	28,119,156
			A	0	47	7,564,725	12,528,268
1.6	Embarcaciones nuevas para operaciones acuáticas adquirido y en funcionamiento	Embarcaciones para operaciones	P		5		7,419,826
			P(a)	0	0	0	72,231
			A	0	0	0	72,231
1.7	Plataformas de servidores para base de datos y soluciones continuas de alta disponibilidad adquiridos	Plataformas	P		2		10,800,000
			P(a)	0.05	2	956,290	13,072,643
			A	0.05	2	1,016,925	12,814,155
1.8	Centro de monitoreo predictivo implementado	Centro	P		1		100,000
			P(a)	0.2	1	2,388,772	9,931,027
			A	0.1	0.9	1,311,882	8,248,230

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Mejoramiento de la gestión de la política de ingresos públicos con énfasis en la recaudación tributaria municipal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal diseñado e implementado en 50 GGLL	# of agencies	P		50		6,866,560
			P(a)	0	20	363,989	7,094,156.45
			A	0	0	389,431	729,850.45
2.2	Aplicativo web implementado en ciudades principales tipo A y B	# of agencies	P		249		1,268,570
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
2.3	Propuesta organizacional de la DGPIP implementada	Propuesta organizacional	P		1		134,000
			P(a)	0	0	0	107,441.41
			A	0	0	0	107,441.41
2.4	Sistema de gestión documentaria de la DGPIP implementado	Sistema de gestión documentari	P		1		453,650
			P(a)	0	1	86,176	491,586.41
			A	0	0	85,825	149,461.41
2.5	Funcionarios de la DGPIP capacitados en temas de tributación sectorial	Funcionarios capacitados	P		280		396,100
			P(a)	20	80	52,387	432,250.62
			A	0	0	44,739	48,921.62
2.6	Equipos informáticos adquiridos	Equipos informáticos	P		35		62,500
			P(a)	5	131	155,203	358,978
			A	56	56	107,947	107,947
2.7	Aplicativo tributario adquirido	Aplicativo tributario	P		1		251,874
			P(a)	0	3	54,094	255,829
			A	1	1	42,731	42,731
2.8	Bases de datos adquiridas	Bases de datos	P		6		156,915
			P(a)	0	4	0	179,253
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Seguimiento y administración de los Proyectos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Unidad Ejecutora SUNAT conformada	Informe	P		1		85,720
			P(a)	0	1	0	198,088
			A	0	1	0	198,088
3.2	Unidad Ejecutora MEF conformada	Informe	P		1		78,020
			P(a)	0	1	0	85,587
			A	0	1	0	85,587
3.3	Evaluación intermedia y final SUNAT realizadas	Informe	P		2		483,000
			P(a)	1	0.5	25,746	51,370.21
			A	0.5	0.5	20,370.21	20,370.21
3.4	Evaluación intermedia y final MEF realizadas	Informe	P		0		0
			P(a)	1	0.5	12,000	110,136
			A	0.5	0.5	11,858	11,858
3.5	Línea de Base SUNAT	Informe	P		0		0
			P(a)	0	1	0	10,679
			A	0	1	0	10,679
3.6	Línea de Base MEF	Informe	P		0		0
			P(a)	0	1	34,118	162,277
			A	0	1	0	154,221

Other Cost

	Administración del Programa SUNAT	P				1,264,000
		P(a)			267,800	1,621,868.67
		A			200,985.67	1,579,510.67
	Administración del Programa MEF	P				1,590,490
		P(a)			168,306	1,666,999.39
		A			135,172	620,851.39
	Auditoria SUNAT	P				141,600
		P(a)			31,891	154,700.31
		A			12,265.31	97,848.31

Total Cost

	Total Cost	P				73,033,000
		P(a)			15,242,950	92,269,307.47
		A			17,287,008.19	55,452,118.47

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Aplicativo tributario adquirido	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/26/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GRACEFL	03/26/2021
	Aplicativo web implementado en ciudades principales tipo A y B	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GRACEFL	03/29/2021
	Bases de datos adquiridas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/26/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GRACEFL	03/26/2021
	Centro de monitoreo predictivo implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/17/2021
	Equipamiento nuevo no intrusivo adquirido y en funcionamiento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/17/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GRACEFL	03/17/2021
	Equipos informáticos adquiridos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/26/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GRACEFL	03/26/2021
	Evaluación intermedia y final MEF realizadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/26/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GRACEFL	03/26/2021
	Evaluación intermedia y final SUNAT realizadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/17/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GRACEFL	03/17/2021
	Funcionarios de la DGPIP capacitados en temas de tributación sectorial	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/26/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GRACEFL	03/26/2021
	Línea de Base MEF	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/26/2021
			Modify Financial Historical Actual	GRACEFL	03/26/2021
	Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal diseñado e implementado en 50 GLL	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/26/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GRACEFL	03/26/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Unflag contribution to CRF indicator	GRACEFL	03/29/2021
	Plataformas de servidores para base de datos y soluciones continuas de alta disponibilidad adquiridos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/17/2021

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Propuesta organizacional de la DGPIP implementada	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GRACEFL	03/26/2021
	Sistema de cuenta única diseñado e implantado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/17/2021
	Sistema de gestión de riesgo diseñado e implantado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/17/2021
	Sistema de gestión documentaria de la DGPIP implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/26/2021
	Sistema de gestión inductiva (CRM) diseñado e implantado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/17/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
