

PMR Public Report

Operation Number	UR-L1110	Chief of Operations Validation Date	04/16/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/16/21
Last Update	04/14/21	Country Representative Validation Date	04/23/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support the National Integrated Care System	Loan Number	3706/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	SANCHEZ, MARIO ALBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1110	50,000,000	50,000,000	15,000,000	0	65,000,000	50,000,000	32,969,753.85	65.94%	17,030,246.15
Aggregated	50,000,000	50,000,000	15,000,000	0	65,000,000	50,000,000	32,969,753.85	65.94%	17,030,246.15

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

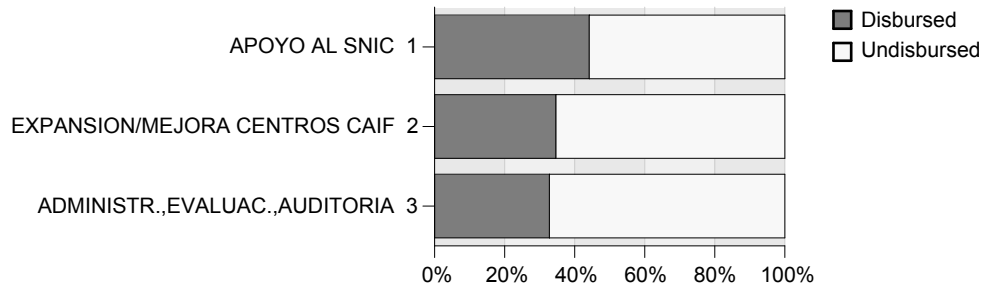

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Contribuir a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de las personas en situación de dependencia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Niños en nuevos centros CAIF con puntaje ASQ-3 por debajo de un umbral crítico.	% niños en nuevos centros CAIF	14.00	2016	2022	P	10.00
						A	

Details

Means of verification: Informes SNIC/DINEM-INAU

Observations: ASQ-3 es una herramienta de detección precoz de rezagos en el desarrollo infantil.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Centros CAIF nuevos con puntaje ITERS-R entre 5 y 7.	% centros CAIF	0.00	2016	2022	P	80.00
						A	

Details

Means of verification: Informes SNIC/DINEM-INAU

Observations: ITERS-R es un instrumento de medición de calidad en centros para niños.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	Brecha en la carga global de trabajo entre mujeres y hombres de Q1.	hs semanales de trabajo	9.00	2016	2022	P	7.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

0.2	Brecha en la carga global de trabajo entre mujeres y hombres de Q1.	hs semanales de trabajo	9.00	2016	2022	A	
Details							
Means of verification: EUT 2013 y 2019							
Observations: Línea de base a partir de EUT 2013 y seguimiento EUT 2019.							
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity		No			
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)	No						

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.3	Carga de trabajo no remunerado de cuidado infantil.	hs semanales de cuidado infantil	21.20	2016	2021	P	20.00
						A	
Details							
Means of verification: EUT 2013 y 2019							
Observations: Línea de base a partir de EUT 2013 y seguimiento EUT 2019. En el caso de este indicador, hay una línea de base y una meta para mujeres (21.2) y otra para varones (14.8)							
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity		No			
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)	No						

	Mujeres					P	20.00
						A	
	Varones					P	16.00
						A	

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Contribuir a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de las personas en situación de dependencia en el marco del SNIC.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Porcentaje de cuidadores registrados en el RNC.	%	0.00	2016	P	25.00	50.00	50.00
					A	25.00		

Details

Means of verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.1	Porcentaje de instituciones prestadoras de servicios registradas en el RNC.	%	0.00	2016	P	75.00	100.00	100.00
					A	0.00		

Details

Means of verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.2	Porcentaje de usuarios registrados en el RNC.	%	0.00	2016	P	50.00	100.00	100.00
					A	0.00		

Details

Means of verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.3	Porcentaje de instituciones formadoras de RRHH registradas en el RNC.	%	0.00	2016	P	50.00	100.00	100.00
					A	100.00		

Details

Means of verification: Sistemas de información del SNC

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.4	Número de postulaciones para prestaciones.	#	0.00	2016	P	3,500.00	5,000.00
					A	10,000.00	

Details

Means of verification: Sistemas de información del SNC

Observations: Las prestaciones a considerar son: Asistente Personal, Tele asistencia, Centro de día, y Casa comunitaria Definir postulación como: beneficiario elegible (cumple requisitos) y está ingresado en el RNC.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.5	Porcentaje de personas con conocimiento de derechos y prestaciones en el marco del SNIC.	%	0.00	2016	P	25.00	50.00
					A	46.00	

Details

Means of verification: Informes SNIC

Observations: Informe producido a partir de encuesta a ser realizada por la SNC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.6	Porcentaje de trabajadores de CAIF nuevos, formados según nueva currícula.	%	0.00	2016	P	50.00	80.00
					A	0.00	

Details

Means of verification: Informes semestrales de avance, e informe específico sobre calidad de centros.

Observations: Se mide sobre los centros CAIF nuevos operando en el momento de medición

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.7	Porcentaje de usuarios satisfechos por al pertinencia de las innovaciones del PI.	%	60.00	2016	P	80.00	90.00
					A	0.00	

Details

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Informes semestrales de avances del programa.

Observations: Medición que forma parte de la agenda de conocimiento del SNIC

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.8	Porcentaje de niños de los CAIF pertenecientes a hogares elegibles para AFAM Plan de Equidad (condición de vulnerabilidad socioeconómica)	%	64.00	2016	P	68.00	72.00	72.00
					A	0.00		

Details

Means of verification: Registros administrativos y visita de inspección in loco.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.9	Tasa de matriculación de los nuevos centros CAIF (niños/cupos)	tasa niños/cupos	0.00	2016	P	85.00	95.00	95.00
					A	0.00		

Details

Means of verification: Registros administrativos INAU

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la instalación y funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Diseño del Portal de Cuidados aprobado por SNIC.	Portal	P	0	1	0	561,645
			P(a)	0	1	0	92,839.08
			A	0	1	0	92,839.08
1.2	Nuevas funcionalidades del Portal de Cuidados habilitadas con carga de datos de casos reales.	# nuevas funcionalidades	P	5	5	864,301	4,036,083
			P(a)	4	5	1,585,325	6,525,702.23
			A	4	4	1,564,965	4,725,927.23
1.3	Diseño de Registro Nacional de Cuidados aprobado por SNIC.	Documento - diseño RNC	P	0	1	39,528	150,898
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
1.4	Módulos del Registro Nacional de Cuidados en funcionamiento.	# módulos RNC	P	5	5	151,112	878,722
			P(a)	1	4	1,177,875.62	3,303,926.13
			A	2	2	1,109,203.51	2,847,082.13
1.5	Personas valoradas en relación a su situación de dependencia.	# personas valoradas	P	2,000	10,500	369,938	1,544,144
			P(a)	1,615	16,127	175,854.28	546,104.19
			A	1,615	16,127	171,801.8	546,104.19
1.6	Campañas de comunicación implementadas.	# campañas de comunicación	P	1	4	30,500	3,318,400
			P(a)	1	5	22,025.12	703,915.47
			A	1	5	36,105.64	703,915.47
1.7	Encuestas de opinión realizadas.	# encuestas de opinión	P	1	5	0	85,400
			P(a)	0	3	0	78,023.1
			A	0	3	0	78,023.1
1.8	Iniciativas territoriales de comunicación financiadas e implementadas.	# iniciativas territoriales de	P	30	120	0	1,046,875
			P(a)	0	74	0	828,328.78
			A	0	74	0	828,328.78
1.9	Líneas de trabajo que cuentan con productos comunicacionales.	# líneas de trabajo	P	3	15	118,035	1,007,573
			P(a)	3	13	115,195.18	1,090,466.72
			A	2	12	112,055.13	1,065,995.72
1.10	Estudios de la agenda de conocimiento publicados en el sitio web.	# estudios	P	2	12	97,042	1,197,186
			P(a)	2	9	10,848.45	179,791.58
			A	2	9	16,586.28	179,791.58
1.11	Informes de avances y resultados de la agenda de conocimiento del SNIC elaborados y aprobados por SNIC y DINEM/MIDES.	# informes de avance y resulta	P	1	3	71,370	339,484
			P(a)	1	4	50,534.37	300,632.98
			A	1	4	45,336.19	300,632.98
1.12	Prestaciones reguladas.	# prestaciones reguladas	P	4	28	123,983	880,418
			P(a)	0	23	56,641.2	482,086.87
			A	1	22	47,518	458,951.87
1.13	Diseño de un censo de centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisado por MEC o ANEP)	# instrumentos de medición de	P	0	3	0	36,600
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.14	Centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisados por MEC o ANEP) censados	Documento - diseño de instrume	P	0	1	0	133,379
			P(a)	0	0	0	70,627
			A	0	0	0	70,627
1.15	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de formación del SNIC.	currícula de cursos	P	0	1	75,386	608,653
			P(a)	0	1	103,027.47	265,725.32

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.15	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de formación del SNIC.	currícula de cursos	A	0	1	106,155.2	265,725.32
1.16	Modelo de supervisión de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por MEC.	Documento - modelo de supervis	P	0	1	0	442,491
			P(a)	0	1	72,030.84	206,313.11
			A	0	1	74,123.34	206,313.11
1.17	Centros de educación y cuidado infantil supervisados por MEC con el nuevo modelo.	# de centros de educación y cu	P	980	980	51,546	851,717
			P(a)	1,203	1,203	75,045.74	523,514.27
			A	1,203	1,203	68,612.25	498,358.27
1.18	Diseño de instrumento de medición de la calidad de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por INAU y MEC.	Documento - diseño instrumento	P	0	1	0	61,000
			P(a)	0	2	0	51,350.76
			A	0	1	0	41,590.76
1.19	Centros de educación y cuidado infantil evaluados con el instrumento de medición de calidad.	# centros de educación y cuida	P	640	980	0	91,500
			P(a)	230	980	0	91,500
			A	230	0	0	0
1.20	Pilotos de innovaciones en primera infancia implementados.	# pilotos de innovaciones	P	5	5	152,959	1,039,311
			P(a)	6	5	200,211.28	716,069.95
			A	5	5	207,210	681,366.95

Component Nbr. 2 Expansión y mejora de la calidad de Centros de Atención a la Infancia y Familia (CAIF)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Centros CAIF nuevos que cuentan con dotación de personal (técnico y de gestión) adecuado.	# centros CAIF	P	112	142	34,047	122,001
			P(a)	77	119	0	0
			A	77	77	0	0
2.2	Centros CAIF construidos.	# centros CAIF	P	35	50	10,649,793	37,939,310
			P(a)	19	25	5,882,457.01	19,107,097.43
			A	24	0	3,659,482	17,467,892.43
2.3	Centros CAIF que implementan el Programa de Parentalidades Comprometidas	# centros CAIF	P	70	70	48,800	592,787
			P(a)	70	83	118,792.02	688,262.77
			A	83	0	127,577	578,567.77
2.4	Centros de educación y cuidado infantil de INAU (CAIF, Nuestros Niños y CAPI) evaluados con el instrumento de medición de calidad de los centros validado.	# centros de educación y cuida	P	540	600	160,401	666,270
			P(a)	540	10	89,615.53	342,312.53
			A	10	0	96,474	294,773.53

Component Nbr. 3 Ejecución, evaluación y monitoreo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	Mediciones para la evaluación de impacto de CAIF realizadas.	# mediciones	P	1	3	0	915,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0

Other Cost

	Administración y ejecución del proyecto	P			1,436,330	6,393,153
		P(a)			255,601.35	2,502,173.76
		A			255,928	2,251,794.76
	Evaluación y Auditoría	P			10,000	60,000
		P(a)			8,843	44,330.7
		A			8,843	28,330.7

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Fondos sin asignar	P				0
		P(a)				26,258,905.27
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			14,485,071	65,000,000
		P(a)			9,999,923.46	65,000,000
		A			7,707,976.34	34,212,932.73

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Campañas de comunicación implementadas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
	Centros CAIF construidos.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a)	MARIOSAN	03/29/2021
	Centros CAIF nuevos que cuentan con dotación de personal (técnico y de gestión) adecuado.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a)	VALENTINAT	03/29/2021
	Centros CAIF que implementan el Programa de Parentalidades Comprometidas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a)	VALENTINAT	03/29/2021
	Centros de educación y cuidado infantil de INAU (CAIF, Nuestros Niños y CAPI) evaluados con el instrumento de medición de calidad de los centros validado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a)	VALENTINAT	03/29/2021
	Centros de educación y cuidado infantil evaluados con el instrumento de medición de calidad.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
	Centros de educación y cuidado infantil supervisados por MEC con el nuevo modelo.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
	Centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisados por MEC o ANEP) censados	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VALENTINAT	03/26/2021
	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de formación del SNIC.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIOSAN	03/29/2021
	Diseño de instrumento de medición de la calidad de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por INAU y MEC.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIOSAN	03/29/2021
	Diseño de un censo de centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisado por MEC o ANEP)	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VALENTINAT	03/26/2021
	Encuestas de opinión realizadas.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VALENTINAT	03/26/2021
	Estudios de la agenda de conocimiento publicados en el sitio web.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIOSAN	03/29/2021
	Informes de avances y resultados de la agenda de conocimiento del SNIC elaborados y aprobados por SNIC y DINEM/MIDES.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIOSAN	03/29/2021
	Líneas de trabajo que cuentan con productos comunicacionales.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIOSAN	03/29/2021
	Mediciones para la evaluación de impacto de CAIF realizadas.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIOSAN	03/29/2021

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Modelo de supervisión de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por MEC.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
	Módulos del Registro Nacional de Cuidados en funcionamiento.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
	Nuevas funcionalidades del Portal de Cuidados habilitadas con carga de datos de casos reales.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
	Personas valoradas en relación a su situación de dependencia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VALENTINAT	03/26/2021
	Pilotos de innovaciones en primera infancia implementados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
	Prestaciones reguladas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VALENTINAT	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIOSAN	03/29/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Design
