

PMR Public Report

Operation Number	PR-L1097	Chief of Operations Validation Date	04/09/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/09/21
Last Update	03/30/21	Country Representative Validation Date	04/15/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Project to Support Extended School Days and Improved Transportation Conditions for Students Attending Rural Official Schools	Loan Number	3660/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	Sector/Subsector	EDUCATION-PRIMARY EDUCATION
Team Leader	PEREZ ALFARO, MARCELO A.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1097	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	1,229,444	6.15%	18,770,556
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	1,229,444	6.15%	18,770,556

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

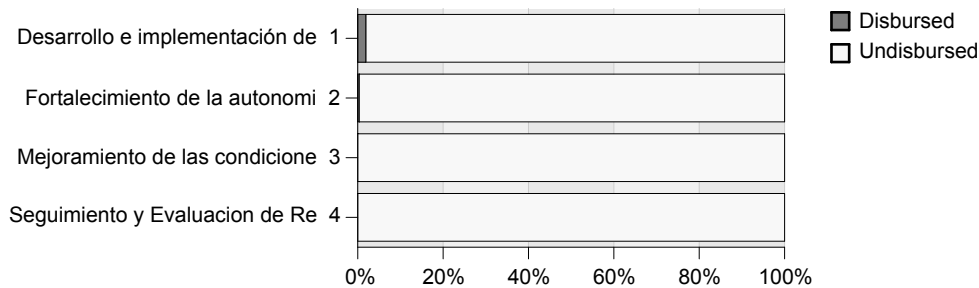

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Mejora en aprendizajes en 2º ciclo en Lenguaje

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Diferencia en el puntaje de la prueba de lenguaje entre los alumnos de 2º ciclo que estén expuestos a JEE y los que no (en desviación estándar)	Desviación estándar	0.00	2017	-	P	0.00
						A	0.00

Details

Means of verification: Pruebas de rendimiento académico administradas a los estudiantes.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

General Development Objectives Nbr. 1: Mejora en aprendizajes en 2º Ciclo en Matemáticas

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Diferencia en el puntaje de la prueba de matemáticas entre los alumnos de 2º ciclo que están expuestos a JEE y los que no (en desviaciones estándar)	Desviación estándar	0.00	2017	-	P	0.00
						A	0.00

Details

Means of verification: Pruebas de rendimiento académico administradas a los estudiantes.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Escuelas con Jornada Escolar Extendida Implementadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	# Escuelas que implementan jornada escolar extendida	Escuela	71.00	2016	P	0.00	0.00			664.00			664.00
					A	0.00	0.00					0.00	
Details													
Means of verification: Informes de Rendición de Cuentas de las escuelas aprobados por el MEC													
Observations: Implementadas implica que la escuela reporta en los informes de rendición de cuentas que funciona en horario extendido.													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No							

Specific Development Objectives Nbr. 1: Escuelas con proyectos educativos gestionados de manera autónoma

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	# Escuelas que gestionan de manera autónoma sus proyectos educativos	Escuela	0.00	2016	P	0.00	0.00			664.00			664.00
					A	0.00	0.00					0.00	
Details													
Means of verification: Proyectos Educativos Institucionales aprobados por el MEC													
Observations: Una escuela que gestiona de manera autónoma tiene al menos un proyecto educativo institucional aprobado.													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

Specific Development Objectives Nbr. 2: Escuelas con pilotos de transporte aplicados para sus estudiantes

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	# Escuelas que aplican pilotos de transporte de sus estudiantes	Escuela	0.00	2016	P	0.00	0.00			80.00			80.00
					A	0.00	0.00					0.00	
Details													
Means of verification: Informes de Monitoreo del MEC													
Observations: La aplicación de pilotos implica que al menos un estudiante se transporta a la escuela utilizando bicicleta o recursos derivados de subsidios o transferencias del proyecto.													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

Specific Development Objectives Nbr. 3: Estudiantes beneficiados por la extensión de jornada escolar

Observation:

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

		Measure		Year									
3.0	# Estudiantes de primaria beneficiados por la extensión de jornada escolar	# of students	16,000.00	2016	P	0.00	0.00			156,000.00			156,000.00
					A	0.00	0.00						0.00

Details

Means of verification: Informes estadísticos del MEC

Observations: Indicador Sectorial (CSI). Los estudiantes beneficiados son los inscritos en los Ciclos 1° y 2° de la EEB en las escuelas que implementan JEE.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No										
	Female				P	0.00	0.00			78,000.00			78,000.00
					A	0.00	0.00						0.00
	Male				P	0.00	0.00			78,000.00			78,000.00
					A	0.00	0.00						0.00

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Desarrollo e implementación de innovaciones pedagógicas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Producto 3: Diseño y adecuaciones de Escuelas del Siglo XXI	Escuelas adecuadas	P		0		0
			P(a)		200	0	2,096,000
			A	0	0	0	0
1.2	Producto 1: Materiales para innovaciones pedagógicas elaborados y en condiciones de ser utilizados	Cantidad de materiales educati	P		0		0
			P(a)		580,000		3,580,592
			A	0	0	0	0
1.3	Producto 2: Implementación de innovaciones pedagógicas	Innovaciones pedagógicas imple	P		0		0
			P(a)		3		7,767,483.02
			A	0	0	32,540.5	285,660.73

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la autonomía de las instituciones educativas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Producto 4: Talleres de intercambio de experiencias docentes entre escuelas realizados	Taller	P	22	48	33,899	118,646
			P(a)	0	24	0	280,548
			A	0	0	0	0
2.2	Producto 5: Talleres en escuelas de apoyo al vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia realizados	Taller	P	30	664	67,117	234,909
			P(a)	0	600	0	437,574.08
			A	0	0	0	0
2.3	Producto 7: Talleres de formación para Consejos Escolares realizados	Taller	P	300	664	27,900	101,174
			P(a)	0	600	0	10,291.39
			A	0	0	0	0
2.4	Producto 8: Sistema software para el monitoreo de la gestión escolar diseñado e instalado	Software	P		0		0
			P(a)		1		450,000
			A	0	0	0	0
2.5	Producto 6: Talleres de formación y asesoría para los Equipos de Gestión de Instituciones Educativas Escolares realizados	Taller	P		0		0
			P(a)		600		443,000
			A	0	0	0	0
2.6	Producto 9: Paquetes para Oficinas de Coordinación Departamental de Supervisión entregados	Equipos	P		0		0
			P(a)		16		186,912.21
			A	0	0	26,500.79	33,087.79

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del área rural

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Producto 10: Estudio de soluciones de transporte aprobado	Documento	P	0	1	0	28,000
			P(a)	1	1	0	110,098
			A	0	0	0	0
3.2	Producto 11: Adquisición de buses escolares recibida	Documento	P		0		0
			P(a)		21		2,000,000
			A	0	0	0	0
3.3	Producto 12: Transferencias a las municipalidades para pilotos de transporte completadas	Transferencia	P	67	134	629,891	2,204,618
			P(a)	0	56	0	935,000
			A	0	0	0	0
3.4	Producto 13: Estudio de evaluación económica de las opciones de transporte	Documento	P	0	1	0	24,000
			P(a)	0	1	0	29,702
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Seguimiento y Evaluación de los Resultados

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
4.1	Producto 14: Estudio de evaluación de proceso	Documento	P	1	1	0	51,000
			P(a)	0	1	0	51,000
			A	0	0	0	0
4.2	Producto 15: Estudio de evaluación de impacto del Proyecto	Documento	P	0	1	0	539,000
			P(a)	0	1	0	539,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración del Proyecto	P			159,273	962,802
		P(a)			50,000	962,799.12
		A			63,369.25	83,822.25
	Auditoría del Proyecto	P			24,000	120,000
		P(a)			15,000	120,000
		A			3,574.09	3,574.09

Total Cost

	Total Cost	P			5,409,183	20,000,000
		P(a)			195,000	19,999,999.82
		A			125,984.63	406,144.86

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Producto 10: Estudio de soluciones de transporte aprobado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CHRISTIANAR	03/29/2021
	Producto 11: Adquisición de buses escolares recibida	Create Output	N/A	CHRISTIANAR	03/29/2021
		Modify Output	Inactivate Output	CHRISTIANAR	03/29/2021
	Producto 12: Transferencias a las municipalidades para pilotos de transporte completadas	Modify Output	Modify Means of Verification	CHRISTIANAR	03/29/2021
	Producto 14: Estudio de evaluación de proceso	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CHRISTIANAR	03/29/2021
	Producto 15: Estudio de evaluación de impacto del Proyecto	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CHRISTIANAR	03/29/2021
	Producto 1: Materiales para innovaciones pedagógicas elaborados y en condiciones de ser utilizados	Create Output	N/A	CHRISTIANAR	03/29/2021
		Modify Output	Inactivate Output	CHRISTIANAR	03/29/2021
			Modify Means of Verification	CHRISTIANAR	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CHRISTIANAR	03/29/2021
	Producto 2: Implementación de innovaciones pedagógicas	Create Output	N/A	CHRISTIANAR	03/29/2021
		Modify Output	Inactivate Output	CHRISTIANAR	03/29/2021
			Modify Baseline and/or Baseline Year	CHRISTIANAR	03/29/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CHRISTIANAR	03/29/2021
			Modify Financial Historical Actual	CHRISTIANAR	03/29/2021
			Modify Means of Verification	CHRISTIANAR	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CHRISTIANAR	03/29/2021
	Producto 3: Diseño y adecuaciones de Escuelas del Siglo XXI	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CHRISTIANAR	03/29/2021
	Producto 4: Talleres de intercambio de experiencias docentes entre escuelas realizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CHRISTIANAR	03/29/2021
	Producto 5: Talleres en escuelas de apoyo al vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia realizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CHRISTIANAR	03/29/2021
			Modify Means of Verification	CHRISTIANAR	03/29/2021
	Producto 6: Talleres de formación y asesoría para los Equipos de Gestión de Instituciones Educativas Escolares realizados	Create Output	N/A	CHRISTIANAR	03/29/2021
		Modify Output	Inactivate Output	CHRISTIANAR	03/29/2021
			Modify Means of Verification	CHRISTIANAR	03/29/2021
	Producto 7: Talleres de formación para Consejos Escolares realizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CHRISTIANAR	03/29/2021

PMR Public Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Producto 8: Sistema software para el monitoreo de la gestión escolar diseñado e instalado	Create Output	N/A	CHRISTIANAR	03/29/2021
		Modify Output	Inactivate Output	CHRISTIANAR	03/29/2021
			Modify Means of Verification	CHRISTIANAR	03/29/2021
	Producto 9: Paquetes para Oficinas de Coordinación Departamental de Supervisión entregados	Create Output	N/A	CHRISTIANAR	03/29/2021
		Modify Output	Inactivate Output	CHRISTIANAR	03/29/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CHRISTIANAR	03/29/2021
			Modify Financial Historical Actual	CHRISTIANAR	03/29/2021
			Modify Means of Verification	CHRISTIANAR	03/29/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CHRISTIANAR	03/29/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity
