

PMR Public Report

Operation Number	PR-L1051	Chief of Operations Validation Date	04/08/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/09/21
Last Update	03/29/21	Country Representative Validation Date	04/19/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support to Early Childhood Development	Loan Number	2667/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	OCHOA, FRANCISCO JOSE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1051	27,000,000	27,000,000	3,000,000	0	30,000,000	27,000,000	21,462,034.15	79.49%	5,537,965.85
Aggregated	27,000,000	27,000,000	3,000,000	0	30,000,000	27,000,000	21,462,034.15	79.49%	5,537,965.85

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

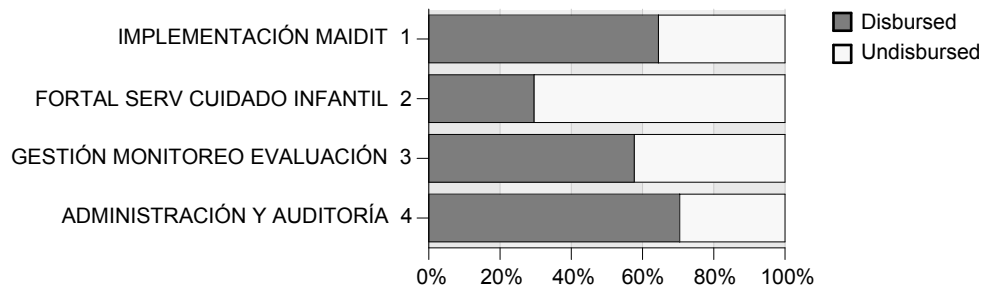

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar los niveles de desarrollo cognitivo, emocional y físico, de los niños/as menores de 5 años, detectando precozmente trastornos en el desarrollo y facilitando el acceso oportuno a intervenciones para su tratamiento.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Niños/as con rezagos en municipios intervenidos.	% niños y niñas	10.00	2011	2022	P	7.00
						A	

Details

Means of verification: Exámenes psicomotores y de lenguaje

Observations: Para el seguimiento se obtendrán mediciones basadas en la evaluación de impacto del programa.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: 1. Los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de los servicios de salud, con énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano, ampliados.

Observation: Observaciones de indicador 1.1 Tasa de niños/as atendidos en relación al número de personal calificado; 1.2 El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT; 1.3 El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT; 1.4, 1.5 y 1.6 Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas - porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles. Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	EOP 2022
0.1	1.1 Niños/niñas menores de 5 años atendidos por personal calificado en DIT, bajo el programa de AIEPI.	Tasa de niños/as	0.00	2011	P								10.00
					A		0.00	0.00					0.00

Details

Means of verification: Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	EOP 2022
0.1	1.2 Niños/as menores de 5 años con rezagos identificados por personal calificado bajo el programa de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia.	% niños/ñas	0.00	2011	P	5.00							10.00
					A		0.00	0.00					0.00

Details

Means of verification: Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.

Observations: El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	EOP 2022
0.1	1.3 Niños/as menores de cinco años con tratamiento en los Servicios de Intervención Temprana.	% niños/ñas	0.00	2011	P	20.00	30.00	40.00					50.00
					A		0.00	0.00					0.00

Details

Means of verification: Información administrativa del AIEPI de las USF Informe de evaluación final del programa.

Observations: El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	EOP 2022
0.1	1.4 Recién nacidos atendidos por el programa	% recién	0.00	2011	P		30.00	40.00					70.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

0.1	Madre Canguro.	nacidos	0.00	2011	A		0.00	0.00					0.00
-----	----------------	---------	------	------	---	--	------	------	--	--	--	--	------

Details

Means of verification: Información administrativa hospitales.

Observations: Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas

Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.

Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específico

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	EOP 2022
0.1	1.5 Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje de hipoacusia	% recién nacidos	0.00	2011	P		30.00	40.00				70.00
					A		0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Información administrativa hospitales.

Observations: Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas

Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.

Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específico

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	EOP 2022
0.1	1.6 Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje visual.	% recién nacidos	0.00	2011	P		30.00	40.00				70.00
					A		0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Información administrativa hospitales.

Observations: Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas

Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.

Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específico

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 1: 2. Los servicios de los centros de desarrollo infantil articulados y fortalecidos.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	EOP 2022
1.1	2.1 Número de centros aplicando protocolos con estándares de calidad.	% centros	10.00	2011	P	15.00	20.00	25.00				30.00
					A		0.00	0.00				0.00

Details

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Encuesta específica al final de ejecución.

Observations: La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada por SPH con base en el KCP 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Numerados: Establecimientos aplicando protocolos. Denominador: total de establecimientos.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	EOP 2022
1.1	2.2 Personal de centros infantiles calificados según currículo vigente.	% personal	10.00	2011	P	15.00	20.00	25.00					30.00
					A		0.00	0.00					0.00

Details

Means of verification: Encuesta específica al final de ejecución.

Observations: Se mide a través de encuestas de conocimiento: La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada por SPH con base en el 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Denominador total de personal de los establecimientos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1. Implementación del Modelo de Atención Integral de Desarrollo Infantil Temprano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	1.2.1 Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el Programa (de acuerdo con mapeo)	SIT	P		10		8,475,235
			P(a)	0	16	313,800	2,170,414.93
			A	0	0	133,120.93	133,120.93
1.2	1.3.1 Hospital de referencia Acosta Ñu fortalecido	Hospital	P		1		2,255,221
			P(a)	0	1	0	1,063,640.64
			A	0	1	60,434.91	1,063,640.64
1.3	1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención materno-infantil del programa.	Establecimientos	P		12		3,226,174
			P(a)	2	5	4,500	30,000
			A	0	0	0	0
1.4	1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales y materno-infantil	Establecimientos	P		11		2,639,848
			P(a)	9	30	60,000	326,241
			A	21	21	186,241	186,241
1.5	1.1.2 USF estándar, rehabilitados con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF estándar	P		167		3,678,615
			P(a)	3	9	398,907.47	1,681,126.1
			A	3	8	716,216.67	1,289,271.72
1.6	1.1.3 USF ampliadas con infraestructura, equipamiento y materiales	USF ampliada	P		0		0
			P(a)	1	3	377,743.2	1,072,231.6
			A	2	3	673,979.18	802,178.14
1.7	1.1.4 MAIDIT completado en los tres niveles de atención con los manuales para su implementación	Documentos	P		0		0
			P(a)	0	10	0	898,217.39
			A	0	10	0	898,217.39
1.8	1.1.5 Personal sanitario y agentes comunitarios capacitados en DIT en el primer nivel de atención	Persona	P		0		0
			P(a)	105	2,179	496,000	908,276.94
			A	0	2,029	148,291.01	554,186.23
1.9	1.1.6 Encuesta Indicadores Múltiples Conglomerados (MICS) realizada	Encuesta	P		0		0
			P(a)	0	1	0	492,590.08
			A	0	1	0	492,590.08
1.10	1.2.2 Personal sanitario capacitados en DIT en el segundo nivel de atención.	Persona	P		0		0
			P(a)	20	144	14,000	68,254.22
			A	56	114	6,395.86	18,254.22
1.11	1.3.4 Personal sanitario capacitados en DIT en el tercer nivel de atención	Persona	P		0		0
			P(a)	20	74	12,750	70,270.32
			A	34	64	13,114.41	20,270.32
1.12	1.1.1. Agentes comunitarios incorporados a las USF para la implementación del MAIDIT	Agentes comunitarios	P		0		0
			P(a)	374	137	170,000	4,065,387.03
			A	374		395,472.67	4,065,387.03
1.13	1.1.2 USF estándar, ampliados con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF Estándar	P		0		0
			P(a)	7	68	3,425,740.65	10,982,789.03
			A	16	46	3,294,607.46	5,123,312.44
1.14	1.1.2 USF estándar, reconstruidos con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF Estándar	P		0		0
			P(a)	3	22	5,012,878.5	3,103,180.2
			A	5	22	1,854,327.99	3,103,180.2

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 2. Fortalecimiento de Servicios complementarios de atención infantil.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	2.1. Normativas estandarizadas aprobadas por el MEC, SNNA y MSPBS.	Proyecto de Normativa	P		1		388,000
			P(a)	0	1	0	15,628.39
			A	0	1	0	15,628.39
2.2	2.2. Centros de cuidado infantil CEBINFA del MSPyBS, fortalecidos.	establecimientos	P		31		1,188,519
			P(a)	0	32	212,500	731,975.47
			A	0	0	16,522.67	203,788.47

Component Nbr. 3 3. Gestión de los programas de DIT, Monitoreo y Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	3.1. Modelos descentralizados para la protección de los derechos del niño implementados en los municipios del programa.	municipios	P		20		61,000
			P(a)	0	20	255,000	300,000
			A	0	0	0	0
3.2	3.3 Sistema de información gerencial de DIT con enfoque de red implementado en el MSPyBS.	sistema	P		1		130,000
			P(a)	0	1.7	0	378,119.38
			A	0	1.7	0	378,119.38
3.3	3.4 Evaluaciones del programa realizado (mediciones)	evaluaciones	P		2		640,000
			P(a)	0	2	10,000	68,254.3
			A	0	2	0	18,254.3

Other Cost

	Fortalecimiento Institucional del MSPyBS Administración y Auditoría	P				1,318,258
		P(a)			600,000	1,573,402.98
		A			344,742.87	1,318,145.85
	Imprevistos	P				63,900
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P				30,000,000
		P(a)			11,363,819.82	30,000,000
		A			7,843,467.63	19,683,786.73

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.1.1. Agentes comunitarios incorporados a las USF para la implementación del MAIDIT	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/22/2021
	1.1.2 USF estándar, ampliados con infraestructura, equipamiento y materiales.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/22/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VSOSA	03/22/2021
	1.1.2 USF estándar, reconstruidos con infraestructura, equipamiento y materiales.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/22/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VSOSA	03/22/2021
	1.1.2 USF estándar, rehabilitados con infraestructura, equipamiento y materiales.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/22/2021
	1.1.3 USF ampliadas con infraestructura, equipamiento y materiales	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/22/2021
	1.1.5 Personal sanitario y agentes comunitarios capacitados en DIT en el primer nivel de atención	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/22/2021
	1.2.1 Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el Programa (de acuerdo con mapeo)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/22/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VSOSA	03/22/2021
	1.2.2 Personal sanitario capacitados en DIT en el segundo nivel de atención.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/22/2021
	1.3.1 Hospital de referencia Acosta Ñu fortalecido	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/22/2021
	1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención materno-infantil del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/22/2021
	1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales y materno-infantil	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/22/2021
	1.3.4 Personal sanitario capacitados en DIT en el tercer nivel de atención	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/22/2021
	2.2. Centros de cuidado infantil CEBINFA del MSPyBS, fortalecidos.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/22/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VSOSA	03/22/2021
	3.1. Modelos descentralizados para la protección de los derechos del niño implementados en los municipios del programa.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	VSOSA	03/22/2021
	3.4 Evaluaciones del programa realizado (mediciones)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	VSOSA	03/22/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation
Stakeholder Priorities
