

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	BO-L1113	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/18/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/30/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Rural Land Regularization and Titling Program	<b>Loan Number</b>	3722/BL-BO
<b>Executing Agency</b>	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA	<b>Sector/Subsector</b>	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
<b>Team Leader</b>	MATTOS, JUAN DE DIOS	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Bolivia
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE BOLIVIA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	A	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Unsatisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	En la misión el INRA presentó el estado de avance en los puntos socio ambientales del plan de acción acordado con el BID que se encuentra en proceso de ejecución. Los principales avances se concentran en: a) Se cuenta con especialistas ambiental y social que forman parte del equipo del INRA. b) Se cuenta con TDR y se ha iniciado el proceso de contratación de especialistas para la actualización del PGAS que al momento no cuenta con los planes adecuados para la gestión de impactos ambientales y sociales, e incluye un análisis de los riesgos ambientales y sociales generados por el programa hasta la fecha. c) Se han venido implementando mecanismos participativos de titulación de las áreas remanentes, en cumplimiento de demandas de pueblos indígenas, se ha desarrollado reuniones de coordinación con las autoridades de los pueblos indígenas para orientar en este proceso de titulación. d) Se cuenta con un desarrollo considerable de la Plataforma Inter operativa SIMAT/SIG del INRA para la transparencia del proceso agrario, la misma que ha sido expuesta en la misión.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1113	60,000,000	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000	60,000,000	35,084,732.91	58.47%	24,915,267.09
Aggregated	60,000,000	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000	60,000,000	35,084,732.91	58.47%	24,915,267.09

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

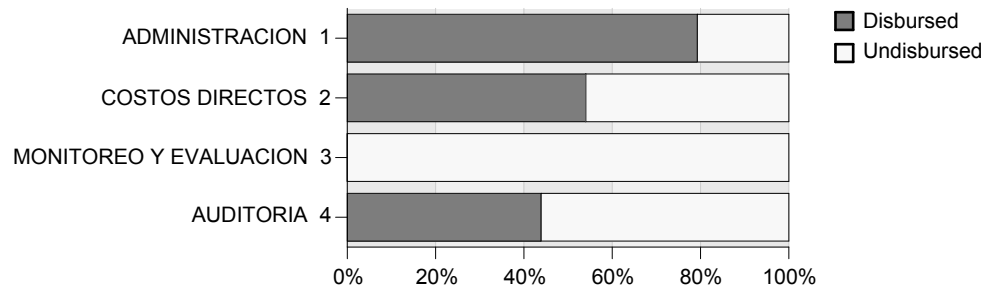

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 0:** 1. Aumentar los ingresos netos del hogar

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Incremento en el ingreso neto total del Hogar	US\$/año	801.00	2008	2022	P	974.00
						A	0.00
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity		No	
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)							

**General Development Objectives Nbr. 1:** 2. Aumentar la productividad agropecuaria de los productores agropecuarios

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Incremento en el valor bruto de la producción agropecuaria (VBA)	US\$/HA	870.00	2008	2022	P	1,075.00
						A	0.00
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity		No	
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)							

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: 1. Aumento de la inversión Productiva

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2023
0.0	Valor de la inversión productiva (maquinaria y equipos) de los productores agropecuarios	US\$ invertidos por año	215.00	2008	P					241.00	241.00
					A				0.00		
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2023
0.1	Beneficiarios con títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	# of farmers	0.00	2019	P						
					A	48,649.00	77,894.00		0.00	0.00	122,543.00
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				
	Male				P						
					A					0.00	
	Female				P						
					A					0.00	
	Indigenous				P						
					A					0.00	

Specific Development Objectives Nbr. 1: 2. Reducción del Costo de la Titulación de Propiedades Rurales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2023
1.0	Costo promedio del proceso completo de titulación de propiedad rural	US\$/HA	8.31	2016	P					7.00	7.00
					A				0.00	0.00	0.00
Details											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

Specific Development Objectives Nbr. 2: 3. Reducción del tiempo promedio de compra y venta de propiedad

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2023
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

2.0	Tiempo que se requiere para inscribir la compra y venta de propiedad en los registros públicos	Números de días laborales	39.70	2016	P					25.00	25.00
					A				0.00	0.00	0.00
Details											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

Specific Development Objectives Nbr. 3: 4. Reducción del área intervenida bajo conflictos por saneamiento y titulación

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2023
3.0	Número de Ha. bajo conflictos por saneamiento y titulación de propiedad rural resultados	Millones de Ha.	5.00	2016	P					3.00	3.00
					A				0.00	0.00	0.00
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Specific Development Objectives Nbr. 4: 5. Fortalecimiento institucional del INRA y DRRR

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2023
4.0	Oficinas del INRA y DRRR compartiendo información de catastro y registro de forma automática	%	0.00	2016	P					100.00	100.00
					A				0.00	0.00	0.00
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 1. Saneamiento, titulación y registro de tierras rurales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.1	Títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Títulos	P	300,000	1,300,000	11,938,787	74,938,787
			P(a)	72,194	1,300,000	6,590,532.78	74,402,000
			A	41,569	493,876	127,070.32	41,385,581.37
1.2	Personal del INRA capacitado en gestión de conflictos sociales.	Personas	P		900		70,000
			P(a)	0	900	0	70,000
			A	0	85	0	6,458.14
1.3	Implementación de una brigada especializada en conflictos sociales.	Brigada	P		1		150,000
			P(a)	1	1	34,923.78	150,000
			A	0	0	0	0
1.4	Técnicos del tribunal agroambiental capacitados en gestión de conflictos sociales.	Técnicos	P		160		150,000
			P(a)	160	160	150,000	150,000
			A	0	0	0	0
1.5	Desarrollo y puesta en marcha del mecanismo de atención al usuario de los servicios de saneamiento, catastro, titulación y registro.	Protocolo	P		1	6,000	50,000
			P(a)	0	1	0	50,000
			A	0	0	0	0
1.6	Manual de transparencia actualizado.	Manual	P		1		21,600
			P(a)	1	1	21,600	21,600
			A	0	0	0	0
1.7	Técnicos del INRA capacitados en la utilización del manual de transparencia.	Técnicos	P		900	26,400	86,400
			P(a)	900	900	12,966.45	86,400
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 2. Administración de tierras

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.1	Sistemas SIMAT/SIC actualizado e integrado	Sistema	P		1		693,054
			P(a)		1	76,657.7	993,054
			A	0	1	0	715,592.63
2.2	Implementación de los sistemas SIMAT/SIC en las oficinas del INRA.	Oficinas	P		9		131,748
			P(a)	4	9	45,700	131,748
			A	0	5	0	83,680.62
2.3	Desarrollo de la plataforma informática de servicios de Derechos Reales.	Plataforma	P		1		800,000
			P(a)	0	1	0	828,430
			A	0	0	0	0
2.4	Plataforma de servicios del INRA diseñada e implementada.	Plataforma	P		1	1,002,604	3,852,604
			P(a)	0	1	0	4,054,428
			A	0	0	0	530,430
2.5	Nodo geobolivia implementado.	Nodo	P		1		15,826
			P(a)	1	1		15,826
			A	0	0	0	15,204.18
2.6	Campañas de mantenimiento catastral.	Campañas	P	1	5	100,000	600,000
			P(a)	0	5	0	600,000
			A	0	5	0	599,427
2.7	Digitalización e indexación de carpetas.	Carpetas	P	500	5,000	250,000	1,900,000
			P(a)	5,000	5,000	100,000	1,900,000
			A	0	0	0	0
2.8	Centros de Operaciones del INRA fortalecidos.	Oficinas	P		3		6,044,172
			P(a)	0	3	400,000	6,050,000
			A	0	0	0	0
2.9	Plan de gestión ambiental y social implementado	Plan	P	1	1	426,514	2,376,514
			P(a)	0	1	408,652.35	2,376,514
			A	0	0	0	25,517.88

## Other Cost

Administración	P			839,295	7,239,295
	P(a)			219,309.08	7,240,000
	A			26,235.56	6,318,273.48
Monitoreo y evaluación	P				580,000
	P(a)			50,000	580,000
	A			0	0
Auditoría	P			120,000	300,000
	P(a)			16,226	300,000
	A			16,226	147,963.23

## Total Cost

Total Cost	P			14,709,600	100,000,000
	P(a)			8,126,568.14	100,000,000
	A			169,531.88	49,828,128.53

**CHANGES TO THE MATRIX**

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Materialized		Political Environment
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE



# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Fiduciary Dimensions
Project Monitoring & Evaluation
