

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1490	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/19/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/28/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Innovation for Growth Program	<b>Loan Number</b>	4358/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJECOS	<b>Sector/Subsector</b>	SCIENCE AND TECHNOLOGY-STI POLICY & INSTITUTIONS
<b>Team Leader</b>	RADAELLI, VANDERLEIA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Brazil
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJECOS		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	El ejecutor está en cumplimiento con los requisitos de salvaguardas ambientales y sociales requeridos por el Banco debido a que demostrado seguir todas las recomendaciones para seleccionar e identificar tanto proyectos Categoría B como C. Hasta el momento sólo se ha realizado reconocimiento de gastos para proyectos Categoría C. Para el caso de proyectos identificados Categoría B, no se ha reconocido ningún gasto ya que el ejecutor primero debe fortalecer su Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales para garantizar que cada uno de estos proyectos estará en cumplimiento con las salvaguardas ambientales y sociales. Al momento, el ejecutor tiene el apoyo de una consultoría externa para fortalecer para fortalecer el SARAS y poder realizar la evaluación ambiental y social de las operaciones Categoría B.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1490	600,000,000	600,000,000	103,600,000	0	703,600,000	600,000,000	332,820,133.54	55.47%	267,179,866.46
<b>Aggregated</b>	<b>600,000,000</b>	<b>600,000,000</b>	<b>103,600,000</b>	<b>0</b>	<b>703,600,000</b>	<b>600,000,000</b>	<b>332,820,133.54</b>	<b>55.47%</b>	<b>267,179,866.46</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

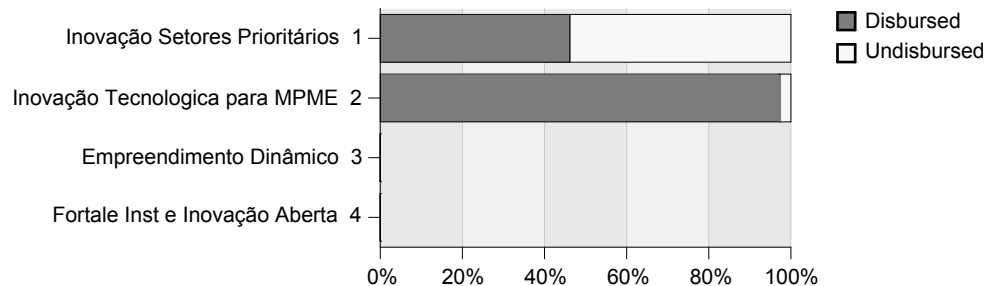

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 0:** Produtividade do trabalho: Setores Prioritários

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Produtividade do Trabalho média (ROB por Trabalhador) das empresas beneficiárias em Setores Prioritários	US\$	101,300.00	2014	-	P	115,000.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** La línea de base es la mediana del total de empresas beneficiarias por Finep al momento de la postulación.

**Observations:** La meta en 2023 se imputa a partir del crecimiento diferencial de las beneficiarias de Finep en los tres componentes del programa y grupo de control (empresas solicitantes no beneficiadas).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

**General Development Objectives Nbr. 1:** Produtividade do trabalho: MPMEs Beneficiárias

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Produtividade do Trabalho média (ROB por Trabalhador) das MPMEs beneficiárias	US\$	43,700.00	2013	-	P	50,000.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** A linha de base é a mediana do total de MPMEs beneficiárias de Finep ao momento da solicitação. A Meta em 2024 se calcula a partir do crescimento diferencial das beneficiárias da Finep no componente 2 do programa e do seu respectivo grupo de controle (empresas solicitantes não beneficiárias).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 3:** Produtividade do trabalho: Finep Start-up

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
3.0	Produtividade do Trabalho média (ROB por Trabalhador) das empresas beneficiárias do Programa Finep Start-up	US\$	6,700.00	2017	-	P	20,000.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** A linha de base é a mediana do total de empresas participantes da Banca Presencial do Finep Startup ao momento da solicitação. A Meta em 2024 se calcula a partir do crescimento diferencial das beneficiárias da Finep no componente 3 do programa e do seu respectivo grupo de controle (empresas solicitantes não beneficiárias).

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Componente 1 – Inovação em Setores Prioritários

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.0	Percentual de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação sobre vendas nas empresas beneficiárias dos setores estratégicos	%	2.30	2016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90
					A	0.00	0.00				0.00

#### Details

**Means of verification:** La línea de base es la mediana del total de empresas beneficiarias por Finep en los sectores estratégicos al momento de la postulación. La meta en 2023 se imputa a partir del crecimiento diferencial de las beneficiarias de Finep en los sectores estratégicos y grupo de control (empresas solicitantes no beneficiadas).

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.1	Percentual de empresas que conseguem criar um novo produto ou processo entre as empresas beneficiárias dos setores estratégicos	%	54.00	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00
					A	0.00	0.00				0.00

#### Details

**Means of verification:** La línea de base corresponde al promedio de empresas grandes (100 a más trabajadores) que en Pesquisa de Inovação (PINTEC) reportan haber hecho innovaciones en productos o procesos en el período 2012-2014.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Componente 2 – Inovação Tecnológica para MPE

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
1.0	Percentual de pesquisa, desenvolvimento e inovação em relação a vendas nas MPMEs beneficiárias	%	2.60	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10
					A	0.00	0.00				0.00

#### Details

**Means of verification:** Las empresas beneficiarias son empresas apoyadas por el Componente 2. La información es levantada mediante el sistema de postulaciones de cada institución financiera intermediaria. El grupo de control será constituido por postulantes rechazados y microdatos de la encuesta PINTEC. Línea de Base PDI a ventas en 2014 para empresas entre 10-100 empleados según PINTEC.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
1.1	Percentual de empresas que conseguem criar um novo produto ou processo entre as MPMEs beneficiárias	%	34.00	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00
					A	0.00	0.00				0.00

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

##### Details

**Means of verification:** La línea de base corresponde al promedio de empresas pequeñas y medianas (10 a 99 trabajadores) que en PINTEC reportan haber hecho innovaciones en productos o procesos en el periodo 2012-2014.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Componente 3 - Empreendimento dinâmico

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
2.0	Taxa de sobrevivência das empresas beneficiárias do Programa Finep Start-up	%	50.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
					A	0.00	0.00				0.00

##### Details

**Means of verification:** Sistema de Monitoreo de FINEP- Start-up. Se refiere a empresas beneficiarias del programa que sobreviven por lo menos 5 años con respecto a empresas jóvenes de un grupo de control. El grupo de control se obtiene de la base del Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1 – Inovação em Setores Prioritários

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.1	1.1 - Projetos de inovação financiados: indústria química financiados	Projetos	P	1	16	4,500,000	62,126,056
			P(a)	0	18	0	49,212,777.56
			A		18		33,995,926.04
1.2	1.2 - Projetos de inovação financiados: mineração e transformação mineral financiados	Projetos	P	4	15	15,000,000	57,192,907
			P(a)	0	3	0	6,419,181.74
			A		3		4,799,543.84
1.3	1.3 - Projetos de inovação financiado: biocombustíveis avançados financiados	Projetos	P	1	2	1,950,000	7,228,887
			P(a)	0	12	0	85,872,083.66
			A		1		5,000,165.66
1.4	1.4 - Projetos de inovação financiados: agronegócios, alimentos e bebidas financiados	Projetos	P	2	19	13,800,000	76,809,503
			P(a)	0	19	0	68,677,451.62
			A		14		56,123,452.06
1.5	1.5 - Projetos de inovação financiados: Tecnologias de Informação e Comunicação financiados	Projetos	P	3	15	11,800,000	51,738,709
			P(a)	0	15	0	49,988,299.49
			A		10		28,521,423.14
1.6	1.6 - Projetos de inovação financiados: em Saúde financiados	Projetos	P	2	14	13,800,000	87,560,155
			P(a)	0	14	0	82,785,477.84
			A		9		46,190,974.38
1.7	1.7 - Projetos de inovação financiados: Metalomecânica financiados	Projetos	P	5	36	27,500,000	175,465,728
			P(a)	0	30	0	181,484,780.35
			A		17		85,511,639.66

## Component Nbr. 2 Componente 2 – Inovação Tecnológica para MPE

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.1	2.1 - Projetos de inovação financiados em MPMEs financiados	Projeto	P	45	299	6,000,000	113,578,054
			P(a)	0	299	0	108,701,813.56
			A		247		105,818,876.58

## Component Nbr. 3 Componente 3 - Empreendimento dinâmico

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
3.1	3.1 - Projetos de financiamento de empresas nascentes intensivas em conhecimento financiados	Projeto	P	42	163	14,169,556	57,600,002
			P(a)	0	61	0	57,600,002
			A		13		1,559,111

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Componente 4 - Fortalecimento Institucional e Inovação Aberta

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
4.1	4.1 - Projeto Roadmapping concluído	Estudos	P	0	1	0	320,000
			P(a)	0	1	0	320,000
			A		1		107,856.45
4.2	4.2 - Avaliação de Impacto realizada	Estudos	P	1	5	200,000	850,000
			P(a)	0	5	0	850,000
			A		1		105,541
4.3	4.3 - Estruturação de Sistemas de Suporte a Operação	Sistema	P	0	4	1,464,000	7,130,000
			P(a)	0	9	0	7,130,000
			A		8		4,672,738

## Other Cost

	Gestão do Programa	P			0	5,999,999
		P(a)			0	5,999,999
		A				2,807,189.56

## Total Cost

	Total Cost	P			110,183,556	703,600,000
		P(a)			0	705,041,866.82
		A				375,214,437.37

**CHANGES TO THE MATRIX**

No information available for this section



## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Legal Environment
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Political Environment
	Response actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Planning
	Response actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Inactive		Institutional Environment
	Response actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Inactive		Goods, and Services
	Response actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Institutional Environment
	Response actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Inactive		Organizational Structure
	Response actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	11.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Political Environment
	Response actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Inactive		Natural Environment
	Response actions		
	13.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Inactive		Organizational Structure
	Response actions		
	14.0	Management Strategy	Status
		-	

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
-----------------------------
