

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1408	Chief of Operations Validation Date	10/19/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/01/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for the Expansion and Improvement of Specialized Health Care in the State of Ceará II – PROEXMAES II	Loan Number	3703/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Team Leader	MOURA DA FONSECA PINTO, CATHERINE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DE CEARA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	O Programa conta com apenas uma obra significativa, de construção do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ) que já está em fase de finalização. A performance foi considerada satisfatória pois os acordos da missão de 2020 referentes à elaboração do (i) Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS), para a fase de operação do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), e do (ii) Plano de Gestão Territorial (PGT) foram cumpridos, não havendo novos temas ambientais ou sociais que ensejem planos corretivos. A UGP possui apoio de Supervisora de obras e tem efetuado o monitoramento dos aspectos ambientais e sociais do Programa		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1408	123,000,000	123,000,000	55,500,000	0	178,500,000	123,000,000	75,467,841.05	61.36%	47,532,158.95
Aggregated	123,000,000	123,000,000	55,500,000	0	178,500,000	123,000,000	75,467,841.05	61.36%	47,532,158.95

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

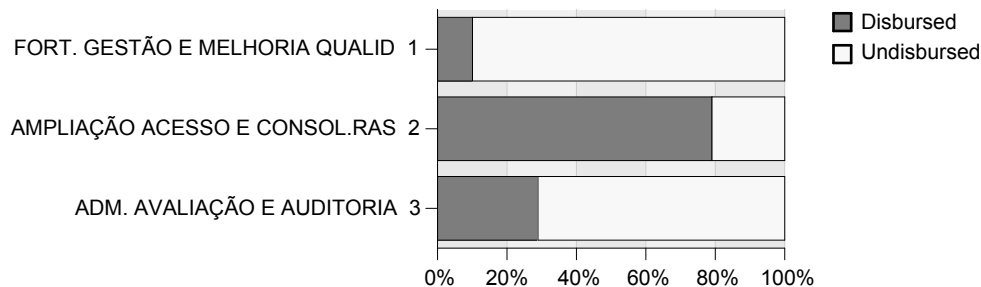

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Contribuir para a melhoria das condições de saúde da população do Ceará.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	1.1 Taxa de mortalidade prematura por Diabetes Mellitus (DM)	por 100.000 habitantes	9.49	2013	2022	P	8.87
						A	

Details

Means of verification: DATASUS

Observations: Número de óbitos prematuros (30-59 anos) por DM de população residente/população residente x 100.000. Diabetes: categorias E10-E14 do CID-10.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

	Homens				P	8.87
					A	
	Mulheres				P	8.87
					A	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	1.2 Taxa de mortalidade prematura por Acidente Vascular Cerebral (AVC).	por 100.000 habitantes	7.33	2013	2022	P	6.85
						A	

Details

Means of verification: DATASUS

Observations: Número de óbitos prematuros (30-59 años) por AVC de população residente/população residente x 100.000. AVC: categoria I-64 do CID-10.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

	Mulheres					P	5.58
						A	
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	1.3 Porcentagem de nascidos vivos com baixo peso ao nascer <2.500 g.	%	8.00	2014	2022	P	6.00
						A	
Details							
Means of verification: DATASUS							
Observations: Número de nascidos vivos con peso inferior a 2.500g ao nascer no Ceará/ número total de nascidos vivos no Ceará.							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No		
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)							

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Desempenho do sistema de saúde melhorado.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	1.1 Porcentagem de internações por condições sensíveis a atenção básica.	%	20.13	2013	P			18.72	18.72
					A	15.00			

Details

Means of verification: DATASUS

Observations: Número de internações por causas sensíveis a atenção básica no Ceará/total internações no Ceará.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Homens	P	22.29
		A	7.50
	Mulheres	P	16.71
		A	7.50

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.1	1.2 Taxa anual de hospitalizações por Diabetes Mellitus e suas complicações na população de 30 a 59 anos de idade residentes no Ceará.	por 10.000 habitantes	4.82	2013	P			4.50	4.50
					A	5.00			

Details

Means of verification: DATASUS SIH-SUS (Sistema de Informação Hospitalária) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Observations: Número de hospitalizações por DM e suas complicações na população de 30-59 anos/população residente de 30-59 anos x 10.000 habitantes.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.2	1.3 Porcentagem de consultas especializadas de atenção pré-natal de gravidez de risco realizadas em relação às programadas.	%	45.00	2014	P			70.00	70.00
					A	65.00			

Details

Means of verification: Superintendência de Redes e Unidades (SRU/SESA)

Observations: Número de consultas especializadas de atenção pré-natal grávidas classificadas como de alto risco (realizadas/programadas) X 100.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

0.3	1.4 Porcentagem de todas as grávidas diagnosticadas com sífilis com o diagnóstico no primeiro trimestre da gestação.	%	22.00	2014	P				75.00	75.00
					A		36.30			

Details

Means of verification: DATASUS

Observations: Número de grávidas diagnosticadas com sífilis no primeiro trimestre da gestação/total de grávidas diagnosticadas com sífilis durante a gestação.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 1: Acesso e qualidade dos serviços de saúde aumentados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	2.1 Beneficiários de serviços de saúde.	# of beneficiaries	7,012,000.00	2013	P				7,713,200.00	7,713,200.00
					A	7,792,887.00	6,611,458.00			

Details

Means of verification: DATASUS

Observations: Número de pessoas cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Estado de Ceará.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	2.2 Tempo médio de permanência (dias) de pacientes internados em hospitais da rede pública do Ceará.	Dias	9.50	2014	P				7.00	7.00
					A		6.80			

Details

Means of verification: SRU/SESA

Observations: Número de pacientes-dia da unidade, no período de análise/total de saídas da unidade, no período de análise.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.2	2.3 Número de dias para emissão de relatório médico para tomografia.	Dias	15.00	2014	P				4.00	4.00
					A		0.00			

Details

Means of verification: Superintendência de Redes e Unidades (SRU/SESA)

Observations: Número de dias entre a data do exame de tomografia e a disponibilidade dos resultados.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.3	2.4 Tempo-resposta (dias) para os exames de laboratório na rede pública do Ceará. (*Para este resultado, serão tomados os exames de uréia, creatinina, T4, TSH e hemoglobina glicosilada.)	Dias	7.00	2014	P				3.00	3.00
					A		0.00			

Details

Means of verification: Superintendência de Redes e Unidades (SRU/SESA)

Observations: Número de dias entre a data do exame laboratorial e a disponibilidade dos resultados.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
1.1	1.1 Fortalecimento da gestão e melhoria da qualidade dos serviços implantados. (Projeto de Reforma do Sistema de Saúde (Redução de Desperdício e Governança) e Melhoria dos processos implantados).	# (projeto)	P	1	2	324,705	2,800,000
			P(a)	2	6	851,683	2,685,643.42
			A	0	2	329,942	489,787.42
1.2	1.2 Sistemas de regulação do acesso, auditorias e monitoramento dos indicadores estratégicos da SESA reforçados.	# (sistemas)	P	1	2	64,167	1,000,000
			P(a)	1	2	956,917	1,000,000
			A	0	0		43,083
1.3	1.4 Protocolos clínicos e linhas de cuidado prioritárias desenvolvidos e implementados. (*Linhas de cuidado: Materno-Infantil, DM e Hipertensão Arterial Sistêmica.)	# (prot/linha)	P	0	3	1,697,143	3,000,000
			P(a)	0	3	200,000	1,500,000
			A	0	0		0
1.4	1.11 Acreditação de unidades de saúde (Policlinicas, CEOs e Hospitais) e SAMU realizada.	# (estabelecimentos acreditados)	P	9	32	393,955	1,500,000
			P(a)	0	20	153,860	830,872
			A	0	0		99,444
1.5	1.10 Informatização e melhoria dos processos de gestão para rede de saúde do Estado realizadas.	# (unidades da Rede SESA)	P	0	7	750,000	3,003,564
			P(a)	0	7	123,972	3,003,564
			A	0	0	72,079	2,951,671

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2. Ampliação do Acesso e Consolidação das Redes de Atenção em Saúde.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
2.1	2.2 Hospital Regional Litoral-Jaguaribe construído.	# (hospital construído)	P	0	1	0	38,062,468
			P(a)	1	1	7,116,582	38,062,468.31
			A	0	0	919,633	31,865,519.31
2.2	2.3 Equipamentos para o Hospital Litoral-Jaguaribe adquiridos.	# (hospital equipado)	P	0	1	0	25,425,267
			P(a)	0	1	11,852,641	17,308,548
			A	0	0	1,726,379	1,726,379
2.3	2.5 Policlínicas equipadas.	# (policlinicas equipadas)	P	0	4	0	5,407,286
			P(a)	0	4	1,024,128	1,466,998
			A	0	0	74,918	187,291
2.4	2.6 Equipamentos médicos e modernização para Rede SESA adquiridos.	# (unidades de saúde)	P	0	10	10,326,936	30,536,990
			P(a)	0	10		8,171,786
			A	0	0	0	0
2.5	2.12 Adequação física em unidades nas macrorregiões de saúde realizada.	# (unidades de saúde)	P	4	31	259,672	3,667,079
			P(a)	0	1	0	3,667,079
			A	0	0	0	0
2.6	2.17 Aquisição de testes de kits rápidos para apoiar as ações de diagnósticos de casos (COVID-19)	kit de testes	P		0		0
			P(a)	0	300,000	0	2,960,467.5
			A	0	300,000	0	2,960,467.5
2.7	2.18 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adquiridos para prevenção da COVID-19 e vigilância em saúde (COVID-19).	unidades de saúde	P		0		0
			P(a)	0	209	0	17,086,394.94
			A	0	209	0	17,086,394.94
2.8	2.19 Unidades de Saúde beneficiadas com a aquisição de respiradores para o enfrentamento do COVID-19	unidades de saúde	P		0		0
			P(a)	0	67	0	15,985,615.57
			A	0	67	0	15,985,615.57
2.9	2.20 Hospital Regional do Cariri (HRC) e Hospital Regional Norte (HRN) da REDE SESA em operação.	# Hospitais	P		0		0
			P(a)	2	2	55,500,000	55,500,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Componente 3. Administração, Avaliação e Auditoria.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
3.1	3.1 Avaliação de impacto realizada.	# (doc.aval.)	P	0	2	0	300,000
			P(a)	1	2	51,123	300,000
			A		0	31,767	31,767
3.2	3.2 Avaliação intermediária realizada.	# (doc.aval.)	P	0	1	0	30,000
			P(a)	1	1	30,000	30,000
			A		0	0	0
3.3	3.3 Avaliação Final realizada.	# (doc.aval.)	P	0	1	0	70,000
			P(a)	0	1	0	70,000
			A		0	0	0

Other Cost

Monitoramento do Programa realizado	P			1,605,434	9,500,000
	P(a)			1,409,122	9,500,000
	A			692,950	3,196,244

Total Cost

	Total Cost	P			25,547,150	178,500,000
		P(a)			79,270,028	179,129,436.74
		A			3,847,668	76,623,663.74

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.1 Fortalecimento da gestão e melhoria da qualidade dos serviços implantados. (Projeto de Reforma do Sistema de Saúde (Redução de Desperdício e Governança) e Melhoria dos processos implantados).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	09/22/2021
	1.10 Informatização e melhoria dos processos de gestão para rede de saúde do Estado realizadas.	Modify Output	Modify Unit of Measure	KATIAS	09/20/2021
	1.11 Acreditação de unidades de saúde (Policlínicas, CEOs e Hospitais) e SAMU realizada.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	09/21/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KATIAS	09/16/2021
	1.12 Planejamento reprodutivo especial - IMPLANON implementado.	Modify Output	Inactivate Output	KATIAS	09/21/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	09/21/2021
			Modify Financial Historical Actual	KATIAS	09/21/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KATIAS	09/21/2021
			Modify Physical Historical Actual	KATIAS	09/21/2021
	1.3 Protocolos clínicos e linhas de cuidado prioritárias desenvolvidos . (*Linhas de cuidado: Materno-Infantil, DM e Hipertensão Arterial Sistêmica.)	Modify Output	Inactivate Output	KATIAS	09/20/2021
	1.4 Protocolos clínicos e linhas de cuidado prioritárias desenvolvidos e implementados. (*Linhas de cuidado: Materno-Infantil, DM e Hipertensão Arterial Sistêmica.)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	09/21/2021
			Modify Output name	KATIAS	09/21/2021
	1.5 Capacitações e formação da equipe SESA realizadas.	Modify Output	Inactivate Output	KATIAS	09/21/2021
	1.6 Novas instalações (sede) da SESA construídas e equipadas.	Modify Output	Inactivate Output	KATIAS	09/21/2021
	1.7 Adequação Física para as Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) realizada.	Modify Output	Inactivate Output	KATIAS	09/20/2021
	1.8 Adequação Física para Hemocentros realizada.	Modify Output	Inactivate Output	KATIAS	09/21/2021
	1.9 Centro de logística construído e equipado, implantado.	Modify Output	Inactivate Output	KATIAS	09/20/2021
	2.1 Projetos Executivos do Programa elaborados.	Modify Output	Inactivate Output	KATIAS	09/21/2021
	2.10 Apoio na implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos Municípios elegíveis no Estado do Ceará realizado.	Modify Output	Inactivate Output	KATIAS	09/22/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	09/21/2021
			Modify Financial Historical Actual	KATIAS	09/21/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KATIAS	09/21/2021
			Modify Physical Historical Actual	KATIAS	09/21/2021
	2.11 Ambulâncias para municípios adquiridas.	Modify Output	Inactivate Output	KATIAS	09/21/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by	KATIAS	09/21/2021

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	2.11 Ambulâncias para municípios adquiridas.	Modify Output	a change in the Financial P(a).		
			Modify Financial Historical Actual	KATIAS	09/21/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KATIAS	09/21/2021
			Modify Physical Historical Actual	KATIAS	09/21/2021
	2.12 Adequação física em unidades nas macrorregiões de saúde realizada.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KATIAS	09/16/2021
	2.13 Aquisição de equipamentos médicos para unidades nas macrorregiões de saúde.	Modify Output	Inactivate Output	KATIAS	09/21/2021
	2.14 Expansão do Centro Pediátrico do Câncer realizado.	Modify Output	Inactivate Output	KATIAS	09/20/2021
	2.15 Equipamentos para o Hospital de Itapipoca adquiridos.	Modify Output	Inactivate Output	KATIAS	09/21/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	09/21/2021
			Modify Financial Historical Actual	KATIAS	09/21/2021
	2.16 Programa Nascer no Ceará - Atenção à Gravidez de Alto Risco.	Modify Output	Inactivate Output	KATIAS	09/20/2021
	2.3 Equipamentos para o Hospital Litoral-Jaguaribe adquiridos.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	09/22/2021
	2.4 Policlínicas construídas.	Modify Output	Inactivate Output	KATIAS	09/21/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	09/21/2021
			Modify Financial Historical Actual	KATIAS	09/21/2021
	2.5 Policlínicas equipadas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	09/22/2021
	2.6 Equipamentos médicos e modernização para Rede SESA adquiridos.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	09/23/2021
	2.8 Postos no Hospital de Messejana com leitos ampliados (Postos III e IV) .	Modify Output	Inactivate Output	KATIAS	09/21/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	09/21/2021
			Modify Financial Historical Actual	KATIAS	09/21/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KATIAS	09/21/2021
			Modify Physical Historical Actual	KATIAS	09/21/2021

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Systems
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Political Environment
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Internal Processes
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Technical-Sectorial Dimensions
