

PMR Public Report

Operation Number	DR-L1067	Chief of Operations Validation Date	10/29/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/28/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Strengthening of the Management for Results of the Sector Health in Dominican Republic	Loan Number	2973/OC-DR
Executing Agency	SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Team Leader	GONZALEZ ACERO, CAROLINA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Dominican Republic
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1067	146,000,000	143,622,589.21	0	0	146,000,000	143,622,589.21	143,324,248.06	99.79%	298,341.15
Aggregated	146,000,000	143,622,589.21	0	0	146,000,000	143,622,589.21	143,324,248.06	99.79%	298,341.15

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

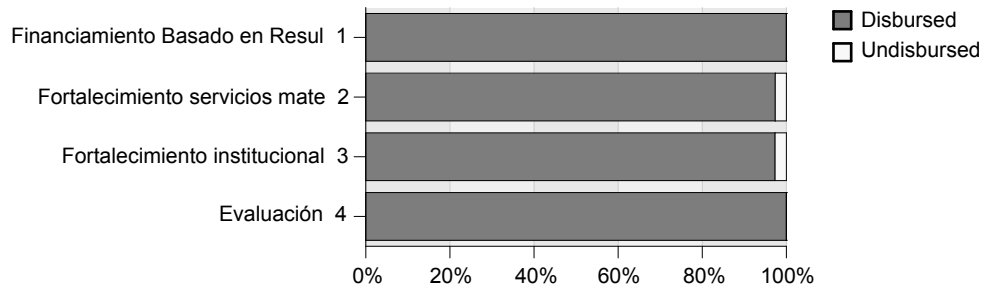

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Acceso de la población pobre a los servicios de salud mejorado y morbi-mortalidad materna e infantil disminuida

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Población pobre I-II (SIUBEN) no cubierta por ningún régimen con acceso garantizado a los servicios de salud primer nivel a través del FBR, en las cinco regiones de salud del Proyecto	Personas	0.00	2013	2019	P	288,100.00
						A	403,304.00

Details

Means of verification: Reportes de auditorias concurrentes

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Mortalidad materna disminuida en los seis hospitales en los que se implementará el Modelo de Centros de Excelencia CIME Materno Infantil (CEMI)	Porcentaje	155.00	2013	2019	P	30.00
						A	25.00

Details

Means of verification: Formulario EPI-2/Reportes SIGHO

Observations: The baseline will be calculated in 2015

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.3	Mortalidad infantil disminuida en los hospitales en que se implementará el CEMI	Porcentaje	24.00	2013	2019	P	30.00
						A	43.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

Details			
Means of verification: Formulario EPI-2/Reportes del SIGHO			
Observations: The baseline will be calculated in 2015			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			
	No		

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Mejorar la asignación del gasto en salud mediante la expansión del FBR, con especial énfasis en el primer nivel de atención

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Porcentaje de mujeres de mujeres embarazadas con evaluación de riesgo del embarazo realizada antes de la semana 15 de embarazo en las cinco regiones del Proyecto, aumentada	Porcentaje	2.98	2013	P		15.00	30.00	50.00			50.00
					A		15.00	28.76	62.70	48.07	0.00	42.15

Details

Means of verification: Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Observations: Cuatrimestral

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Porcentaje de mujeres púrpuras referidas del hospital a su unidad de atención primaria correspondiente con la documentación adecuada incluida en los archivos clínicos del centro de salud en las cinco regiones del Proyecto, aumentado.	Porcentaje	0.79	2013	P		20.00	30.00	60.00			60.00
					A		10.00	29.63	67.29	45.98	0.00	40.52

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Observations: Cuatrimestral

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Porcentaje de menores de 15 meses con esquema de vacunación completo según protocolo nacional en las cinco regiones del Proyecto, aumentado	Porcentaje	6.79	2013	P		20.00	30.00	60.00			60.00
					A		10.00	50.85	100.00	31.81	0.00	97.33

Details

Means of verification: Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Observations: Cuatrimestral

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Porcentaje de niños mayores de 15 meses y menores de 24 meses con esquema de vacunación completo según protocolo nacional en las cinco regiones del Proyecto, aumentado	Porcentaje	1.80	2013	P		20.00	30.00	60.00			60.00
					A		10.00	32.21	100.00	23.88	0.00	73.60

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details											
Means of verification: Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)											
Observations: Cuatrimestral											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Porcentaje de niños menores de 24 meses con controles de desarrollo y crecimiento completo según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.54	2013	P		20.00	30.00	60.00			60.00
					A		10.00	18.73	64.98	7.73	0.00	25.98

Details											
Means of verification: Reportes Sistema de Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)											
Observations: Cuatrimestral											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Porcentaje de individuos sintomáticos respiratorios captados con resultados de baciloscopia documentado en centro de primer nivel en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.81	2013	P		10.00	30.00	50.00			50.00
					A		10.00	30.85	100.00	38.52	0.00	32.98

Details											
Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Hombres mayores de 18 años tamizados para hipertensión arterial según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	12.44	2013	P		10.00	30.00	50.00			50.00
					A		10.00	46.01	50.21	49.25	0.00	37.62

Details											
Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)											
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity			No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Hombres diagnosticados con hipertensión arterial en tratamiento según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	2.51	2013	P		10.00	30.00	50.00			50.00
					A		10.00	15.12	37.33	11.01	0.00	37.60

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details												
Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)												
Pro-Gender		Yes				Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Hombres mayores de 18 años con tamizaje para diabetes según protocolo nacional (screening diabetes) en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.20	2013	P		10.00	30.00	50.00			50.00
					A		0.00	20.91	43.50	37.66	0.00	30.00
Details												
Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)												
Pro-Gender		Yes				Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Hombres diagnosticados con Diabetes tipo II en tratamiento según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	1.77	2013	P		10.00		50.00			50.00
					A		0.00	12.94	37.14	12.27	0.00	37.97
Details												
Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)												
Pro-Gender		Yes				Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Porcentaje de población SIUBEN I y II con carnets de afiliación al régimen subsidiado en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.00	2013	P		30.00		80.00			80.00
					A		0.00	0.00	0.00	42.67	0.00	42.67
Details												
Means of verification: Informes de empresa encargada de elaboración y entrega de carnets / reportes de auditorías concurrentes												
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.1	Cantidad de dependientes afiliados al régimen subsidiado que poseen información de acta de nacimiento en la base de datos de afiliados del SENASA en las cinco regiones del proyecto, aumentado.	Dependientes	0.00	2013	P		50,000.00		120,000.00			120,000.00
					A		0.00	0.00	0.00	323,610.00	0.00	323,610.00
Details												
Means of verification: Reporte de Base de Datos del SENASA												

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.2	Mujeres mayores de 18 años tamizadas para hipertensión arterial según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	5.68	2013	P		10.00	30.00	50.00			50.00
					A		10.00	0.00	76.15	79.68	0.00	79.68

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.2	Mujeres diagnosticadas con hipertensión arterial en tratamiento según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	1.16	2013	P		10.00		50.00			50.00
					A		10.00		71.40	20.19	0.00	20.19

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.2	Mujeres mayores de 18 años con tamizaje para diabetes según protocolo nacional (screening diabetes) en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.06	2013	P		10.00		50.00			50.00
					A		0.00	0.00	72.70	62.11	0.00	62.11

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
0.2	Mujeres diagnosticadas con Diabetes tipo II en tratamiento según protocolo nacional en las cinco regiones del proyecto, aumentado	Porcentaje	0.67	2013	P		10.00		50.00			50.00
					A		0.00	0.00	72.13	24.25	0.00	24.25

Details

Means of verification: Reportes Sistema Gestión Clínica Primer Nivel (SGC)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil mediante la expansión de una estrategia de mejoras gerenciales en los servicios de salud de segundo y tercer nivel

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
1.1	Hospitales con SIGHO implementado y en funcionamiento en los hospitales en que se implementará el CEMI.	Sistema	0.00	2013	P		3.00		9.00			12.00
					A		0.00		9.00	12.00	0.00	12.00

Details

Means of verification: Reportes anuales de evaluación emitidos por la Dirección de Tecnología de Información del MISPAS

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
1.1	Porcentaje de muertes maternas e incidentes auditados por los Comités de Maternidad Segura con al menos una de las medidas correctivas implementadas en los hospitales en que se implementará el CEMI.	Porcentaje	0.00	2013	P		30.00		95.00			95.00
					A		44.00		28.00	62.00	0.00	62.00

Details

Means of verification: Actas de las sesiones del Comité

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
1.1	Porcentaje de las muertes neonatales auditadas por los Comités de Maternidad Segura con al menos una de las medidas correctivas implementadas en los hospitales en que se implementará el CEMI.	Porcentaje	0.00	2013	P		30.00		95.00			95.00
					A		1.00		0.00	15.00	0.00	15.00

Details

Means of verification: Actas de las sesiones del Comité

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2019	2020	EOP 2020
1.1	Porcentaje de mujeres que reciben tratamiento activo de la tercera etapa del parto en los hospitales en que se implementará el CEMI, aumentado .	Porcentaje	0.00	2013	P		25.00		90.00			90.00
					A		59.00	0.00	82.00	88.00	0.00	88.00

Details

Means of verification: Reportes de Descripción de Parto obtenido en la primera etapa del registro físico de cada paciente, una vez implementado el SIGHO

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 I. Financiamiento de prestaciones basado en resultados (FBR) en salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2020	2021	EOP 2020
1.1	Población pobre SIUBEN 1 y 2 adscripta a un centro de atención primaria en las cinco regiones del proyecto aumentada	# of beneficiaries	P		1,448,100		130,000,000
			P(a)		1,448,100		129,806,815.76
			A		1,448,100	37,302.86	129,804,858.62

Component Nbr. 2 II. Calidad de los servicios de salud materno infantil fortalecida

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2020	2021	EOP 2020
2.1	Hospitales certificados como centros de excelencia materno-infantil (CEMI) aumentados	Hospitales	P		10		272,000
			P(a)		4		641,977.59
			A		0		641,750.59
2.2	Hospitales con infraestructura mejorada para proveer servicios de salud materno-infantil	Hospitales	P		6		3,178,100
			P(a)		4		2,391,800.71
			A		0		2,388,057.71
2.3	Hospitales con mobiliario y equipos mejorados para proveer servicios de salud materno-infantil	Hospitales	P		6		1,130,000
			P(a)		12		3,484,082.56
			A		0	1,864,694.33	3,309,450.89
2.4	Personal de salud de los hospitales en que se implementará el CEMI capacitado en programas Cuidados Obstétricos de Emergencia	Personas	P		200		2,415,999.98
			P(a)		205		217,695.53
			A		205		217,695.53
2.5	Personal de salud del área de perinatología de los hospitales en que se implementará el CEMI capacitado en sepsis neonatal	Personas	P		150		539,000
			P(a)		150		20,636.98
			A		150		20,636.98
2.6	Embarazadas vinculadas a los hospitales en que se implementara el CEMI capacitadas en sesiones de preparación al parto	Beneficiarias	P		50		1,122,000
			P(a)		50		7,805
			A		50		7,805

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 III. Función de rectoría del sector salud fortalecida

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2020	2021	EOP 2020
3.1	Plan decenal de salud 2016-2025 terminado	Plan	P		1		160,000
			P(a)		1		278,633.64
			A		1		278,633.64
3.2	Función de análisis de monitoreo y evaluación del desempeño del MISPAS fortalecida	Unidad	P		1		150,000
			P(a)		1		179,872.43
			A		1	9,334.64	193,785.13
3.3	Fortalecimiento de la Dirección de Habilitación	Normas	P		1		30,000
			P(a)		1		60,308.67
			A		1		60,308.67
3.4	Normas nacionales para la regulación del sector salud elaboradas	Normas	P		1		70,000
			P(a)		2		64,210.8
			A		2		66,319.7
3.5	Expediente Integrado de Salud implementado	Sistema	P		1		3,000,000
			P(a)		1		2,451,610.63
			A		0		2,451,663.41
3.6	Red Nacional de Sangre en funcionamiento	Red	P		0		0
			P(a)		1		895,988.26
			A		0	289,079.26	853,630.52
3.7	Pruebas realizadas en el laboratorio nacional para fortalecer diagnóstico de Covid-19	Pruebas	P		0		0
			P(a)		100,000		1,521,026
			A		0		0

Component Nbr. 4 IV. Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2020	2021	EOP 2020
4.1	Evaluación del Programa	Evaluación	P		1		50,000
			P(a)		1		33,000
			A		1		33,000

Other Cost

	Contratación personal UCP	P				2,525,702.03
		P(a)				1,474,331.2
		A			5,938.05	1,482,646.51
	Gerentes de Campo FBR (Componente I)	P				400,300
		P(a)				313,608.53
		A				313,608.53
	Gerentes de Campo CEMI (Componente II)	P				351,000
		P(a)				765,693.36
		A				749,843.2
	Gastos operativos visitas a regiones de salud para la implementación del FBR (Componente I)	P				178,000
		P(a)				23,205.97
		A				23,205.97
	Gastos operativos visitas a hospitales (Componente II)	P				120,000
		P(a)				77,900.55
		A				43,968.97
	Adquisición de vehículos para apoyo a las regiones en la implementación del FBR (Componente I)	P				60,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Adquisición de vehículos para apoyo a las regiones en la implementación del FBR (Componente I)	P(a)				39,218.43
		A				39,218.43
	Adquisición de vehículos para apoyo a las regiones en la implementación del CEMI (Componente II)	P				60,000
		P(a)				39,218.43
		A				39,218.43
	Readecuación física oficina UCP	P				0
		P(a)				285,167.44
		A				285,167.44

Total Cost

	Total Cost	P				146,000,000
		P(a)				145,073,808.47
		A			2,206,349.14	143,304,473.87

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Materialized		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Materialized		Governance Framework
	Response actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Materialized		Development
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Materialized		Organizational Structure
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Materialized		Fiduciary
	Response actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Materialized		Fiduciary
	Response actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	
7	Materialized		Goods, and Services
	Response actions		
	7.0	Management Strategy	Status
		-	
8	Materialized		Fiduciary
	Response actions		
	8.0	Management Strategy	Status
		-	
9	Materialized		Macroeconomic and Fiscal Sustainability
	Response actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	
10	Materialized		Human Resources
	Response actions		
	10.0	Management Strategy	Status
		-	

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Materialized		Governance Framework
	Response actions		
	11.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Materialized		Development
	Response actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Materialized		Planning
	Response actions		
	13.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Materialized		Fiduciary
	Response actions		
	14.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Materialized		Systems
	Response actions		
	15.0	Management Strategy	Status
		-	

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
16	Materialized		Environmental and Social Safeguards
	Response actions		
	16.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
17	Materialized		Goods, and Services
	Response actions		
	17.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Materialized		Development
	Response actions		
	18.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
19	Materialized		Planning
	Response actions		
	19.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
20	Materialized		Governance Framework
	Response actions		
	20.0	Management Strategy	Status
		-	

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Materialized		Planning
	Response actions		
	21.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
22	Materialized		Goods, and Services
	Response actions		
	22.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
23	Materialized		Development
	Response actions		
	23.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Materialized		Development
	Response actions		
	24.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
25	Materialized		Development
	Response actions		
	25.0	Management Strategy	Status
		-	

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
26	Materialized		Political Environment
	Response actions		
	26.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Materialized		Political Environment
	Response actions		
	27.0	Management Strategy	Status
		-	

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Fiduciary Dimensions
