

PMR Public Report

Operation Number	CO-L1245	Chief of Operations Validation Date	10/24/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	10/27/21
Last Update	10/01/21	Country Representative Validation Date	11/09/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support the Modernization of the National Tax and Customs Directorate	Loan Number	5148/OC-CO
Executing Agency	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE COLOMBIA	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REVENUE ADMINISTRATION
Team Leader	RASTELETTI, ALEJANDRO GABRIEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	FONDO DIAN PARA COLOMBIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1245	250,000,000	250,000,000	0	0	250,000,000	250,000,000	300,000	0.12%	249,700,000
Aggregated	250,000,000	250,000,000	0	0	250,000,000	250,000,000	300,000	0.12%	249,700,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

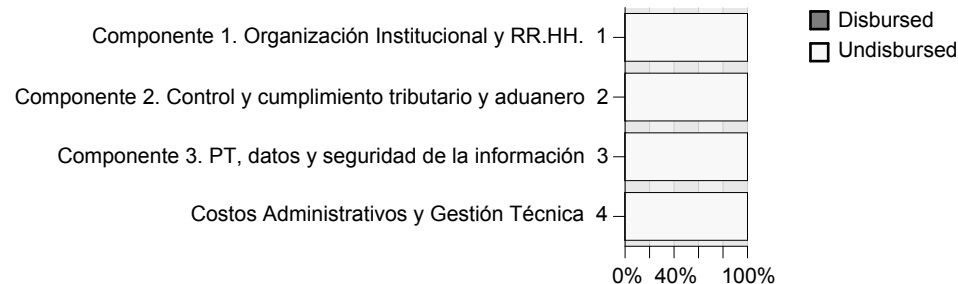

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Incremento de la Recaudación Tributaria y Aduanera del Gobierno Central como Porcentaje del PIB

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Fórmula de cálculo: Ingresos tributarios / PIB.	%	14.00	2019	2026	P	14.50
						A	

Details

Means of verification: Informe de recaudación tributaria de la DIAN reportado por la Dirección de Gestión de Ingresos (DGI) / Dirección de Gestión de Impuestos (DGI)

Observations: Ingresos tributarios netos recaudados por la DIAN/ PIB

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejora en la eficacia de la gestión tributaria y aduanera, a través del nuevo modelo de gobernanza institucional

Observation: Documento con ajustes a la MDR entre aprobación y arranque en EZSHARE-185720769-5 e EZSHARE-185720769-6.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	1.1 Metas estratégicas alcanzadas / Total de metas estratégicas definidas	%	40.00	2019	P	40.00	40.00	40.00	70.00	80.00
					A					

Details

Means of verification: Informe de la Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica (DGEA)

Observations: FC: Metas estratégicas alcanzadas / Total de metas estratégicas definidas *Metas estratégicas: Corresponden al número de indicadores estratégicos de la DIAN reportados en SINERGIA (Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados del Departamento Nacional de Planeación DNP) que cumplieron la meta anual establecida para cada uno de estos indicadores. *Total de metas estratégicas: Número de indicadores estratégicos de la DIAN reportados en SINERGIA. El indicador se calcula a partir de la información reportada en SINERGIA, en el cual se reportan cuatrienalmente los compromisos estratégicos que tienen la DIAN con el Plan Nacional de Desarrollo, para cada período de gobierno.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.1	1.2 Trabajadores capacitados / Total trabajadores de la DIAN	%	0.00	2020	P	0.00	30.00	20.00	20.00	10.00
					A					0.00

Details

Means of verification: Reporte de la DGC

Observations: FC: Trabajadores capacitados / Total de trabajadores de la DIAN. La meta final es el resultado de la suma acumulada de los funcionarios capacitados anualmente. * Trabajadores capacitados: Corresponde a la suma de los funcionarios de la entidad (de carrera, de libre nombramiento y provisionales) que reciben capacitación en los procesos de transformación del talento humano y modernización institucional desarrollados en el marco del Programa, relacionados principalmente con la gestión del cambio, nueva cultura institucional en el marco de la transformación digital, planeación estratégica, gestión por procesos, procesos Tributario, Aduanero y Cambiario y en temas relacionados con los Proyectos Estratégicos de Transformación Digital (Nuevo Sistema de Gestión Tributario y Aduanero, Servicios Compartidos y Repositorio Único de datos) y seguridad de la información. * Total de trabajadores de la DIAN a capacitar: Corresponde al total de funcionarios de la DIAN. (10.833 personas a agosto de 2021)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	1.3 Contribuyentes (Personas Naturales) registrados en el RUT / Población Económicamente Activa (PEA)	%	61.80	2019	P	65.20	67.00	68.00	69.00	70.00
					A					

Details

Means of verification: Reporte de la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente de la DIAN de la DGI

Observations: FC: Personas naturales contribuyentes registradas en el RUT / PEA Contribuyentes *(Personas Naturales) registrados en el RUT: Personas naturales colombianas y extranjeros residentes registrados en el Registro Único Tributario RUT. *Población económicamente activa (PEA): corresponde al número de personas naturales tanto ocupadas como desocupadas según fuente de información del DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.3	1.4 Número de declaraciones a tiempo en el Régimen de Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídicas (ISRPJ) / Total de declaraciones esperadas en el ISRPJ	%	81.50	2019	P	77.90	80.20	82.00	83.40	84.00	84.00
					A						

Details

Means of verification: Reporte de la Dirección de Gestión de Ingresos (DGI)

Observations: FC: Número de declaraciones a tiempo en el ISRPJ de personas jurídicas / Total de declaraciones esperadas en el ISRPJ. *Declaraciones a tiempo en el Régimen de Impuesto sobre la Renta de personas jurídicas: se calcula teniendo en cuenta las fechas de vencimiento, de acuerdo con el calendario tributario. Se toma como declaraciones presentadas a tiempo, todas aquellas para las cuales la fecha de presentación de la declaración es menor o igual a la fecha de vencimiento. *Declaraciones esperadas en el ISRPJ: a partir de la información de Confecámaras (empresas nuevas inscritas en el registro mercantil y tasa de supervivencia, así como un estimado de ingresos brutos), se calcula el número esperado de declaraciones esperadas.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.4	1.5 Número de auditorías efectivas / Total de auditorías realizadas	%	57.00	2019	P	58.00	59.00	61.00	63.00	65.00	65.00
					A						

Details

Means of verification: Reporte de la Dirección de Gestión de Fiscalización (DGF)

Observations: FC: Número de auditorías efectivas / Total de auditorías realizadas. *Auditorías efectivas: Auditoría que finaliza con una corrección de la declaración auditada o con un acto administrativo. *Auditorías realizadas: Número total de investigaciones (auditorías) tributarias, aduaneras, cambiarias e internacionales realizadas.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.5	1.6 Número de operaciones de importación con hallazgos / Total de operaciones de importación seleccionadas para control físico	%	8.40	2019	P	8.40	9.70	12.00	20.00	30.00	30.00
					A						

Details

Means of verification: Reportes de la Dirección de Gestión de Aduanas (DGA)

Observations: FC: Número de operaciones de importación con hallazgos / Total de operaciones de importación seleccionadas para control físico. *Operaciones de importación que presentaron hallazgos: en el control físico, donde se identificó incumplimiento de los requisitos legales (formalidades aduaneras y/o de comercio exterior) necesarios para la correcta ejecución y finalización de las operaciones aduaneras. *Total de operaciones de importación seleccionadas para control físico: corresponde al total de operaciones de importación seleccionadas diariamente por el sistema informático aduanero, con base en los criterios establecidos por el área de riesgo.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejora en la eficiencia de la gestión tecnológica de la DIAN

Observation: Documento con ajustes a la MDR entre aprobación y arranque en EZSHARE-185720769-5 e EZSHARE-185720769-6.

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

		Measure		Year							
2.0	2.1 Tiempo de desaduanamiento de mercancías de importación	Horas	22.00	2019	P	21.00	19.00	18.00	17.00	16.00	16.00
					A						

Details

Means of verification: Reportes de la Dirección de Gestión de Aduanas (DGA)

Observations: FC: Horas promedio calculado entre la aceptación de la declaración de importación y el levante de la mercancía

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.1	2.2 Índice de disponibilidad de la plataforma tecnológica	%	99.75	2019	P	99.80	99.82	99.85	99.87	99.90	99.90
					A						

Details

Means of verification: Reporte de la Subdirección de Operaciones (DGIT)

Observations: FC: El indicador mide el promedio total del índice mensual de disponibilidad de la plataforma tecnológica. La disponibilidad propiamente dicha, es el cociente entre Horas disponibles en el mes y el Total de horas al mes.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.2	2.3 Tiempo promedio de desarrollo in-house de aplicaciones digitales	Días	365.00	2019	P	365.00	365.00	250.00	250.00	180.00	180.00
					A						

Details

Means of verification: Reporte de la Subdirección de Soluciones y Desarrollo (DGIT)

Observations: El indicador mide el promedio del tiempo transcurrido entre la aprobación del requerimiento funcional y la aceptación de recepción del producto por el usuario.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Organización Institucional y RR.HH.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
1.1	1.1.1 Modelo de Planeación estratégica y de gestión de procesos fortalecido	Modelo	P	0	2	25,000	3,558,000
			P(a)	0	2	25,000	3,558,000
			A	0	0	0	0
1.2	1.1.2 Plan anual de gestión del cambio y de la nueva cultura institucional ejecutado	Plan	P	0	4	0	1,250,000
			P(a)	0	4	0	1,250,000
			A	0	0	0	0
1.3	1.1.3 Sedes de la DIAN para la atención de contribuyentes modernizadas	Sedes	P	0	25	4,583.33	8,186,324
			P(a)	0	25	4,583.33	8,186,324
			A	0	0	0	0
1.4	1.1.4 Plan de comunicación integral para la transformación institucional interno y externo ejecutado	Plan	P	0	2	0	2,850,000
			P(a)	0	2	0	2,850,000
			A	0	0	0	0
1.5	1.2.1 Plan anual de fortalecimiento de la gestión del Talento Humano ejecutado	Plan	P	0	4	40,494	5,192,000
			P(a)	0	4	40,494	5,192,000
			A	0	0	1,386	1,386
1.6	1.2.2 Plan anual de fortalecimiento de la Escuela de Altos Estudios de la DIAN ejecutado	Plan	P	0	4	0	5,124,142
			P(a)	0	4	0	5,124,142
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Control y cumplimiento tributario y aduanero

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
2.1	2.1.1 Modelo de gestión de riesgos de cumplimiento Tributario, Aduanero y Cambiario implementado	Modelo	P	0	1	15,867	2,326,000
			P(a)	0	1	15,867	2,326,000
			A	0	0	0	0
2.2	2.1.2 Modelo para el fortalecimiento de la Gestión de Ingresos implementado	Modelo	P	0	3	38,888.92	5,470,000
			P(a)	0	3	38,888.92	5,470,000
			A	0	0	0	0
2.3	2.1.3 Modelo de Fiscalización Tributario, Aduanero y Cambiario intensivo y extensivo implementado	Modelo	P	0	1	0	710,211
			P(a)	0	1	0	710,211
			A	0	0	0	0
2.4	2.2.1 Modelo de Gestión y control del movimiento de carga con uso de nuevas tecnologías implementado	Modelo	P	0	1	0	2,729,000
			P(a)	0	1	0	2,729,000
			A	0	0	0	0
2.5	2.2.2 Plan de fortalecimiento del Centro de monitoreo y control de carga y pasajeros implementado	Plan	P	0	1	0	5,755,500
			P(a)	0	1	0	5,755,500
			A	0	0	0	0
2.6	2.2.3 Plan de modernización de los procesos y la infraestructura física y tecnológica de puertos, aeropuertos y pasos de frontera implementado	Plan	P	0	1	19,666.67	3,960,500
			P(a)	0	1	19,666.67	3,960,500
			A	0	0	0	0
2.7	2.2.4 Sistema de apoyo a las verificaciones de usuario objeto de autorizaciones, habilitaciones y calificaciones incluyendo el Programa de Operador Económico Autorizado (OEA) implementado	Sistema	P	0	1	0	73,000
			P(a)	0	1	0	73,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. PT, datos y seguridad de la información

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
3.1	3.1.1 Plan anual Estratégico de Tecnología de la Información actualizado	Plan	P	0	4	136,666.67	444,400
			P(a)	0	4	136,666.67	444,400
			A	0	0	0	0
3.2	3.1.2 Plataforma Tecnológica implementada	Solución	P	0	1	14,583.24	11,372,700
			P(a)	0	1	14,583.24	11,372,700
			A	0	0	0	0
3.3	3.1.3 Plan de implementación anual de la Plataforma Tecnológica ejecutado	Plan	P	0	4	0	71,001,666.5
			P(a)	0	4	0	71,001,666.5
			A	0	0	0	0
3.4	3.1.4 Sistema integrado de gestión tributaria, de gestión aduanera, servicios compartidos y servicios digitales implementado	Software	P	0	1	0	8,480,760
			P(a)	0	1	0	8,480,760
			A	0	0	0	0
3.5	3.1.5 Plan anual de implementación del NSGT, del NSGA y de SC ejecutado	Plan	P	0	4	0	74,000,000
			P(a)	0	4	0	74,000,000
			A	0	0	0	0
3.6	3.1.6 Modelo de gobernanza de datos implementado	Modelo	P	0	1	0	1,060,000
			P(a)	0	1	0	1,060,000
			A	0	0	0	0
3.7	3.1.7 Arquitectura de datos y repositorio único de activos de información implementados	Arquitectura y Solución	P	0	2	45,166.75	1,758,333.5
			P(a)	0	2	45,166.75	1,758,333.5
			A	0	0	0	0
3.8	3.1.8 Plan anual de implementación del Repositorio Único de datos ejecutado	Plan	P	0	4	0	5,000,000
			P(a)	0	4	0	5,000,000
			A	0	0	0	0
3.9	3.1.9 Plan anual de fortalecimiento del Centro de Gestión de Proyectos de Innovación y Tecnología ejecutado	Plan	P	1	5	77,500	1,313,740
			P(a)	1	5	77,500	1,313,740
			A	0	0	0	0
3.10	3.2.1 Marco conceptual y normativo de seguridad de la información implementado	Modelo	P	0	1	0	500,000
			P(a)	0	1	0	500,000
			A	0	0	0	0
3.11	3.2.2 Sistema de control de acceso implementado	Solución	P	0	1	0	1,000,000
			P(a)	0	1	0	1,000,000
			A	0	0	0	0
3.12	3.2.3 Sistema de control de identidades implementado	Solución	P	0	1	0	3,300,000
			P(a)	0	1	0	3,300,000
			A	0	0	0	0
3.13	3.2.4 Sistema de protección de Datos implementado	Solución	P	0	1	0	3,500,000
			P(a)	0	1	0	3,500,000
			A	0	0	0	0
3.14	3.2.5 Centro de Operación de Seguridad para monitoreo y operación de los instrumentos de seguridad de la información implementado	Solución	P	0	1	0	2,000,000
			P(a)	0	1	0	2,000,000
			A	0	0	0	0
3.15	3.2.6 Plan de operación anual del SOC ejecutado	Plan	P	0	3	0	8,000,000
			P(a)	0	3	0	8,000,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
3.15	3.2.6 Plan de operación anual del SOC ejecutado	Plan	A	0	0	0	0

Other Cost

	Gastos de Administración y Gestión	P			602,499.67	10,083,723
		P(a)			602,499.67	10,083,723
		A			160,594.41	160,594.41

Total Cost

	Total Cost	P			1,020,916.25	250,000,000
		P(a)			1,020,916.25	250,000,000
		A			161,980.41	161,980.41

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Internal Processes
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Internal Processes
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Internal Processes
	Response actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Sustainability
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Internal Processes
	Response actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Internal Processes
	Response actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Internal Processes
	Response actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section
