

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	PE-L1159	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/20/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/13/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Improvement of Foreign Trade Facilitation Services Through the Single Window(VUC	<b>Loan Number</b>	3546/OC-PE
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	<b>Sector/Subsector</b>	TRADE-TRADE FACILITATION, TRADE LOGISTICS AND CUSTOMS
<b>Team Leader</b>	LUCENTI, KRISTA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Peru
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DEL PERU		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1159	20,000,000	20,000,000	42,700,000	0	62,700,000	20,000,000	11,710,000	58.55%	8,290,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	42,700,000	0	62,700,000	20,000,000	11,710,000	58.55%	8,290,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

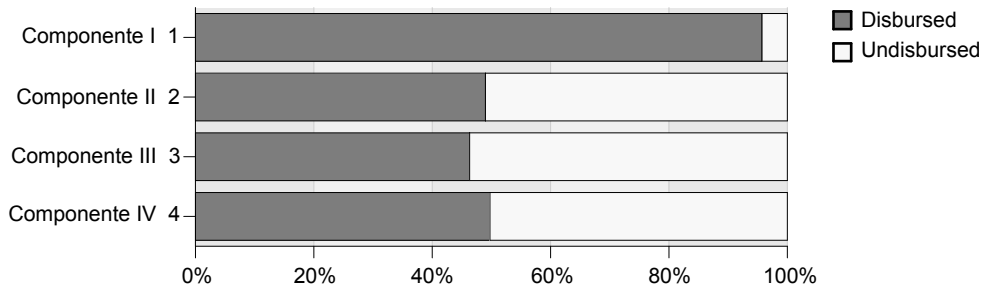

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 0:** Mejorar la competitividad del sector transable a través de la reducción de costos de transacción asociados al comercio exterior

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Ranking "Trading accross borders", Doing Business Report, Banco Mundial	Posición en el ranking "Trading accross borders", Doing Business Report, Banco Mundial	88.00	2016	2015	P	85.00
						A	0.00

#### Details

**Means of verification:** Medición 2021 Doing Business

**Pro-Gender** No

**Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

No

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Reducción del número de días promedio para la tramitación de las operaciones de comercio exterior

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Número de días promedio para llevar a cabo los trámites y permisos en la VUCE	días promedio de tramitación	12.67	2016	P		10.67		10.67
					A				
Details									
Means of verification: Datos de extraídos de la VUCE									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No		

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Reducción a los costos logísticos promedio en las operaciones de comercio exterior

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Índice de desempeño logístico, Banco Mundial	Posición en el ranking Índice de desempeño logístico, Banco Mundial	80.00	2016	P		77.00		77.00
					A				
Details									
Means of verification: Estudio Banco Mundial									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente I: Simplificación de los procesos y procedimientos de comercio exterior

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.1	Nuevo flujograma de procesos de comercio exterior consensuado con las entidades involucradas	Flujograma	P		1		3,170,000
			P(a)	0	1	0	2,439,999.95
			A	0	1	0	2,422,080.05
1.2	Reporte sobre Talleres de Trabajo	Talleres	P		3		30,000
			P(a)	0	4	0	8,620.79
			A	0	4	0	8,620.79
1.3	Reporte sobre Homologación de datos	Reporte	P		1		500,000
			P(a)	0	1	0	266,000
			A	0	1	0	263,538.7
1.4	Instrumentos de control y manejo de riesgos diseñados e implementados en las entidades de control	Entidades	P	6	6		400,000
			P(a)	0	6	0	400,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Componente II: Diseño y puesta en marcha de la VUCE 2.0

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.1	Nueva plataforma tecnológica de la VUCE 2.0 en funcionamiento, incorporando nuevas y modernas funcionalidades	Plataforma VUCE	P	1	1	2,645,000	19,152,000
			P(a)	0.3	1	3,650,729.14	23,425,415.38
			A	0	0	959,725	4,801,747.97
2.2	Reporte sobre infraestructura de hardware para la VUCE 2.0	Reporte	P		1		2,745,000
			P(a)	0	1	384,732.1	3,145,640.01
			A	0	0	79,045.9	1,633,934.81
2.3	Entidades de control que cuentan con nueva infraestructura de software y hardware necesaria para integrarse a la VUCE 2.0	Entidades	P	8	8	317,000	6,603,000
			P(a)	3	8	3,252,574.34	7,036,367.52
			A	6	6	1,375,642.8	3,914,110.88
2.4	Interoperabilidad con VUCE de otros países en funcionamiento	Países con los que se interopera	P		3		500,000
			P(a)	0	3	13,191.78	49,836.71
			A	0	3	4,417.2	25,281.33
2.5	Reporte sobre el Sistema de información de las zonas de tratamiento especial diseñado y en funcionamiento	Reporte	P		1		500,000
			P(a)	0	1	463,988.01	1,617,795.11
			A	0	0	255,617.6	307,081

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Componente III: Servicios de información para el comercio exterior

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
3.1	Sistemas de información sobre servicios logísticos y de comercio exterior (portal especializado logístico, sistema de trazabilidad fitosanitaria, sistema de regulaciones de comercio exterior, sistema Penx, sistema de Marketplace) diseñados y en funcionamiento	Sistemas	P	3	5	540,000	6,900,000
			P(a)	2	5	830,542.36	6,521,982.62
			A	0	0	272,158.5	1,086,391.16
3.2	Sistema de comunidad portuaria del Callao en funcionamiento	Plataforma	P	1	1	400,000	3,250,000
			P(a)	0	1	457,734.74	5,623,348.66
			A	0	0	393,215.2	1,176,253.72
3.3	Reporte sobre el Sistema de información de inteligencia comercial	Reporte	P		1	600,000	5,250,000
			P(a)	0	1	143,192.37	1,972,928.16
			A	0	0	16,155.2	482,228.19
3.4	Reporte sobre Sistemas para empresas implementados	Reporte	P	1	1	900,000	3,100,000
			P(a)	0	1	7,767.09	887,228.83
			A	0	0	2,502.4	71,608.04
3.5	Programas de e-learning de capacitación a usuarios privados y entidades de control implementados	Programas	P	5	5	275,000	1,200,000
			P(a)	2	5	37,767.09	766,228.59
			A	0	0	2,282.5	2,282.5

## Component Nbr. 4 Componente IV: Transferencia de conocimiento y gestión del cambio

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
4.1	Estrategias iniciadas de transferencia de conocimiento y mejores prácticas	Estrategias	P		4	250,000	1,500,000
			P(a)	0	5	252,668.81	930,427.49
			A	0	5	11,088.5	224,529.38
4.2	Estrategias implementadas de gestión del cambio	Estrategias	P	2	3	400,000	1,900,000
			P(a)	1	3	192,308.99	1,608,180.07
			A	0	1	46,914.1	194,215.28

## Other Cost

Gestión del Proyecto: Unidad de Gestión	P			790,000	3,950,000
	P(a)			516,113.56	3,400,000.05
	A			232,756.6	2,117,903.39
Gestión del Proyecto: Adecuación física para la Unidad Ejecutora	P			60,000	300,000
	P(a)			144,144.61	1,650,000
	A			136,289.8	1,207,822.09
Gestión del Proyecto: Evaluaciones	P			200,000	600,000
	P(a)			27,105.35	450,000.01
	A			6,747.8	26,394.43
Gestión del Proyecto: Auditorías	P			70,000	350,000
	P(a)			84,582.4	500,000.05
	A			42,219.2	261,370.75

## Total Cost

Total Cost	P			7,447,000	61,900,000
	P(a)			10,459,142.74	62,700,000
	A			3,836,778.3	20,227,394.46

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Entidades de control que cuentan con nueva infraestructura de software y hardware necesaria para integrarse a la VUCE 2.0	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CJMARTINEZ	10/01/2021
	Estrategias implementadas de gestión del cambio	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CJMARTINEZ	10/01/2021
	Estrategias iniciadas de transferencia de conocimiento y mejores prácticas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CJMARTINEZ	10/01/2021
	Interoperabilidad con VUCE de otros países en funcionamiento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CJMARTINEZ	10/01/2021
	Nueva plataforma tecnológica de la VUCE 2.0 en funcionamiento, incorporando nuevas y modernas funcionalidades	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CJMARTINEZ	10/01/2021
	Programas de e-learning de capacitación a usuarios privados y entidades de control implementados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CJMARTINEZ	10/01/2021
	Reporte sobre Homologación de datos	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CJMARTINEZ	10/01/2021
			Modify Physical Historical Actual	CJMARTINEZ	10/01/2021
	Reporte sobre Sistemas para empresas implementados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CJMARTINEZ	10/01/2021
	Reporte sobre el Sistema de información de inteligencia comercial	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CJMARTINEZ	10/01/2021
	Reporte sobre el Sistema de información de las zonas de tratamiento especial diseñado y en funcionamiento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CJMARTINEZ	10/01/2021
	Reporte sobre infraestructura de hardware para la VUCE 2.0	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CJMARTINEZ	10/01/2021
	Sistema de comunidad portuaria del Callao en funcionamiento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CJMARTINEZ	10/01/2021
	Sistemas de información sobre servicios logísticos y de comercio exterior (portal especializado logístico, sistema de trazabilidad fitosanitaria, sistema de regulaciones de comercio exterior, sistema Penx, sistema de Marketplace) diseñados y en funcionamiento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CJMARTINEZ	10/01/2021

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		SHARE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Political Environment
	Response actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Natural Environment
	Response actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		SHARE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Internal Processes
	Response actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE



# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
Intra/Inter Coordination
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Project Management Capacity
Stakeholder Priorities
