

PMR Public Report

Operation Number	PE-L1228	Chief of Operations Validation Date	10/20/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Create Integrated Health Networks	Loan Number	4726/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	SORIO, RITA ELIZABETH	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Las obras del programa aún no han comenzado. Desde la misión previa, se han desarrollado algunos instrumentos de gestión socio ambiental para proyectos fuera de la muestra, en concordancia al MGAS aprobado, tal como ha sido requerido como condición contractual. A la fecha no existen instrumentos pendientes de finalización.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1228	125,000,000	125,000,000	32,825,000	0	157,825,000	125,000,000	5,269,204	4.22%	119,730,796
Aggregated	125,000,000	125,000,000	32,825,000	0	157,825,000	125,000,000	5,269,204	4.22%	119,730,796

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

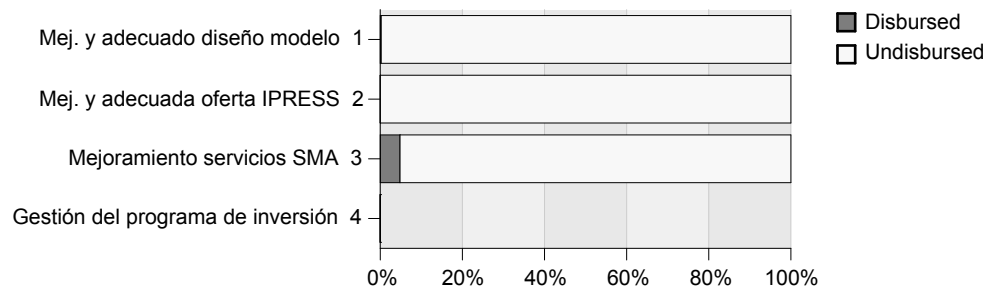

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Calidad de los servicios en el primer nivel de atención mejorada

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.3	Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria–total	Porcentaje	29.00	2017	2024	P	24.60
						A	

Details

Means of verification: Registros Administrativos SIS - MINSA

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria– hombres (Seguimiento de género)				P	36.50
					A	
	Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria– mujeres (Seguimiento de género)				P	23.60
					A	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.4	Tasa de mortalidad por servicios de salud de baja calidad	Porcentaje	20.80	2017	2024	P	17.50
						A	

Details

Means of verification: Centro Nacional de Epidemiología,Prevención y Control de las Enfermedades (MINSA)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Capacidades de oferta de servicios de salud mejoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.1	Porcentaje de mujeres de 30 a 59 años que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado	%	88.10	2017	P			92.00
					A			
Details								
Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.2	Porcentaje de personas de 40 a 59 años que se han realizado un chequeo para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses	%	34.60	2017	P			38.00
					A			
Details								
Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.3	Porcentaje de personas que han donado sangre de manera voluntaria	%	5.36	2017	P			8.00
					A			
Details								
Means of verification: PRONAHEBAS (MINSA)								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.4	Porcentaje de despachos de ambulancia requeridos y no atendidos	%	46.00	2017	P			41.00
					A			
Details								
Means of verification: Registros Administrativos - SAMU (MINSA)								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

1.5	Porcentaje de personas de 15 años o más con diagnóstico de diabetes mellitus que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses	%	71.54	2017	P			74.50
					A			
Details								
Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.6	Porcentaje de personas de 15 años o más con diagnóstico de hipertensión que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses	%	62.30	2017	P			70.00
					A			
Details								
Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.6	Beneficiarios que reciben servicios de salud	# of beneficiaries	2,850,000.00	2017	P			3,049,000.00
					A			
Details								
Means of verification: RESULTA (MEF) - ENDES E INEI								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.7	Porcentaje de usuarios de consulta externa que se sintieron "satisfechos" o "muy satisfechos" con la atención recibida	%	78.80	2016	P			84.00
					A			
Details								
Means of verification: Encuesta Nacional de Satisfaccion de usuarios de salud - SUSALUD								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.8	Porcentaje de usuarios de consulta externa que calificaron el tiempo de espera para la atención en el establecimiento de salud con una evaluación de 6 o más (en escala de 1 a 10)	%	77.20	2016	P			83.50
					A			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details			
Means of verification: Encuesta Nacional de Satisfaccion de usuarios de salud - SUSALUD			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejoramiento y adecuado diseño del modelo de organización de IPRESS en las Redes Integradas de Salud (RIS)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
1.1	Modelo de atención con énfasis en el nuevo patrón de carga de enfermedad rediseñado	Modelo	P		1	26,102	339,595
			P(a)		1		339,595
			A	0	0	0	0
1.2	Guías clínicas y protocolos de atención a enfermedades crónicas no transmisibles diseñados: diabetes, cáncer de mama, enfermedades mentales, hipertensión	Protocolos	P	12	17	349,342	545,013
			P(a)	5	17	138,137	545,013
			A	4	4	70,149	80,596.76
1.3	Profesionales de salud (médicos, enfermeros) capacitados en la aplicación de guías clínicas y protocolos	Profesionales	P	800	1,600	240,596	461,045
			P(a)	250	1,600	75,186.25	461,045
			A	0	0	0	0
1.4	Modelos de organización, gestión y financiamiento de las redes integradas de salud elaborados	Modelo	P		1	2,468,354	7,033,701
			P(a)		1	581,947.2	7,033,701
			A	0	0	0	0
1.5	Plan de desarrollo de competencias de recursos humanos para actuación en red, elaborado y validado por el MINSA	Plan	P		1	311,310	834,692
			P(a)		1	317,898.6	834,692
			A	0	0	0	0
1.6	Guía de atención y manejo de casos de violencia en mujeres con enfoque de género revisado y fortalecido	Guía	P	1	1	50,598	50,598
			P(a)	1	1	50,598	50,598
			A	0	0	0	0
1.7	Estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo de atención para los actores del sistema, aprobada	Estrategia	P		1	176,057	624,934
			P(a)		1	279,690	624,934
			A	0	0	0	0
1.8	Talleres para sensibilización sobre atención y los Servicios Médicos de Apoyo (SMA) centralizados	Taller	P		25	13,673	453,937
			P(a)		25		453,937
			A	0	0	0	0
1.9	Estudios técnicos de redes elaborados	Informe	P	2	7	373,730	1,308,055
			P(a)	2	7		1,308,055
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Mejoramiento y adecuada oferta en las IPRESS en el Primero Nivel de Atención de Lima Metropolitana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
2.1	Establecimientos de salud 24 horas diseñados	Establecimiento de salud	P	5	5	4,689,612	4,689,612
			P(a)		5		4,689,612
			A	0	0	0	3,582.09
2.2	Establecimientos de salud 24 horas remodelados	Establecimiento de salud	P		5	6,798,091	39,494,271
			P(a)		5		39,494,271
			A	0	0	0	0
2.3	Establecimientos de salud 24 horas equipados	Establecimiento de salud	P		5		17,167,019
			P(a)		5		17,167,019
			A	0	0	0	0
2.4	Establecimientos de salud 24 horas operando	Establecimiento de salud	P		5		150,000
			P(a)		5		150,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejoramiento de los servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
3.1	Central de SMA, diseñada	Central	P	1	1	904,274	1,287,981
			P(a)		1	200,000	1,287,981
			A	0	0	0	0
3.2	Central de SMA, construida	Central	P		1	2,616,820	23,040,751
			P(a)		1		23,040,751
			A	0	0	0	0
3.3	Manual operativo con reglas de funcionamiento de la central de SMA elaborado	Manual operativo	P	1	2	100,000	420,002
			P(a)		2	100,000	420,002
			A	0	0	0	0
3.4	Central de SMA, equipamiento de laboratorio instalado	Equipamiento	P		1		9,098,132
			P(a)		1		9,098,132
			A	0	0	0	0
3.5	Central de SMA, equipamiento de lectura de imágenes instalado	Equipamiento	P		1		2,274,533
			P(a)		1		2,274,533
			A	0	0	0	0
3.6	Central de SMA, equipamiento de banco de sangre instalado	Equipamiento	P		1		6,823,599
			P(a)		1		6,823,599
			A	0	0	0	0
3.7	Central de SMA, equipamiento de atención prehospitalaria instalado	Equipamiento	P		1		1,137,267
			P(a)		1		1,137,267
			A	0	0	0	0
3.8	Central de SMA, equipamiento complementario instalado (cadena de frío, gases, etc.)	Equipamiento	P		1		3,411,800
			P(a)		1		3,411,800
			A	0	0	0	0
3.9	Diseño de los servicios de la central con sus protocolos funcionales de coordinación con la red completados	Protocolo	P		1		394,998
			P(a)		1		394,998
			A	0	0	0	0
3.10	Profesionales de SMA capacitados	Profesionales	P		65		913,001
			P(a)		65		913,001
			A	0	0	0	0
3.11	Puesta en marcha de la central de SMA	Central	P		1		200,000
			P(a)		1		200,000
			A	0	0	0	0
3.12	Campañas de sensibilización de la población sobre los SMA	Campañas de sensibilización	P		6	516,667	3,450,000
			P(a)		6	516,667	3,450,000
			A	0	0	0	0
3.13	Equipos médicos hospitalarios remplazados (7 tomógrafos, 1 resonador, 3 mamógrafos, 65 rayos x)	Equipos médicos	P	54	65	17,806,017	21,895,464
			P(a)	35	48	6,540,936.74	21,895,464
			A	20	26	3,050,296	6,869,307

Other Cost

	Gestión	P			2,078,777	8,575,000
		P(a)			700,000	8,575,000
		A			951,162	1,777,642
	Monitoreo y evaluación	P			375,000	1,500,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Monitoreo y evaluación	P(a)			375,000	1,500,000
		A			0	0
	Auditorias	P			62,500	250,000
		P(a)			112,500	250,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			39,957,520	157,825,000
		P(a)			9,988,560.79	157,825,000
		A			4,071,607	8,731,127.85

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Goods, and Services
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Goods, and Services
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Goods, and Services
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Goods, and Services
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	5.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
	5.3		
		Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Internal Processes
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
Intra/Inter Coordination
