

PMR Public Report

Operation Number	HO-L1195	Chief of Operations Validation Date	10/20/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/12/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to improve the management and quality of maternal-neonatal health services	Loan Number	4619/BL-HO
Executing Agency	AGENCIA ESTRATEGICA PARA EJECUCION PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES, MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	GODOY, HUGO DANILO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1195	69,000,000	69,000,000	0	0	69,000,000	69,000,000	26,000,000	37.68%	43,000,000
Aggregated	69,000,000	69,000,000	0	0	69,000,000	69,000,000	26,000,000	37.68%	43,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

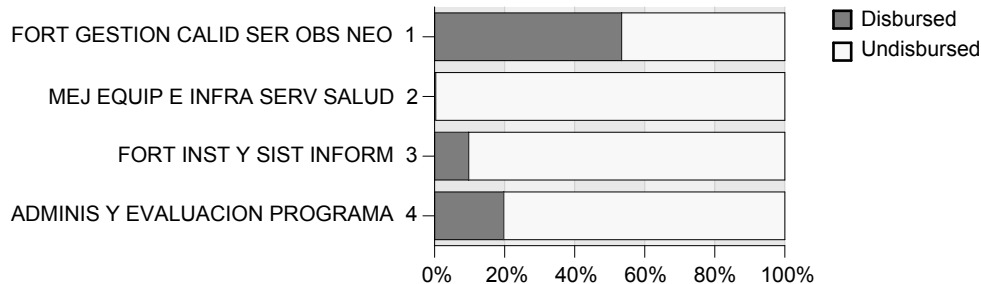

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Reducción de la mortalidad materna neonatal

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	RMM a nivel Nacional	Razón por 100.000 NV	61.00	2015	2024	P	49.00
						A	

Details

Means of verification: Estudio Ramos

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Tasa de letalidad neonatal por sepsis y asfixia en hospitales intervenidos	%	16.42	2019	2024	P	13.95
						A	

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Razón de muerte materna hospitalaria en los hospitales intervenidos	%	14.70	2015	2024	P	13.23
						A	

Details

Means of verification: Estudio Ramos

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development bjective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			
	No		

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Incremento de la Cobertura de atención materno neonatal con enfoque de atención primaria

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	% de captación de embarazadas antes de las 12 Semanas de Gestación en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas.	%	51.00	2019	P		61.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.2	Cobertura de atención prenatal con calidad, en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas.	%	24.00	2019	P		44.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.3	Cobertura de atención de parto por personal calificado en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas.	%	69.00	2010	P		79.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.4	Cobertura de atención a recién nacidos en los primeros tres días post parto en los últimos 12 meses, realizadas por los ESFAM y los Establecimientos de Salud	%	68.00	2019	P		83.00
					A		

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details							
Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto							
Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.5	Número de ESFAM conformados y funcionando en los Municipios priorizados no descentralizados.	numero	0.00	2019	P		20.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto							
Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.6	% de Redes priorizadas conformadas de acuerdo a seis atributos (asistenciales).	%	0.00	2019	P		100.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto							
Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejoramiento de la calidad de la atención hospitalaria de las complicaciones obstétricas neonatales							
Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	% de complicaciones obstétricas por Trastornos Hipertensivos del Embarazo y Hemorragia atendidas de acuerdo a la norma.	%	11.00	2019	P		41.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto							
Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.							

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.2	% de Complicaciones neonatales por Sepsis y asfixia, manejadas de acuerdo a la norma.	%	7.00	2019	P		27.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación final de desempeño del proyecto							
Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
1.1	Personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención, priorizando los municipios más pobres	# of beneficiaries	P	425,045	425,045	5,298,702	16,219,186
			P(a)	425,045	425,045	8,166,859	18,444,335
			A	425,045	0	2,950,437	13,227,913
1.2	Equipos de Salud Familiar (ESFAM) conformados en municipios priorizados	Equipos	P	10	20	750,000	1,500,000
			P(a)	13	20	1,243,260	1,474,500
			A	10	12	191,045	236,966
1.3	Convenios de Gestión del II nivel de atención firmados	Convenios de gestion Hospitalaria	P	3	9	1,336,690	7,434,693
			P(a)	3	8	1,671,846	3,442,601
			A	3	5	238,472	550,227
1.4	Convenios de Gestión a Hospitales para atención de la emergencia de COVID-19	Convenios gestion hospitalaria COVID	P		0		0
			P(a)	0	8	0	4,581,161
			A	0	8	0	4,581,161
1.5	Comités de Apoyo a Hospitales funcionando.	Convenios con comites de apoyo	P	5	6	306,946	1,158,440
			P(a)	5	6	146,121	1,040,561
			A	5	0	129,345	1,023,785
1.6	Hospitales con modelo de gestion y costeo fortalecido	Numero de hospitales	P	0	6	465,000	1,184,000
			P(a)	0	2	65,200	165,000
			A	0	0	15,009	40,124

Component Nbr. 2 Componente 2. Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
2.1	Bloque obstetrico Neonatal Hospital Occidente construido	Numero de hospitales con bloque obstetrico	P		0		0
			P(a)		1	0	18,560,960
			A		0	0	0
2.2	Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas.	Numero de unidades cuidados intensivos	P	0	5	6,783,390	24,221,301
			P(a)	0	4	1,563,958	5,936,000
			A	0	0	0	0
2.3	Unidades de cuidados intensivos UCIN para el cuidado neonatal y áreas de Obstetricia equipadas	Numero de unidades de cuidados intensivos	P	1	6	290,000	6,124,000
			P(a)	1	6	290,000	6,124,000
			A	0	0	0	0
2.4	Mecanismo de comunicación para el sistema de referencia en hospital occidente implementado.	Numero de hospitales	P	1	1	150,000	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	0	0	0
2.5	Diseño, estudio de preinversion y supervision de las Obras elaborados	Estudios realizados	P	1	3	653,072	2,064,130
			P(a)	1	3	417,221	2,064,130
			A	0	1	0	94,050

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnologicas y Sistema de Información

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
3.1	Regiones sanitarias fortalecidas	numero de regiones sanitarias	P	6	6	270,000	540,000
			P(a)	6	6	172,500	538,637
			A	5	5	75,000	232,161
3.2	Expediente electronico y Sistema de Información en hospitales implementado	Hospital	P	0	1	0	3,000,000
			P(a)	0	1	0	2,000,000
			A	0	0	0	0
3.3	Departamento de Hospitales fortalecido en gestion de procesos y de gestores descentralizados hospitalarios.	numero de consultorias	P	0	5	360,000	835,000
			P(a)	0	5	211,000	487,000
			A	0	0	30,000	90,000
3.4	Departamentos y unidades del nivel central de la SESAL fortalecidos en el modelo de gestion descentralizado	Numero de consultorias	P	2	9	603,150	1,349,250
			P(a)	2	9	888,494	1,537,341
			A	2	7	74,261	493,654
3.5	Plan Maestro de Inversion Hospitalario en Honduras elaborado	Documento	P	1	1	1,080,000	1,200,000
			P(a)	0	1	0	483,774
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Componente 4: Administración y Evaluación del Programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
4.1	Evaluacion de Linea Base y Evaluación Operativa elaborado	Evaluacion	P	0	2	0	300,000
			P(a)	1	2	100,000	300,000
			A	0	0	4,000	4,000
4.2	Estudio Ramos elaborado	Estudio	P	0	1	0	70,000
			P(a)	0	1	0	70,000
			A	0	0	0	0
4.3	Evaluacion del Desempeno final del programa elaborado	Evaluacion	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

Auditoria Financiera		P			30,000	100,000
		P(a)			85,479	130,000
		A			0	0
Asistencia Tecnica para realizar un analisis de compromiso fiscal y una evaluacion de estrategias alternativas de financiamiento		P			25,000	50,000
		P(a)			0	0
		A			0	0
Unidad Ejecutora		P			368,078	828,450
		P(a)			368,565	921,390
		A			71,323	308,458
Gastos Operativos		P			150,500	321,550
		P(a)			81,831	198,610
		A			0	99,167

Total Cost

Total Cost		P			18,920,528	69,000,000
		P(a)			15,472,334	69,000,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A			3,778,892	20,981,666
--	------------	---	--	--	-----------	------------

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Sustainability
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Technical Design
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Internal Processes
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Goods, and Services
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Organizational and Managerial Dimensions
