

PMR Public Report

Operation Number	PR-L1148	Chief of Operations Validation Date	10/20/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Project to Improve and Expand Animal Health Services in Paraguay	Loan Number	4526/OC-PR
Executing Agency	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL	Sector/Subsector	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Team Leader	MATTOS, JUAN DE DIOS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El proyecto se encuentra en cumplimiento con las políticas de salvaguardias socioambientales y los requisitos establecidos en el contrato de préstamo y Reglamento Operativo. La Unidad ejecutora cuenta con un especialista socioambiental a cargo de la supervisión socioambiental del proyecto. La UEP cuenta con capacidad suficiente para acompañar y liderar la gestión de los aspectos ambientales y sociales requeridos.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1148	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	200,000	1.33%	14,800,000
Aggregated	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	200,000	1.33%	14,800,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

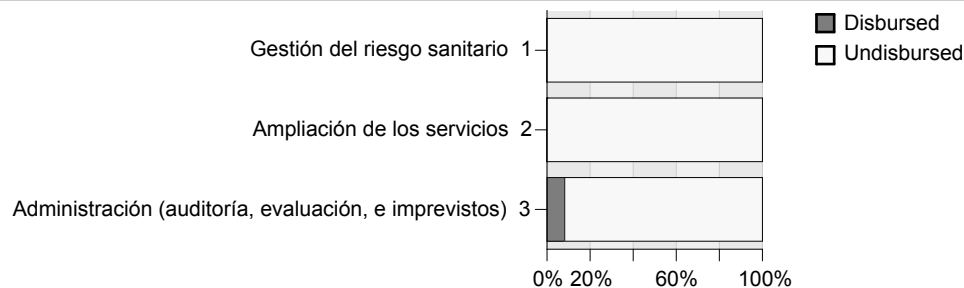

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Incremento de la tasa de extracción en bovinos de carne y volumen de exportaciones de carne de aves y cerdos

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Tasa de faena / población bovina	Porcentaje	13.80	2017	2025	P	18.00
						A	

Details

Means of verification: Informes del SENACSA

Observations: Promedio de tres años

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Cantidad de mercados de exportación	# of Integration agreements and cooperation initiatives	13.00	2017	2025	P	16.00
						A	

Details

Means of verification: Informes del SENACSA

Observations: Países habilitados para recibir exportaciones de carne que tienen acuerdos con el SENACSA

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.3	Volumen de exportación de carne y menudencias	Toneladas	5,754.00	2017	2025	P	7,500.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

1.3	aviar y porcina	Toneladas	5,754.00	2017	2025	A	
Details							
Means of verification: Informes del SENACSA y del MAG							
Observations: Proxy de la producción. Se estima un 5% anual de crecimiento.							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No		
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)							
	No						

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la eficacia de los servicios de sanidad animal y la gestión del riesgo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.0	Tiempo de respuesta de atención de notificaciones de sospecha de enfermedades vesiculares	Horas	4.00	2017	P	3.00	3.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Informe del SENACSA en base a registros específicos

Observations: Se refiere al tiempo de respuesta entre la notificación y la atención de la sospecha

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.2	Puntaje en capítulo II del PVS (OIE)	Puntaje	3.00	2017	P	3.60	3.60
					A		0.00

Details

Means of verification: Informe PVS de la OIE

Observations: El capítulo dos corresponde a "Autoridad y competencia técnica"

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.3	Puntaje en competencias críticas del PVS	Puntaje	3.00	2017	P	3.60	3.60
					A		0.00

Details

Means of verification: Informe PVS de la OIE

Observations: Promedio de puntaje obtenido para las competencias críticas II.1 (laboratorios), II.5 (vigilancia epidemiológica), y II.6 (detección precoz y respuesta práctica a emergencias)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Reducción de la prevalencia de brucelosis

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
2.0	Reducción de la prevalencia de la brucelosis bovina	Porcentaje	6.00	2017	P	4.50	4.50
					A		0.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details			
Means of verification: Informes del SENACSA			
Observations: Número de reactores positivos sobre número total de examinados			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Specific Development Objectives Nbr. 3: Ampliación de la cobertura sanitaria a nuevos rubros con énfasis en ganado menor

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
3.0	Planes sanitarios funcionando	Número de planes	2.00	2017	P	4.00	4.00
					A		0.00
Details							
Means of verification: Informes del SENACSA							
Observations: Implica la existencia de un registro de establecimientos, propietarios y moviemientos de aves, ovinos, caprinos y porcinos, utilizando como base para las acciones sanitarias definidas por SENACSA							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Gestión del riesgo sanitario

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
1.1	SISA ampliado en sus prestaciones e integrado a SIGOR	Calificación	P		1	30,000	230,000
			P(a)		1	30,000	230,000
			A		0	0	0
1.2	Unidad de vigilancia sanitaria implementada	Unidad de comando	P		1	81,000	650,000
			P(a)		1	81,000	650,000
			A		0	0	0
1.3	Control en puntos de ingreso funcionando de acuerdo a estándares internacionales	Calificación	P		1		220,000
			P(a)		1		220,000
			A		0		0
1.4	Programa de mantenimiento de de estatus libre de fiebre aftosa fortalecido	Programa fortalecido	P		1	50,000	380,000
			P(a)		1	50,000	380,000
			A		0	0	0
1.5	Laboratorio Nacional del SENACSA fortalecido	Laboratorio fortalecido	P		1	655,000	2,610,000
			P(a)		1	655,000	2,610,000
			A		0	1,971.4	1,971.4
1.6	Infraestructura edilicia mejorada e integrada a la red	Número de oficinas	P		14	655,377	3,500,000
			P(a)		14	655,377	3,500,000
			A		0	0	0
1.7	Sistema informático para gestión de trazabilidad individual implementado	Aplicación informática	P		1	30,000	2,160,000
			P(a)		1	30,000	2,160,000
			A		0	0	0
1.8	Programa de prevención, control y erradicación de brucelosis operando	Programa funcionando	P		1		560,000
			P(a)		1		560,000
			A		0		0
1.9	Modelo de gestión del SENACSA reestructurado	SENCSA reestructurado	P		1	50,000	550,000
			P(a)		1	50,000	550,000
			A		0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Ampliación de los servicios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
2.1	Marco regulatorio para el registro de caprinos y ovinos realizado	Marco regulatorio	P		1	4,500	30,000
			P(a)		1	4,500	30,000
			A		0	0	0
2.2	Planes sanitarios con vigilancia epidemiológica implementados en ovinos y caprinos	Planes sanitarios	P		2	30,000	390,000
			P(a)		2	30,000	390,000
			A		0	0	0
2.3	Granjas de aves y porcinos establecidas bajo control oficial	Número de granjas	P		25	30,000	120,000
			P(a)		25	30,000	120,000
			A		0	0	0
2.4	Asociación Público Privada de ganado menor operando	Sistema operando	P		1	18,000	370,000
			P(a)		1	18,000	370,000
			A		0	0	0
2.5	Técnicos y productores capacitados en sanidad aplicada a ovinos, caprinos y porcinos	# of farmers	P		1,720		680,000
			P(a)		1,720		680,000
			A		0		0
2.6	Eficiencia en la prestación de servicios a usuarios mejorada - Trámites y pagos en línea	Número de trámites digitalizados	P		24		650,000
			P(a)		24		650,000
			A		0		0
2.7	Eficiencia en la prestación de servicios a usuarios mejorada - Nuevos módulos en SIGOR	Número de módulos	P		4		834,000
			P(a)		4		834,000
			A		0		0

Other Cost

	Administración y supervisión del proyecto	P			256,875	566,000
		P(a)			256,875	566,000
		A			135,144.61	175,794.61
	Evaluaciones	P			30,000	150,000
		P(a)			30,000	150,000
		A			0	0
	Auditoría externa	P			10,000	200,000
		P(a)			10,000	200,000
		A			0	0
	Imprevistos	P				150,000
		P(a)				150,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			1,930,752	15,000,000
		P(a)			1,930,752	15,000,000
		A			137,116.01	177,766.01

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Social Environment
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	COMPLETE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Social Environment
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	COMPLETE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Internal Processes
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	COMPLETE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	COMPLETE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Human Resources
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	COMPLETE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Human Resources
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Internal Processes
	Response actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	COMPLETE

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Fiduciary Dimensions
