

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1110	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/19/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/18/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support the National Integrated Care System	<b>Loan Number</b>	3706/OC-UR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	<b>Sector/Subsector</b>	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	SANCHEZ, MARIO ALBERTO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Uruguay
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	<p>Por el momento no hay obras en ejecución y se están focalizando en definir los acuerdos interinstitucionales para ejecutar las obras. El ejecutor no cuenta con un especialista socioambiental ni una unidad o departamento para gestionar estos aspectos. Tanto el MGAS como el PGAS de la operación no contemplan la nueva tipología de obras que quiere incluir el ejecutor en el Programa, que consisten en remodelaciones o ampliaciones en centros existentes que atienden a infancia y adolescencia en situación de riesgo psicosocial Las obras suelen ser realizadas por terceros sobre los cuales el ejecutor no realiza seguimiento de los aspectos ambientales, sociales ni de salud y seguridad laboral y comunitaria ni se reportan estos aspectos al Banco.</p>		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1110	50,000,000	50,000,000	15,000,000	0	65,000,000	50,000,000	32,969,753.85	65.94%	17,030,246.15
<b>Aggregated</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>65,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>32,969,753.85</b>	<b>65.94%</b>	<b>17,030,246.15</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

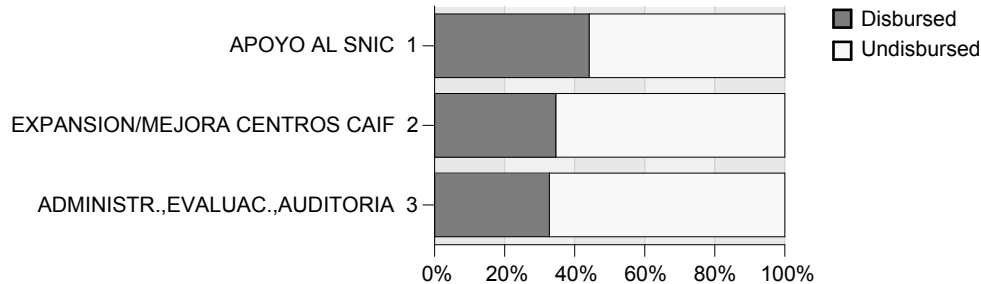

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 0:** Contribuir a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de las personas en situación de dependencia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Niños en nuevos centros CAIF con puntaje ASQ-3 por debajo de un umbral crítico.	% niños en nuevos centros CAIF	14.00	2016	2022	P	10.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Informes SNIC/DINEM-INAU

**Observations:** ASQ-3 es una herramienta de detección precoz de rezagos en el desarrollo infantil.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Centros CAIF nuevos con puntaje ITERS-R entre 5 y 7.	% centros CAIF	0.00	2016	2022	P	80.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Informes SNIC/DINEM-INAU

**Observations:** ITERS-R es un instrumento de medición de calidad en centros para niños.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	Brecha en la carga global de trabajo entre mujeres y hombres de Q1.	hs semanales de trabajo	9.00	2016	2022	P	7.00

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

0.2	Brecha en la carga global de trabajo entre mujeres y hombres de Q1.	hs semanales de trabajo	9.00	2016	2022	A	
Details							
Means of verification: EUT 2013 y 2019							
Observations: Línea de base a partir de EUT 2013 y seguimiento EUT 2019.							
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity		No			
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)	No						

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.3	Carga de trabajo no remunerado de cuidado infantil.	hs semanales de cuidado infantil	21.20	2016	2021	P	20.00
						A	
Details							
Means of verification: EUT 2013 y 2019							
Observations: Línea de base a partir de EUT 2013 y seguimiento EUT 2019. En el caso de este indicador, hay una línea de base y una meta para mujeres (21.2) y otra para varones (14.8)							
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity		No			
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)	No						

	Mujeres					P	20.00
						A	
	Varones					P	16.00
						A	

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Contribuir a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de las personas en situación de dependencia en el marco del SNIC.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.0	Porcentaje de cuidadores registrados en el RNC.	%	0.00	2016	P	25.00	50.00	50.00
					A	25.00		

#### Details

**Means of verification:** Sistemas de información del SNC

**Observations:** En comparación con estimación de universo de la SNC

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.1	Porcentaje de instituciones prestadoras de servicios registradas en el RNC.	%	0.00	2016	P	75.00	100.00	100.00
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Sistemas de información del SNC

**Observations:** En comparación con estimación de universo de la SNC

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.2	Porcentaje de usuarios registrados en el RNC.	%	0.00	2016	P	50.00	100.00	100.00
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Sistemas de información del SNC

**Observations:** En comparación con estimación de universo de la SNC

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.3	Porcentaje de instituciones formadoras de RRHH registradas en el RNC.	%	0.00	2016	P	50.00	100.00	100.00
					A	100.00		

#### Details

**Means of verification:** Sistemas de información del SNC

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Observations:** En comparación con estimación de universo de la SNC

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.4	Número de postulaciones para prestaciones.	#	0.00	2016	P	3,500.00	5,000.00
					A	10,000.00	

#### Details

**Means of verification:** Sistemas de información del SNC

**Observations:** Las prestaciones a considerar son: Asistente Personal, Tele asistencia, Centro de día, y Casa comunitaria Definir postulación como: beneficiario elegible (cumple requisitos) y está ingresado en el RNC.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.5	Porcentaje de personas con conocimiento de derechos y prestaciones en el marco del SNIC.	%	0.00	2016	P	25.00	50.00
					A	46.00	

#### Details

**Means of verification:** Informes SNIC

**Observations:** Informe producido a partir de encuesta a ser realizada por la SNC

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.6	Porcentaje de trabajadores de CAIF nuevos, formados según nueva currícula.	%	0.00	2016	P	50.00	80.00
					A	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Informes semestrales de avance, e informe específico sobre calidad de centros.

**Observations:** Se mide sobre los centros CAIF nuevos operando en el momento de medición

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.7	Porcentaje de usuarios satisfechos por al pertinencia de las innovaciones del PI.	%	60.00	2016	P	80.00	90.00
					A	0.00	

#### Details

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Means of verification:** Informes semestrales de avances del programa.

**Observations:** Medición que forma parte de la agenda de conocimiento del SNIC

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.8	Porcentaje de niños de los CAIF pertenecientes a hogares elegibles para AFAM Plan de Equidad (condición de vulnerabilidad socioeconómica)	%	64.00	2016	P	68.00	72.00	72.00
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos y visita de inspección in loco.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.9	Tasa de matriculación de los nuevos centros CAIF (niños/cupos)	tasa niños/cupos	0.00	2016	P	85.00	95.00	95.00
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos INAU

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la instalación y funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.1	Diseño del Portal de Cuidados aprobado por SNIC.	Portal	P	0	1	0	561,645
			P(a)	0	1	0	92,839.08
			A	0	1	0	92,839.08
1.2	Nuevas funcionalidades del Portal de Cuidados habilitadas con carga de datos de casos reales.	# nuevas funcionalidades	P	5	5	569,942	4,036,083
			P(a)	5	5	1,799,775	6,525,702.23
			A	4	4	713,627	5,439,554.23
1.3	Diseño de Registro Nacional de Cuidados aprobado por SNIC.	Documento - diseño RNC	P	0	1	0	150,898
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
1.4	Módulos del Registro Nacional de Cuidados en funcionamiento.	# módulos RNC	P	5	5	81,785	878,722
			P(a)	2	4	456,844	3,303,926.13
			A	2	2	482,234	3,329,316.13
1.5	Personas valoradas en relación a su situación de dependencia.	# personas valoradas	P	2,000	10,500	175,470	1,544,144
			P(a)	0	16,127	0	546,104.19
			A	0	16,127	77,770	623,874.19
1.6	Campañas de comunicación implementadas.	# campañas de comunicación	P	0	4	488,000	3,318,400
			P(a)	0	5	0	703,915.47
			A	0	5	14,500	718,415.47
1.7	Encuestas de opinión realizadas.	# encuestas de opinión	P	1	5	0	85,400
			P(a)	0	3	0	78,023.1
			A	0	3	0	78,023.1
1.8	Iniciativas territoriales de comunicación financiadas e implementadas.	# iniciativas territoriales de comunicación	P	0	120	78,125	1,046,875
			P(a)	0	74	0	828,328.78
			A	0	74	0	828,328.78
1.9	Líneas de trabajo que cuentan con productos comunicacionales.	# líneas de trabajo	P	3	15	381,486	1,007,573
			P(a)	1	13	24,471	1,090,466.72
			A	0	12	8,506	1,074,501.72
1.10	Estudios de la agenda de conocimiento publicados en el sitio web.	# estudios	P	2	12	16,470	1,197,186
			P(a)	0	9	0	179,791.58
			A	0	9	0	179,791.58
1.11	Informes de avances y resultados de la agenda de conocimiento del SNIC elaborados y aprobados por SNIC y DINEM/MIDES.	# informes de avance y resultados	P	0	3	47,581	339,484
			P(a)	0	4	0	300,632.98
			A	0	4	0	300,632.98
1.12	Prestaciones reguladas.	# prestaciones reguladas	P	0	28	86,275	880,418
			P(a)	1	23	23,135	482,086.87
			A	1	23	17,736	476,687.87
1.13	Diseño de un censo de centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisado por MEC o ANEP)	# instrumentos de medición de DIT	P	0	3		36,600
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
1.14	Centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisados por MEC o ANEP) censados	Documento - diseño de instrumento	P	0	1		133,379
			P(a)	0	0	0	70,627
			A	0	0	7,564	78,191
1.15	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de formación del SNIC.	currícula de cursos	P	0	1	31,411	608,653
			P(a)	0	1	0	265,725.32

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.15	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de formación del SNIC.	currícula de cursos	A	0	1	0	265,725.32
1.16	Modelo de supervisión de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por MEC.	Documento - modelo de supervisión	P	0	1	0	442,491
			P(a)	0	1	0	206,313.11
			A	0	1	10,270	216,583.11
1.17	Centros de educación y cuidado infantil supervisados por MEC con el nuevo modelo.	# de centros de educación y cuidado infantil	P	980	980	0	851,717
			P(a)	1,203	1,203	25,156	523,514.27
			A	0	1,203	17,461	515,819.27
1.18	Diseño de instrumento de medición de la calidad de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por INAU y MEC.	Documento - diseño instrumento de medición de calidad	P	0	1	0	61,000
			P(a)	1	2	9,760	51,350.76
			A	0	1	0	41,590.76
1.19	Centros de educación y cuidado infantil evaluados con el instrumento de medición de calidad.	# centros de educación y cuidado infantil	P	980	980		91,500
			P(a)	980	980	91,500	91,500
			A	0	0	0	0
1.20	Pilotos de innovaciones en primera infancia implementados.	# pilotos de innovaciones	P	5	5	33,805	1,039,311
			P(a)	6	5	34,703	716,069.95
			A	5	5	20,077	701,443.95

## Component Nbr. 2 Expansión y mejora de la calidad de Centros de Atención a la Infancia y Familia (CAIF)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.1	Centros CAIF nuevos que cuentan con dotación de personal (técnico y de gestión) adecuado.	# centros CAIF	P	142	142	0	122,001
			P(a)	0	119	0	0
			A	0	77	0	0
2.2	Centros CAIF construidos.	# centros CAIF	P	50	50	375,007	37,939,310
			P(a)	25	25	1,639,205	19,107,097.43
			A	24	24	1,685,295	19,153,187.43
2.3	Centros CAIF que implementan el Programa de Parentalidades Comprometidas	# centros CAIF	P	70	70	103,411	592,787
			P(a)	83	83	109,695	688,262.77
			A	83	83	50,636	629,203.77
2.4	Centros de educación y cuidado infantil de INAU (CAIF, Nuestros Niños y CAPI) evaluados con el instrumento de medición de calidad de los centros validado.	# centros de educación y cuidado infantil	P	600	600	0	666,270
			P(a)	10	10	47,539	342,312.53
			A	10	10	19,856	314,629.53

## Component Nbr. 3 Ejecución, evaluación y monitoreo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
3.1	Mediciones para la evaluación de impacto de CAIF realizadas.	# mediciones	P	0	3	406,666	915,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0

## Other Cost

	Administración y ejecución del proyecto	P			241,680	6,393,153
		P(a)			250,379	2,502,173.76
		A			79,722	2,331,516.76
	Evaluación y Auditoría	P			20,000	60,000
		P(a)			16,000	44,330.7
		A			9,142	37,472.7



RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Fondos sin asignar	P				0
		P(a)			26,258,905.27	26,258,905.27
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			3,137,114	65,000,000
		P(a)			30,787,067.27	65,000,000
		A			3,214,396	37,427,328.73

**CHANGES TO THE MATRIX**

No information available for this section

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Social Environment
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Internal Processes
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Human Resources
	Response actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Inactive		Social Environment
	Response actions		
	7.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	8.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	9.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Others - Technical-Sectorial Dimensions
