

PMR Public Report

Operation Number	UR-L1111	Chief of Operations Validation Date	10/12/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/01/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Development and Strengthening of Fiscal and Subnational Service Management	Loan Number	3792/OC-UR
Executing Agency	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
Team Leader	GOMEZ REINO, JUAN LUIS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1111	75,000,000	75,000,000	15,000,000	0	90,000,000	75,000,000	26,750,000	35.67%	48,250,000
Aggregated	75,000,000	75,000,000	15,000,000	0	90,000,000	75,000,000	26,750,000	35.67%	48,250,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

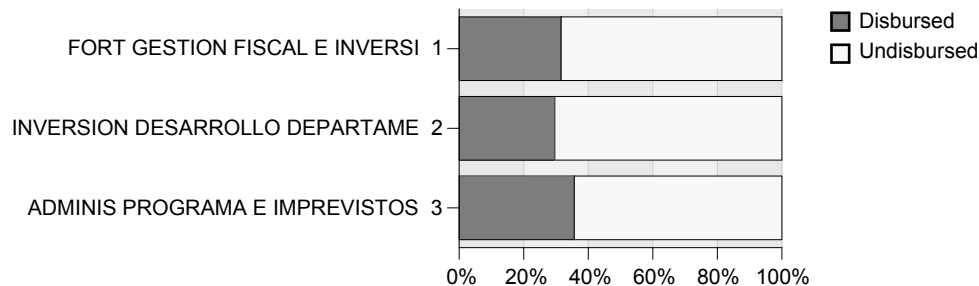

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Contribuir con la autonomía financiera de los Gobiernos Departamentales respecto al Gobierno Nacional y mejorar la prestación de servicios básicos que se encuentran a su cargo

Observation: Promedio de los ingresos propios departamentales sobre los ingresos totales departamentales.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Incremento del porcentaje de Ingresos propios de los Gobiernos Departamentales	Porcentaje	45.00	2014	-	P	50.00
						A	

Details

Means of verification: Observatorio Territorial de OPP

Observations: Promedio de los ingresos propios departamentales sobre los ingresos totales departamentales.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Incremento de la recaudación del impuesto inmobiliario en términos reales anuales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2024
0.0	Ingreso del impuesto inmobiliario en términos reales (el incremento se medirá en términos % con base en datos del año 2014)	%	1.40	2014	P		5.00
					A		
Details							
Means of verification: Observatorio Territorial de OPP							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la oportunidad de la entrega de información financiera de los GD una vez cerrado cada ejercicio económico.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2024
1.0	Meses promedio en la entrega de la información financiera después de cerrado el ejercicio	meses promedio	8.00	2014	P		4.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe OPP							
Observations: 1/N* <input type="checkbox"/> (Fecha de recibida - fecha de solicitada)							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Specific Development Objectives Nbr. 2: Aumentar la eficiencia (en términos de tiempo y presupuesto) en la gestión de la inversión pública departamental

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2024
2.0	Días transcurridos desde la solicitud de no objeción al BID (al pliego y al proyecto) y la fecha de contratación de la empresa constructora.	días	400.00	2016	P		260.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe OPP							
Observations: 1/N* <input type="checkbox"/> (Fecha de contratación a empresa constructora - Fecha de nota de solicitud de NOB).							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2024
2.1	Diferencia entre el precio de oficina (actualizado al momento de la licitación) y el monto adjudicado	%	12.00	2016	P		10.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

2.1	Diferencia entre el precio de oficina (actualizado al momento de la licitación) y el monto adjudicado	%	12.00	2016	A		
Details							
Means of verification: Informe OPP							
Observations: Reducción del precio de oficina se calculará: \square (Precio de oficina i/Suma total precios de oficina)* (Precio adjudicado i – Precio de oficina							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Specific Development Objectives Nbr. 3: Aumentar el desarrollo departamental en términos de servicios al ciudadano fundamentalmente relacionados con el desarrollo urbano y territorial.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2024
3.0	Incremento del precio, en USD, del m2 de las áreas intervenidas respecto a las áreas sin intervención	%	0.00	2016	P		23.00
					A		
Details							
Means of verification: Para la estimación del indicador podrán ser utilizados distintos métodos de evaluación de impacto y/o la metodología de precios hedónicos como un proxy sintético de las características de los servicios y equipamiento urbano							
Observations: Previo a la intervención (variable de acuerdo al cronograma de ejecución de las obras del Programa)							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y de inversión de los gobiernos departamentales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
1.1	Número de gobiernos departamentales que realizan su gestión financiera por medio de sistemas de información financiera integrales y con criterios unificados	# of agencies	P	4	12	75,286	3,003,075
			P(a)	5	17	2,459,553	3,550,510
			A	1	13	512,203	1,235,468
1.2	Número de gobiernos departamentales con sistema de recaudación por contribución catastral centralizado implementado y funcionando	# of agencies	P	0	18	75,286	1,033,091
			P(a)	6	18	420,232	557,495
			A	0	0	15,585	101,880
1.3	Número de gobiernos departamentales con estudios para la actualización de valores catastrales	GD	P	3	8	22,772	60,725
			P(a)	2	18	0	0
			A	0	0	0	0
1.4	Estudios para el fortalecimiento de la gestión del gasto, la gestión por resultados y costeo de los servicios	Estudios	P	4	17	48,841	235,805
			P(a)	0	0	74,295	297,515
			A	0	0	17,329	144,161
1.5	Gobiernos departamentales que cuentan con proyectos de mitigación de riesgos y adaptación al cambio climático	GD	P	0	3	37,643	238,213
			P(a)	0	1	35,477	165,386
			A	0	0	15,805	118,151

Component Nbr. 2 Inversiones para el desarrollo departamental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
2.1	Proyectos con estudios de preinversión	Proyectos	P	5	20	300,000	1,200,000
			P(a)	10	19	360,000	1,200,000
			A	0	6	74,322	222,772
2.2	Nº de proyectos de inversión con dirección de obra	Proyectos	P	4	18	266,667	1,200,000
			P(a)	10	18	202,000	1,200,000
			A	2	5	33,931	170,504
2.3	Proyectos financiados con el Fondo Complementario	Proyectos	P	6	10	6,000,000	10,000,000
			P(a)	1	11	2,845,733	10,000,000
			A	0	0	822,536	993,730
2.4	Proyectos financiados con el Fondo de Asignación Inicial	Proyectos	P	10	33	739,029	68,647,835
			P(a)	6	24	11,522,033	68,647,835
			A	1	6	5,013,605	25,033,007
2.5	Nº de proyectos supervisados conjuntamente entre el Programa y la ID	Proyectos	P	16	43	274,166	1,370,830
			P(a)	16	38	177,252	1,370,830
			A	1	13	73,597	677,919
2.6	Nº de proyectos con ensayo de calidad realizados	Proyectos	P	16	43	148,837	400,000
			P(a)	13	41	25,000	400,000
			A	0	13	8,000	116,299

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Administración y monitoreo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
3.1	Unidad coordinadora	Infore	P	1	5	446,086	2,230,426
			P(a)	1	5	369,635	2,230,429
			A	1	4	145,096	1,009,553
3.2	Evaluación y Auditoría	Informe	P	0	2	0	200,000
			P(a)	0	1	9,000	200,000
			A	0	0	9,012	17,661
3.3	Imprevistos	Informe	P	0	1	36,000	180,000
			P(a)	0	1	0	180,000
			A	0	0	0	0

Total Cost

	Total Cost	P			8,470,613	90,000,000
		P(a)			18,500,210	90,000,000
		A			6,741,021	29,841,105

PMR Public Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	N° de proyectos supervisados conjuntamente entre el Programa y la ID	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KARINABA	09/02/2021

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Political Environment
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Human Resources
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	7.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Inactive		Political Environment
	Response actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
