

# PMR Public Report

Operation Number	AR-L1145	Chief of Operations Validation Date	05/06/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	05/06/22
Last Update	05/06/22	Country Representative Validation Date	05/06/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	MSME Competitiveness Support Program	Loan Number	2923/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO  , SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, PRESIDENCIA DE LA NACION	Sector/Subsector	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION
Team Leader	CASABURI, GABRIEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1145	50,000,000	50,000,000	30,000,000	0	80,000,000	50,000,000	46,246,859	92.49%	3,753,141
Aggregated	50,000,000	50,000,000	30,000,000	0	80,000,000	50,000,000	46,246,859	92.49%	3,753,141

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

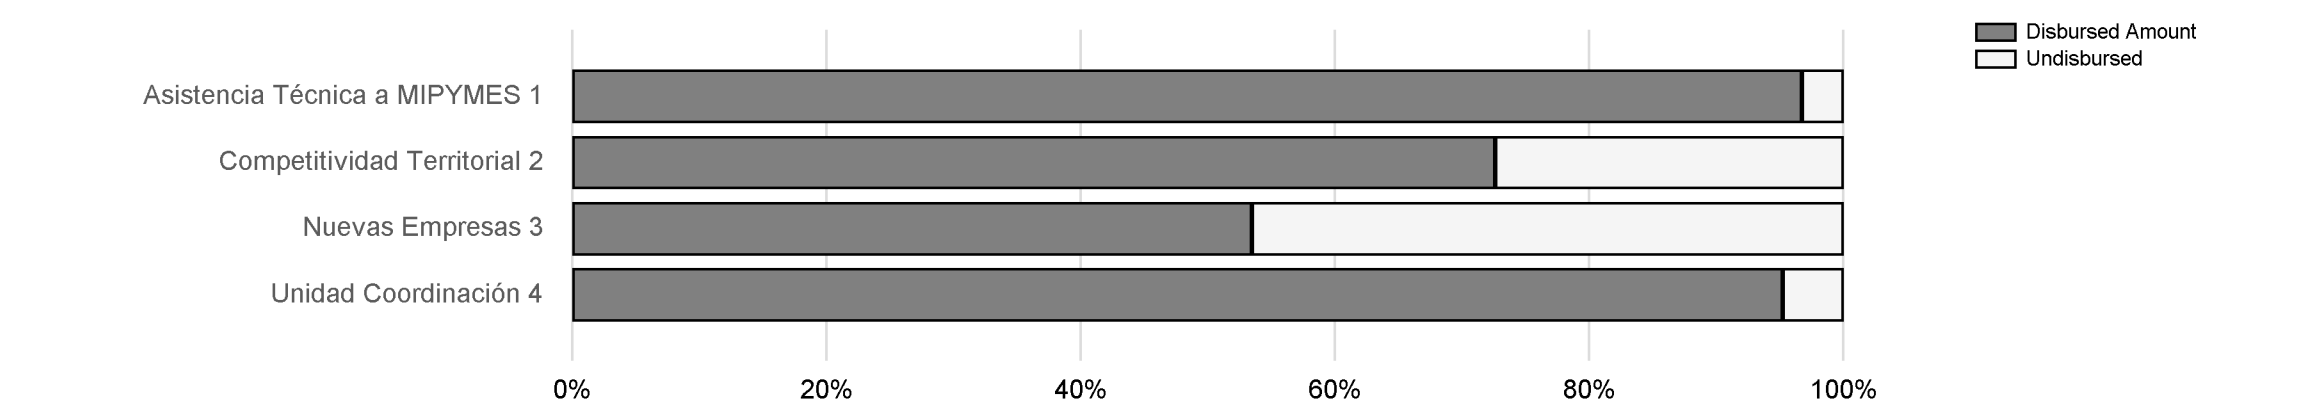

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX							
General Development Objectives							
General Development Objectives Nbr. 1: Productividad de las MIPYMES mejorada							
Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.1	Diferencia en el cambio porcentual de la productividad total de los factores entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas	Variacion %		2013	2022	P	3
						A	-
Details							
Means of Verification: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, entre otros							
Observations: Linea de base a construir							

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.2	Diferencia en el cambio porcentual en el empleo entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas			Variacion %	2013	2022	P	2
							A	-
Details								
Means of Verification: Base de datos del sistema de monitoreo y evaluación del programa, entre otros								
Observations: Linea de base a construir								

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.3	Diferencia en el cambio porcentual de facturación entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas			Variacion %	2013	2022	P	5
							A	-
Details								
Means of Verification: Encuesta a empresas participantes en el programa y al grupo de control, entre otros.								
Observations: Linea de base a construir								

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Aumento en la inversión de las MIPYMES en servicios de desarrollo empresarial

Observation: Encuesta con empresarios y bases de datos de la SEPYME y del PACC. Evaluación final del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	2020	2023
1.1	Porcentaje de MIPYMES que invierten en SDE (Diferencia con un grupo de control)	Puntos porcentuales	70	2012	P	-	-	-	-
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta con empresarios y bases de datos de la SEPYME y del PACC, al principio del programa y al final

Observations: Unidad de Medida: Puntos porcentuales de diferencia entre el porcentaje de MIPYMES benefi-ciarias que compran SDE y el porcentaje de no beneficiarias que también lo hacen

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Acceso a servicios de desarrollo empresarial de empresas de aglomerados productivos aumentado

Observation: Informes de avance del Programa. Evaluaciones del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	2020	2023
2.1	Número de acciones colectivas de compra de SDE o de mejora de su provisión colectiva territorial	Numero de acciones	0	2013	P	4	-	-	-
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes de avance del programa

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Aumento en el número de empresas creadas y consolidadas

Observation: Reportes del sistema de monitoreo y evaluación. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Informes semestrales de ejecución. Evaluaciones del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	2020	2023
3.1	Diferencia en la tasa de supervivencia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas creadas con el apoyo del programa y empresas de un grupo de control	Diferencia %	0	2012	P	-	-	-	-
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, entre otros

Observations: Unidad de Medida: Diferencia porcentual de la tasa de supervi-vencia entre las empresas del programa y las del grupo control

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 4: Aumento del porcentaje de mujeres beneficiarias del programa

Observation: Reportes del sistema de monitoreo y evaluación.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	2020	2023
4.1	Porcentaje de mujeres titulares de empresas beneficiarias del programa aumentado	Aumento %	18	2012	P	2	-	-	-
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes de avance del programa

Observations: Línea de base: Empresas existentes 18% - Emprendedores: 27%

EOP 2023
55
-

EOP 2023
10
-

EOP 2023
15
-

EOP 2023
5
-

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 5: Aumento de la participación de empresas de provincias del Norte Grande como beneficiarios del programa

Observation: Reportes del sistema de monitoreo y evaluación.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	2020	2023
5.1	Porcentaje de empresas beneficiarias de las Provincias del Norte Grande (NG) sobre el total de las empresas beneficiarias aumentado	Aumento %	5	2012	P	-	-	-	-
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes de avance del programa

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Asistencia Técnica a MIPYMES

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.01	Empresas asistidas técnicamente (supone haber finalizado al menos una actividad)	# of enterprises	P	-	1,500	-	37,600,000
			P (a)	300	3,069	27,846,056	40,764,341.09
			A	337	2,669	2,548,842.09	29,676,647.09

Component Nbr. 2 Articulación Productiva y Competitividad Territorial

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.01	Aglomerados maduros asistidos (supone haber finalizado al menos una actividad)	Número de aglomerados	P	-	7	-	11,100,000
			P (a)	-	4	-	2,634,061
			A	-	4	-	2,634,061
2.02	Aglomerados incipientes asistidos (supone haber finalizado al menos un componente con todas sus actividades)	Número de aglomerados	P	-	9	-	3,600,000
			P (a)	6	41	2,096,010	7,521,663.44
			A	-	31	115,103.44	3,220,499.44
2.03	Instituciones de la Plataforma Territorial Asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Número de Insttuciones	P	-	20	-	1,640,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

EOP 2023
6.5
-

Component Nbr. 3 Apoyo a Nuevas Empresas

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
3.01	Emprendedores y empresas jóvenes asistidas (supone que la UE haya aprobado la primera rendición del proyecto)	Número de emprendedores y empresas jóvenes	P	-	400	-	12,000,000
			P (a)	70	828	3,716,342	18,649,145.37
			A	37	558	4,657,414.37	13,344,121.37
3.02	Acciones de fomento y servicios de apoyo al desarrollo emprendedor financiadas	Número de acciones	P	-	30	-	1,710,000
			P (a)	-	19	-	1,020,473
			A	-	19	-	1,020,473
3.03	Número de Instituciones especializadas asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Número de Instituciones	P	-	25	-	3,900,000
			P (a)	-	41	-	317,726.85
			A	-	41	2,007.85	317,726.85
3.04	Talleres y otras acciones de fomento del rol de la mujer emprendedora realizadas	Número de actividades	P	-	9	-	450,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.05	Proyecto de transformación digital del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) iniciado	Proyecto	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	102,409
			A	-	1	-	102,409

Component Nbr. 4 Administración

				FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP
4.00			P	-
			P (a)	-
			A	-

Other Cost				
	Administración	P		8,000,000
		P (a)	337,727	8,990,180.25
		A	307,998.25	2,497,862.25
Total Cost				
	Total Cost	P		80,000,000
		P (a)	33,996,135	80,000,000
		A	7,631,366	52,813,800

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Aglomerados incipientes asistidos (supone haber finalizado al menos un componente con todas sus actividades)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GDALMASSO	3/17/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GDALMASSO	3/17/2022
	Emprendedores y empresas jóvenes asistidas (supone que la UE haya aprobado la primera rendición del proyecto)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GDALMASSO	3/17/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GDALMASSO	3/17/2022
	Empresas asistidas técnicamente (supone haber finalizado al menos una actividad)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GDALMASSO	3/17/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GDALMASSO	3/17/2022
	Número de Instituciones especializadas asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GDALMASSO	3/17/2022
			Modify Financial Historical Actual	GDALMASSO	3/17/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Technical Design
	Response Actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	10.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	11.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	14.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
16	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	16.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Inactive		Planning
	Response Actions		
	18.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
20	Inactive		Planning		
	Response Actions				
	20.1	Management Strategy		Status	
		AVOID		COMPLETE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
22	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	22.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	24.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
25	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	25.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
28	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	28.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
