

PMR Public Report

Operation Number	CO-L1243	Chief of Operations Validation Date	04/06/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/27/22
Last Update	04/01/22	Country Representative Validation Date	04/27/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Strengthen Public Sector Strategic Management Capacities	Loan Number	4848/OC-CO
Executing Agency	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Team Leader	DE SIMONE, FRANCESCO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
CO-L1243	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	6,401,279.09	42.68%	8,598,720.91
Aggregated	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	6,401,279.09	42.68%	8,598,720.91

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

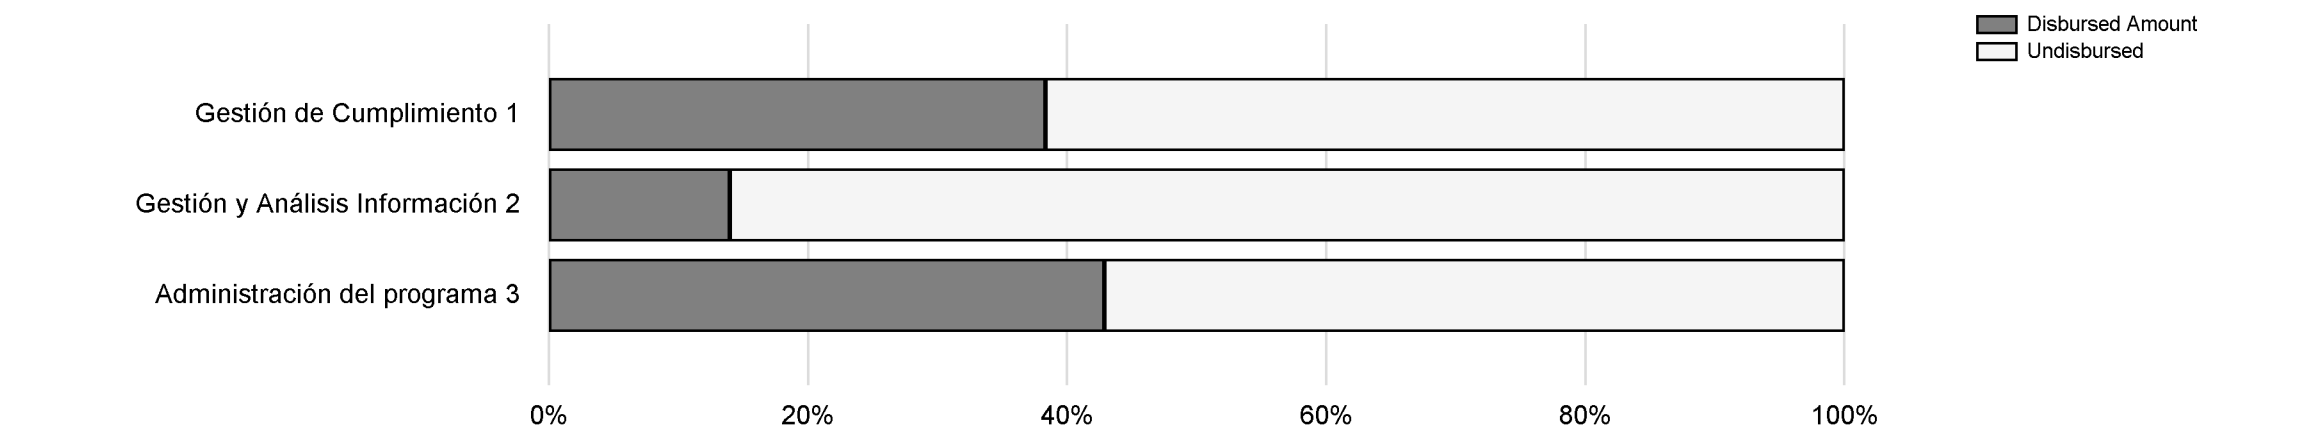

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejora en la efectividad gubernamental

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Índice de Efectividad Gubernamental (IEG)	Número	-0.07	2017	2023	P	.15
						A	-

Details

Means of Verification: Fuente: Worldwide Governance Indicators (WGI) project - Banco Mundial Responsable de recolección y reporte de datos: Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento (CGC - recolección) - Unidad Ejecutora (UEP) DAPRE (reporte)

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX											
Specific Development Objectives											
Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejora en la capacidad de gestión de cumplimiento de PG											
Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Mejora en la calificación del gobierno en el índice de la Revisión de Capacidad de Cumplimiento (RCC - Delivery Capacity Review)	Número	2.21	2018	P	-	2.21	2.6	2.6	3	3
					A	-	2.21	2.21	-	-	-
Details											

Means of Verification: Fuente: RCC (BID)

Observations: Responsable de recolección y reporte de datos: CGC (recolección) - (UEP) Dapre (reporte)

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejora en la gestión de PG mediante el uso de TIC

Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Prioridades gestionadas mediante el uso de datos masivos, analítica de datos y herramientas de visualización	Número	1	2018	P	-	1	3	5	6	6
					A	-	1	3	-	-	-
Details											

Means of Verification: Fuente: Sistema de Gestión y Análisis de Información Gerencial de la Presidencia de la República

Observations: Responsable de recolección y reporte de datos: CGC (recolección) - Unidad Ejecutora (UEP) Dapre (reporte)

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de capacidades de gestión de cumplimiento

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.01	Modelo de Gestión del Cumplimiento (MGC) y plan de capacitación para aplicarlo en los ministerios y agencias responsables de implementar Prioridades Gubernamentales (PG) diseñado e implementado	Documento (MGC y plan de capacitación)	P	1	1	42,090	500,000
			P (a)	-	1	102,021.27	500,000
			A	-	-	38,277.87	239,241.6
1.02	Funcionarios capacitados en el Modelo de Gestión del Cumplimiento (MGC)	funcionarios capacitados	P	50	200	133,833	500,000
			P (a)	50	245	232,333	100,000
			A	245	245	-	-
1.03	Evaluaciones rápidas (Deep Dives) y/o estrategias especializadas de intervención para apoyar la gestión de la ejecución y el cumplimiento de Prioridades Gubernamentales (PG) realizadas	Documento (Evaluaciones/Estrategias)	P	4	18	300,000	1,500,000
			P (a)	4	18	523,180.3	2,033,357.32
			A	5	17	724,421.41	1,533,357.32
1.04	Coordinación e incorporación de buenas prácticas y conocimiento público privado al seguimiento y análisis de las Prioridades Gubernamentales (PG) realizada	Documento (análisis y seguimiento de PG)	P	1	5	164,150	500,000
			P (a)	1	5	164,150	366,642.68
			A	1	3	51,711.51	151,173.14
1.05	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 1 realizado – PG1	Documento (análisis y seguimiento de PG)	P	1	5	110,659	359,500
			P (a)	1	5	110,659	359,500
			A	1	3	78,651.21	142,919.45
1.06	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 2 realizado – PG2	Documento (análisis y seguimiento de PG)	P	1	4	113,845	359,500
			P (a)	1	4	113,845	359,500
			A	1	2	85,303.02	131,827.25
1.07	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 3 realizado – PG3	Documento (análisis y seguimiento de PG)	P	1	5	108,527	359,500
			P (a)	1	5	108,527	359,500
			A	1	3	102,067.82	178,532.86
1.08	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 4 realizado – PG4	Documento análisis y seguimiento de PG)	P	1	5	80,290	274,500
			P (a)	1	5	80,290	274,500
			A	1	3	63,710.85	121,737.63
1.09	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 5 realizado – PG5	Documento (análisis y seguimiento de PG)	P	1	4	84,637	274,500
			P (a)	1	4	84,637	274,500
			A	1	2	68,325.84	108,224.89
1.10	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 6 realizado – PG6	Documento (análisis y seguimiento de PG)	P	1	5	79,240	274,500
			P (a)	1	5	79,240	274,500
			A	1	3	68,237.46	131,154.14
1.11	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 7 realizado – PG7	Documento (análisis y seguimiento de PG)	P	1	5	78,570	274,500
			P (a)	1	5	78,570	274,500
			A	1	3	57,427.06	128,755.52
1.12	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 8 realizado – PG8	Documento (análisis y seguimiento de PG)	P	1	4	89,837	274,500
			P (a)	1	4	89,837	274,500
			A	1	2	100,516.78	131,632.32
1.13	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 9 REDAP (Transparencia) realizado – PG9	Documento (análisis y seguimiento de PG)	P	1	4	54,470	274,500
			P (a)	1	4	64,470	274,500
			A	1	2	43,970.99	143,485.46

1.14	Seguimiento y análisis de la Prioridad Gubernamental 9 REDAP (Simplificación y digitalización de trámites) realizado - PG9	Documento (análisis y seguimiento de PG)	P	1	5	47,433	274,500
			P (a)	1	5	57,433	274,500
			A	1	3	69,825.94	192,145.09
1.15	Diagnósticos en temas clave para la definición del plan de cumplimiento de la REDAP realizados	Documento (diagnósticos en dos temas: Transparencia; y Simplificación y Digitalización de Trámites Prioritarios)	P	-	2	68,500	850,000
			P (a)	1	2	200,000	850,000
			A	1	1	134,830.29	134,830.29
1.16	Plan de cumplimiento de la REDAP con base en los diagnósticos realizados diseñado e implementado	Documento (plan de cumplimiento)	P	-	1	354,608	1,124,000
			P (a)	-	1	250,000	1,124,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de capacidades de gestión y análisis de información

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.01	Funcionalidades de analítica de datos definidas e integración de sistemas de información del gobierno para analizar datos que afectan la gestión de Prioridades Gubernamentales (PG) desarrolladas	Sistema (software)	P	-	1	703,000	3,000,000
			P (a)	-	1	1,500,000	3,000,000
			A	-	-	932,069.07	1,204,902.55
2.02	Herramienta de visualización de información georreferenciada diseñada e implementada	Sistema (software)	P	1	1	200,000	1,000,000
			P (a)	1	1	800,000	1,000,000
			A	1	1	780,644.35	780,644.35
2.03	Funcionarios capacitados y actividades de gestión del cambio realizadas	funcionarios capacitados	P	75	200	142,167	500,000
			P (a)	75	245	240,667	500,000
			A	245	245	-	-
2.04	Servicios de infraestructura y software adquiridos y operando	Documento (inventario de servicios adquiridos y en operación)	P	1	4	600,000	1,500,000
			P (a)	2	4	600,000	1,500,000
			A	2	2	4,438.37	4,438.37

Other Cost				
	Coordinación y Asistencia Técnica	P	203,841	816,000
		P (a)	233,841	816,000
		A	247,247.5	454,205.2
	Auditorías	P	37,500	150,000
		P (a)	46,353.06	150,000
		A	20,653.49	40,447.36
	Evaluaciones	P	30,000	60,000
		P (a)	30,000	60,000
		A	0	0

Total Cost				
	Total Cost	P	3,827,197	15,000,000
		P (a)	5,790,053.63	15,000,000
		A	3,672,330.83	5,953,654.79

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Coordinación e incorporación de buenas prácticas y conocimiento público privado al seguimiento y análisis de las Prioridades Gubernamentales (PG) realizada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/16/2022
	Evaluaciones rápidas (Deep Dives) y/o estrategias especializadas de intervención para apoyar la gestión de la ejecución y el cumplimiento de Prioridades Gubernamentales (PG) realizadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/16/2022
	Funcionarios capacitados en el Modelo de Gestión del Cumplimiento (MGC)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAY	3/16/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAY	3/8/2022
	Funcionarios capacitados y actividades de gestión del cambio realizadas	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAY	3/8/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
4	Active		Institutional Environment		
	Response Actions				
	4.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Political Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
8	Active		Planning		
	Response Actions				
	8.1	Management Strategy		Status	
		EXPLOIT		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
9	Inactive		Planning		
	Response Actions				
	9.1	Management Strategy		Status	
		ENHANCE		INACTIVE	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Intra/Inter Coordination
