


PMR Public Report

Operation Number	CO-L1265	Chief of Operations Validation Date	04/07/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/22/22
Last Update	03/29/22	Country Representative Validation Date	04/26/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program for the Consolidation of Private Participation Schemes in Infrastructure	Loan Number	5286/OC-CO
Executing Agency	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	Sector/Subsector	TRANSPORT-RAILWAYS
Team Leader	CRUZ MORENO, PAULA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El Programa tiene elegibilidad a partir del 03 nov/21 y \$ 192,000 en proceso de de desembolso, y ha empezado su ejecución. En la etapa de preparación se elaboró un AAS (Análisis Ambiental y Social) para evaluar la relación de los estudios de preinversión a aspectos de sostenibilidad y para el caso de los estudios vinculados con la estructuración de proyectos de infraestructura, la manera de prevenir y/o mitigar los impactos y riesgos potenciales. De conformidad a la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) el proyecto fue clasificado como Categoría “B.13” por tratarse de una operación en la cual no es posible evaluar en forma ex ante los impactos y riesgos. Además, por ser clasificado como B-13 no se requiere consulta ni divulgación de los estudios del programa previo a su aprobación en el directorio; aunque si es requerido para los proyectos específicos. La Dirección Nacional de Planeación (DNP), unidad ejecutora, tendrá la responsabilidad de la gestión ambiental y social del programa.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
CO-L1265	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	192,000	1.28%	14,808,000
Aggregated	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	192,000	1.28%	14,808,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

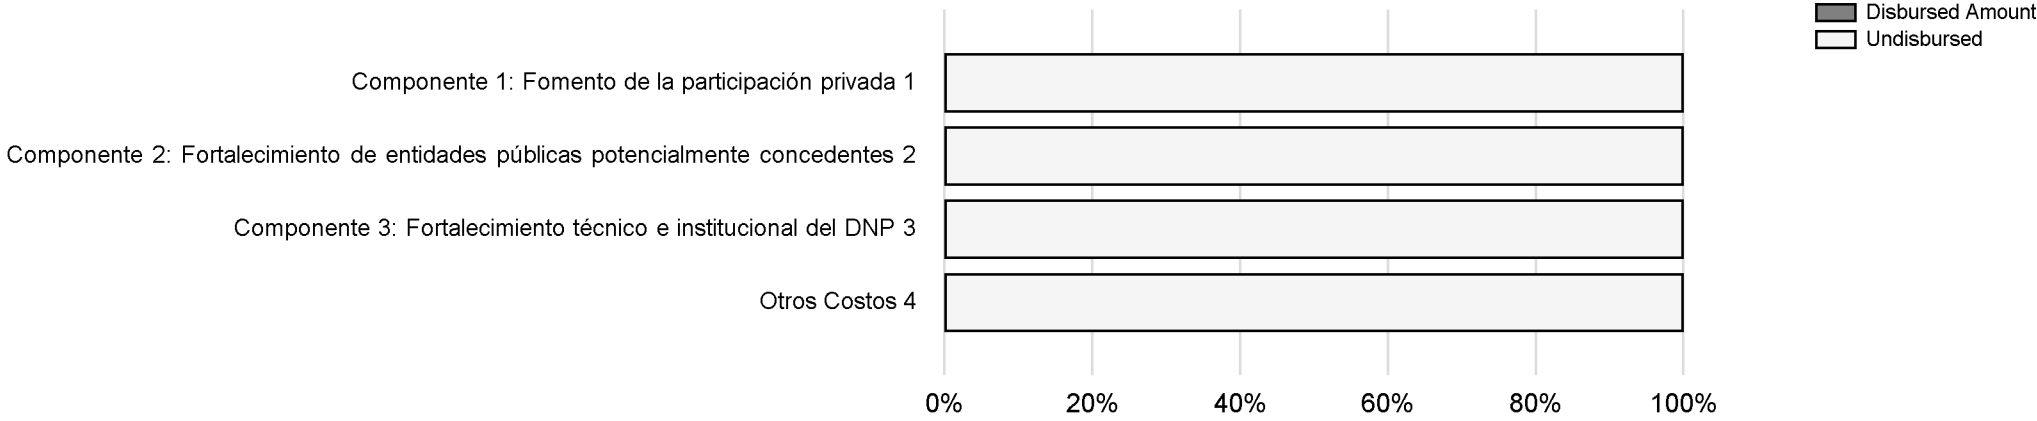

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Objetivo general de desarrollo: apoyar y promover la participación privada en el desarrollo de infraestructura pública y prestación de servicios asociados en el país.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.0	Proyectos de participación privada adjudicados para la provisión de infraestructura y prestación de servicios en los sectores de infraestructura económica y social	#	0	2020	2026	P	2
						A	-

Details

Means of Verification: SECOP

Observations: Se tendrán en cuenta todos los proyectos de APP adjudicados a nivel nacional. Responsable: DNP

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Objetivo específico 1: Reforzar el proceso de estructuración y financiamiento de proyectos de participación privada en las áreas de infraestructura económica y social

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
0.0	Proyectos de participación privada abiertos al mercado para precalificación, prepliegos o participación de terceros para la provisión de infraestructura y prestación de servicios en los sectores de infraestructura económica y social.	#	0	2020	P	-	-	-	1	1	2
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: SECOP

Observations: Se tendrán en cuenta todos los proyectos de APP publicados para precalificación, prepliegos o participación de terceros a nivel nacional Responsable: DNP.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo específico 2: Fortalecer la institucionalidad en torno a la consolidación de los mecanismos de participación privada.

Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1.0	Proyectos de participación privada estructurados que pasen a Fase II para la provisión de infraestructura y prestación de servicios en los sectores de infraestructura económica y social.	#	0	2020	P	-	-	-	1	2	3
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Se medirá con las cartas de aprobación recibidas por parte de la entidad concedente.											
Observations: Responsable: DNP											

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Fomento de la participación privada

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2026	2021	EOP 2026
1.01	C1. P1. Estudios técnicos y normativos para el fomento de la participación privada en infraestructura finalizados.	#	P	-	6	-	2,130,000
			P (a)	-	6	-	2,130,000
			A	-	-	-	-
1.02	C1.P2. Estudios relacionados con preinversión o inversión de proyectos de participación privada finalizados.	#	P	-	8	-	7,170,000
			P (a)	-	8	-	7,170,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2: Fortalecimiento de entidades públicas potencialmente concedentes

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2026	2021	EOP 2026
2.01	C2.P1. Personas capacitadas de entidades territoriales sobre esquemas de participación privada en infraestructura	#	P	-	600	-	50,000
			P (a)	-	600	-	50,000
			A	-	-	-	-
2.02	C2.P2. Personas capacitadas de entidades nacionales sobre esquemas de participación privada en infraestructura	#	P	-	310	-	198,000
			P (a)	-	310	-	198,000
			A	-	-	-	-
2.03	C2.P3. Estudios relacionados con aspectos institucionales para promover la participación privada finalizados.	#	P	-	1	59,461.61	800,000
			P (a)	-	1	59,461.61	800,000
			A	-	-	59,461.61	59,461.61
2.04	C2.P4. Guías, manuales, herramientas, indicadores o estudios sobre experiencias desarrollados para el fortalecimiento de estrategias en torno a los proyectos de participación privada, considerando aspectos de cambio climático, género y diversidad, y ambientales y sociales.	#	P	-	4	-	885,000
			P (a)	-	4	-	885,000
			A	-	-	-	-
2.05	C2.P5. Sistema de información de APP RUAPP operativo y mejorado	Sistema	P	-	1	-	567,000
			P (a)	-	1	-	567,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Componente 3: Fortalecimiento técnico e institucional del DNP

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2026	2021	EOP 2026
3.01	C3. P1. Unidad técnica para la gestión y coordinación de actividades relacionadas con participación privada.	Unidad técnica	P	1	1	6,989.03	1,710,000
			P (a)	1	1	6,989.03	1,710,000
			A	1	1	6,989.03	6,989.03
3.02	C3.P2. Capacitaciones desarrolladas para fortalecer técnicamente al equipo contratado para apoyar al Programa, a partir de las necesidades identificadas.	#	P	-	1	-	380,000
			P (a)	-	1	-	380,000
			A	-	-	-	-
3.03	C3. P3. Capacitación género y diversidad	#	P	-	1	-	10,000
			P (a)	-	1	-	10,000
			A	-	-	-	-

Other Cost

	Unidad Coordinadora contratada	P	3,022.45	672,047
		P (a)	3,022.45	672,047

	Unidad Coordinadora contratada	A	3,022.45	3,022.45
	Evaluaciones	P	0	200,000
		P (a)	0	200,000
		A	0	0
	Auditoría Financiera	P	0	227,953
		P (a)	0	227,953
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	69,473.09	15,000,000
		P (a)	69,473.09	15,000,000
		A	69,473.09	69,473.09

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Active		Planning		
	Response Actions				
	2.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
3	Active		Institutional Environment		
	Response Actions				
	3.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Political Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
8	Active		Planning		
	Response Actions				
	8.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
10	Active		Planning		
	Response Actions				
	10.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
12	Inactive		Planning		
	Response Actions				
	12.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Inactive		Legal Environment
	Response Actions		
	14.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
16	Inactive		Systems
	Response Actions		
	16.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No Information available for this Section
