

PMR Public Report

Operation Number	EC-L1236	Chief of Operations Validation Date	03/31/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/11/22
Last Update	03/29/22	Country Representative Validation Date	04/28/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support Program for the Social Inclusion of People with Disabilities in Ecuador	Loan Number	4634/OC-EC, 4634/OC-EC-1, 4634/OC-EC-2, 4634/OC-EC-3, 4634/OC-EC-4
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	PINZON ENCISO, LEONARDO ENRIQUE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Ecuador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
EC-L1236	40,081,242	40,081,242	0	0	40,081,242	40,081,242	163,204.24	0.41%	39,918,037.76
Aggregated	40,081,242	40,081,242	0	0	40,081,242	40,081,242	163,204.24	0.41%	39,918,037.76

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

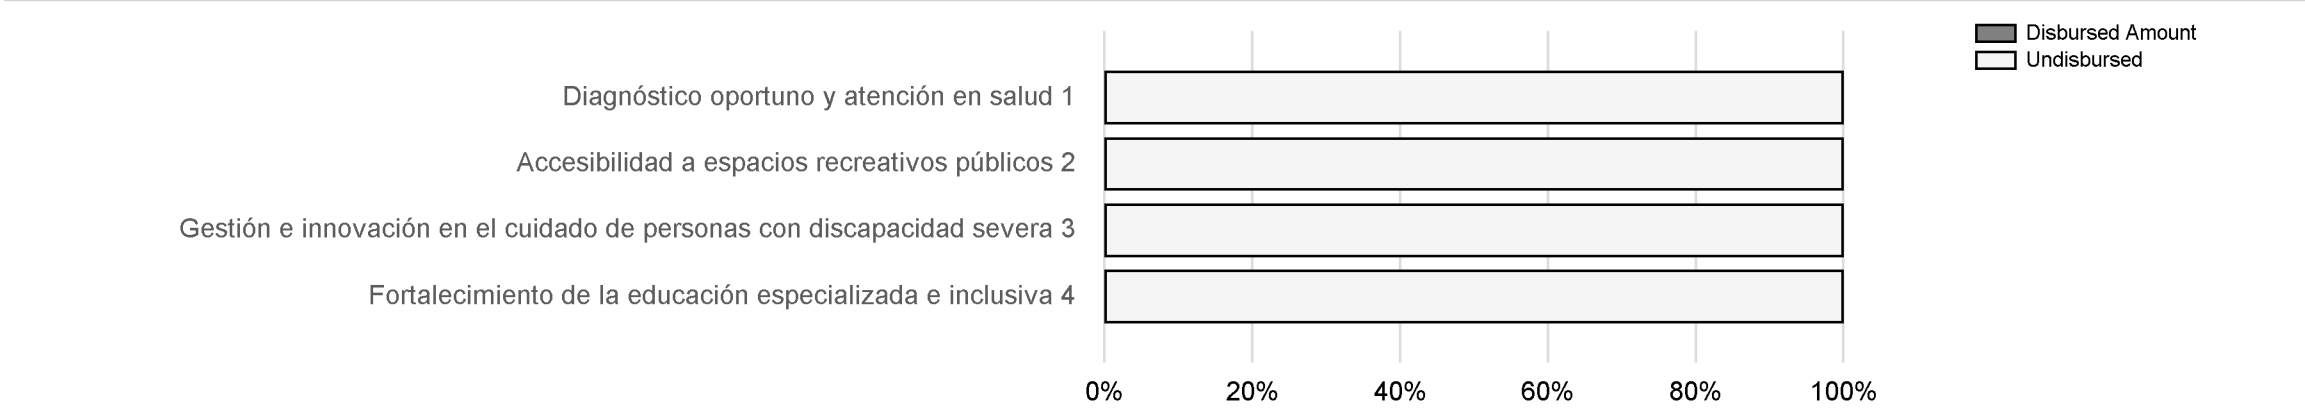

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX							
General Development Objectives							
General Development Objectives Nbr. 0: Atención oportuna en salud, educación de calidad, cuidado diario y recreación para personas con discapacidad mejorados							
Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.0	Puntaje de síndrome de sobrecarga en cuidadores de personas con discapacidad	Puntaje	59.9	2018	2024	P	58.7
						A	-
Details							
Means of Verification: Instrumento de medición de sobrecarga de cuidador Escala Zarit aplicado en la encuesta de línea de base y seguimiento de la evaluación de impacto del programa							

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.1	Porcentaje de personas con discapacidad escolarizadas, con bachillerato aprobado y acceso a educación superior		%	12	2018	2024	P	15
							A	-
Details								

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Diagnóstico temprano y calificación de la discapacidad desde primera infancia fortalecido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024
0.1	Porcentaje de Nacidos vivos con tamizaje auditivo realizado antes de 1 año de edad	%	35.5	2017	P	70	70
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reporte de la DND del MSP

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024
0.2	Porcentaje de Personas con discapacidad registradas, con necesidad de reemplazo de ayuda técnica, que fue atendida	%	0	2018	P	100	100
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reporte de la DND del MSP con base en la base de datos de prescripción de ayudas técnicas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024
0.2	Procedimientos realizados en los servicios de apoyo terapeutico (terapias de rehabilitacion)	#	1563397	2021	P	1,876,076	1,876,076
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reporte de la Dirección Nacional de Centros Especializados del MSP con base en la base de datos que serán reportados trimestralmente de acuerdo a la Clasificación CIF

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Specific Development Objectives Nbr. 1: Inclusión de niños, niñas y adultos con y sin discapacidad en espacios públicos de recreación aumentada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024
1.0	Tasa de uso de parques inclusivos en las áreas de intervención	%	0	2018	P	1.38	1.38
					A	-	-

Details

Means of Verification: Estudio en colaboración con CONADIS

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
------------	----	---------------	----	---------------	--	--	--

--	--	--

Specific Development Objectives Nbr. 2: Modelo de apoyo integral para cuidadores de Personas con Discapacidad implementado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024
2.1	"Tiempo de respiro" otorgado a cuidadores de personas con discapacidad severa	DE	0	2018	P	.56	.56
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe de la Subsecretaría de Discapacidades con base en el sistema de registro de personas sustitutas de cuidado del MIES que contemple una aplicación de registro en tiempo real de la actividad de personas sustitutas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Educación especializada e inclusiva fortalecida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024
3.0	Promedio de Grados ofrecidos por escuela especializada	Promedio	10.2	2018	P	11	11
					A	-	-

Details

Means of Verification: AMIE

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024
3.1	Porcentaje de escuelas ordinarias con inclusión de personas con discapacidad	%	45.6	2018	P	50	50
					A	-	-

Details

Means of Verification: AMIE

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024
3.2	Porcentaje de estudiantes con discapacidad con Rezago en unidades educativas especializadas	%	43	2018	P	40	40
					A	-	-

Details

Means of Verification: AMIE

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Diagnóstico oportuno y atención en salud

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
1.01	Establecimientos de salud equipados para tamizaje auditivo neonatal	Establecimientos	P	-	110	366,831	2,300,767
			P (a)	-	110	-	2,300,767
			A	-	-	-	-
1.02	Profesionales de la salud capacitados en el lineamiento de tamizaje auditivo temprano.	Personas	P	-	110	106,617	597,053
			P (a)	-	110	-	597,053
			A	-	-	-	-
1.03	Ayudas técnicas de reemplazo entregadas	Ayudas técnicas	P	-	23,028	1,548,133	7,740,667
			P (a)	-	23,028	-	7,740,667
			A	-	-	-	-
1.04	Centros Especializados de Rehabilitación Integrados (CERIS) equipados	Centros	P	-	5	-	1,625,863
			P (a)	-	5	-	1,625,863
			A	-	-	-	-
1.05	Profesionales de la salud capacitados en rehabilitación	Personas	P	-	45	-	304,000
			P (a)	-	45	-	304,000
			A	-	-	-	-
1.06	Informes técnicos y estudios presentados	informes	P	1	4	160,515	828,890
			P (a)	1	4	71,971.8	816,890
			A	1	1	26,389.66	26,389.66

Component Nbr. 2 Accesibilidad a espacios recreativos públicos

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
2.01	Parques inclusivos instalados	Parques	P	-	45	146,089	9,490,746
			P (a)	-	45	146,088.55	9,490,746
			A	-	-	-	-
2.02	Manual de uso, mantenimiento y prevención elaborado	Manual	P	-	1	-	56,000
			P (a)	-	1	-	56,000
			A	-	-	-	-
2.03	Informes técnicos y estudios presentados	informes	P	1	5	256,445	543,254
			P (a)	1	5	173,888.22	543,254
			A	1	2	80,111.53	85,282.37

Component Nbr. 3 Gestión e innovación en el cuidado de personas con discapacidad severa

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
3.01	Modelo de redes de apoyo con base en su revisión en territorio a través de prueba piloto ajustado	Modelo	P	1	1	65,000	65,000
			P (a)	-	1	-	87,360
			A	-	-	-	-
3.02	Esquema de incentivos diseñado y aprobado	Esquema	P	1	1	35,000	35,000
			P (a)	-	1	-	47,040
			A	-	-	-	-
3.03	Asistentes Principales y Suplentes para el apoyo de personas con discapacidad registrados	Personas	P	-	22,500	100,543	463,563
			P (a)	-	22,500	11,995.3	463,563
			A	-	-	-	-
3.04	Asistentes Principales de apoyo a personas con discapacidad capacitados	Personas	P	-	11,250	23,197	3,991,358
			P (a)	-	11,250	5,600	3,991,358
			A	-	-	-	-
3.05	Asistentes Suplentes de apoyo a personas con discapacidad capacitados	Personas	P	-	11,250	-	1,110,332
			P (a)	-	11,250	-	1,110,332
			A	-	-	-	-
3.06	Programa de certificación para asistentes principales y suplentes implementado	certificación	P	-	1	-	1,500,000
			P (a)	-	1	-	1,500,000
			A	-	-	-	-
3.07	Evaluación de impacto realizada	evaluación	P	-	1	195,205	924,156
			P (a)	-	1	8,396.71	924,156
			A	-	-	-	-
3.08	Informes técnicos y estudios presentados	Informe	P	1	4	56,381	681,421
			P (a)	1	3	28,788.72	647,021
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4 Fortalecimiento de la Educación Especializada e Inclusiva

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
4.01	Equipos de acompañamiento territorial contratados	Personas	P	-	36	-	2,017,513
			P (a)	4	36	109,394	2,017,513
			A	-	-	-	-
4.02	Escuelas con docentes y directivos capacitados	Escuelas	P	-	107	-	871,668
			P (a)	-	107	-	871,668
			A	-	-	-	-
4.03	Escuelas con material didáctico, tecnológico y mobiliario entregados	Escuelas	P	-	107	-	4,502,791
			P (a)	-	107	-	4,502,791
			A	-	-	-	-
4.04	Campaña inclusiva implementada	campaña	P	-	1	-	112,000
			P (a)	-	1	-	112,000
			A	-	-	-	-
4.05	Diagnóstico de educación inclusivo finalizado	Diagnóstico	P	-	1	-	112,000
			P (a)	-	1	-	112,000
			A	-	-	-	-

Other Cost					
	Evaluación Intermedia		P	0	67,200
			P (a)	0	67,200
			A	0	0
	Auditoria		P	28,000	140,000
			P (a)	15,200	152,000

	Auditoria	A	15,200	15,200
Total Cost				
	Total Cost	P	3,087,956	40,081,242
		P (a)	571,323.3	40,081,242
		A	121,701.19	126,872.03

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Esquema de incentivos diseñado y aprobado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARINAC	3/14/2022
	Establecimientos de salud equipados para tamizaje auditivo neonatal	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KARINAC	3/14/2022
	Informes técnicos y estudios presentados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARINAC	3/14/2022
					3/14/2022
			Modify Financial Historical Actual	KARINAC	3/14/2022
	Modelo de redes de apoyo con base en su revisión en territorio a través de prueba piloto ajustado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARINAC	3/14/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Political Environment
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
13	Active		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	13.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Project Design
