

PMR Public Report

Operation Number	HO-L1195	Chief of Operations Validation Date	04/29/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	05/02/22
Last Update	04/29/22	Country Representative Validation Date	05/03/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to improve the management and quality of maternal-neonatal health services	Loan Number	4619/BL-HO
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, AGENCIA ESTRATEGICA PARA EJECUCION PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	GODOY, HUGO DANILO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
HO-L1195	69,000,000	69,000,000	0	0	69,000,000	69,000,000	30,000,000	43.48%	39,000,000
Aggregated	69,000,000	69,000,000	0	0	69,000,000	69,000,000	30,000,000	43.48%	39,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

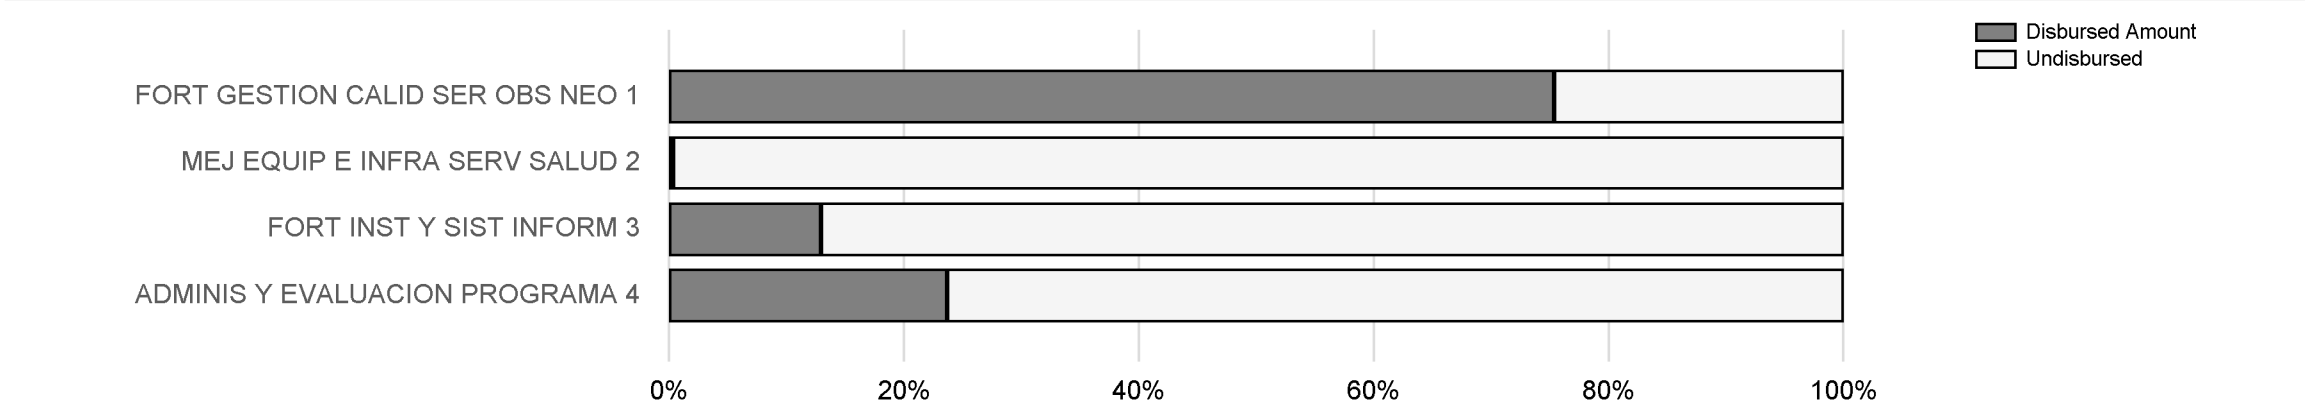

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX							
General Development Objectives							
General Development Objectives Nbr. 1: Reducción de la mortalidad materna neonatal							
Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.0	RMM a nivel Nacional	Razón por 100.000 NV	61	2015	2024	P	49
						A	-
Details							
Means of Verification: Estudio Ramos							

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.1	Tasa de letalidad neonatal por sepsis y asfixia en hospitales intervenidos			%	16.42	2019	2024	P	13.95
								A	-
Details									

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.2	Razón de muerte materna hospitalaria en los hospitales intervenidos			%	14.7	2015	2024	P	13.23
								A	-
Details									

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Incremento de la Cobertura de atención materno neonatal con enfoque de atención primaria

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	% de captación de embarazadas antes de las 12 Semanas de Gestación en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas.	%	51	2019	P	-	61
					A	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.2	Cobertura de atención prenatal con calidad, en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas.	%	24	2019	P	-	44
					A	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.3	Cobertura de atención de parto por personal calificado en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas.	%	69	2010	P	-	79
					A	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.4	Cobertura de atención a recién nacidos en los primeros tres días post parto en los últimos 12 meses, realizadas por los ESFAM y los Establecimientos de Salud	%	68	2019	P	-	83
					A	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.5	Número de ESFAM conformados y funcionando en los Municipios priorizados no descentralizados.	Numero	0	2019	P	-	20
					A	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.6	% de Redes priorizadas conformadas de acuerdo a seis atributos (asistenciales).	%	0	2019	P	-	100
					A	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejoramiento de la calidad de la atención hospitalaria de las complicaciones obstétricas neonatales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	% de complicaciones obstétricas por Trastornos Hipertensivos del Embarazo y Hemorragia atendidas de acuerdo a la norma.	%	11	2019	P	-	41
					A	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.2	% de Complicaciones neonatales por Sepsis y asfixia, manejadas de acuerdo a la norma.	%	7	2019	P	-	27
					A	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación final de desempeño del proyecto

Observations: La Línea de Base y la Evaluación final de desempeño del proyecto se hará en los expedientes de los Establecimientos de salud y los instrumentos de registro y monitoreo de las atenciones.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
1.01	Personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención, priorizando los municipios más pobres	# of beneficiaries	P	425,045	425,045	5,298,702	16,219,186
			P (a)	425,045	425,045	8,166,859	17,073,103
			A	425,045	-	6,795,627	17,073,103
1.02	Equipos de Salud Familiar (ESFAM) conformados en municipios priorizados	Equipos	P	10	20	750,000	1,500,000
			P (a)	13	20	1,243,260	2,170,084
			A	13	15	673,651	719,572
1.03	Convenios de Gestión del II nivel de atención firmados	Convenios de gestion Hospitalaria	P	3	9	1,336,690	7,434,693
			P (a)	3	8	1,671,846	3,341,110
			A	3	5	838,915	1,150,670
1.04	Convenios de Gestión a Hospitales para atención de la emergencia de COVID-19	Convenios gestion hospitalaria COVID	P	-	-	-	-
			P (a)	-	8	-	4,581,161
			A	-	8	-	4,581,161
1.05	Comités de Apoyo a Hospitales funcionando.	Convenios con comites de apoyo	P	5	6	306,946	1,158,440
			P (a)	5	6	146,121	1,881,479
			A	5	6	732,767	1,627,207
1.06	Hospitales con modelo de gestion y costeo fortalecido	Numero de hospitales	P	-	6	465,000	1,184,000
			P (a)	-	2	65,200	195,938
			A	-	-	42,596	67,711

Component Nbr. 2 Componente 2. Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
2.01	Bloque obstetrico Neonatal Hospital Occidente construido	Numero de hospitales con bloque obstetrico	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	18,560,962
			A	-	-	-	-
2.02	Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatologia de obras hospitalarias construidas.	Numero de unidades cuidados intensivos	P	-	5	6,783,390	24,221,301
			P (a)	-	4	1,563,958	5,936,000
			A	-	-	-	-
2.03	Unidades de cuidados intensivos UCIN para el cuidado neonatal y áreas de Obstetricia equipadas	Numero de unidades de cuidados intensivos	P	1	6	290,000	6,124,000
			P (a)	1	6	290,000	6,210,758
			A	-	-	-	-
2.04	Mecanismo de comunicación para el sistema de referencia en hospital occidente implementado.	Numero de hospitales	P	1	1	150,000	300,000
			P (a)	-	1	-	300,000
			A	-	-	-	-
2.05	Diseño, estudio de preinversion y supervision de las Obras elaborados	Estudios realizados	P	1	3	653,072	2,064,130
			P (a)	1	2	417,221	3,210,877
			A	-	1	-	94,050

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnologicas y Sistema de Información

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
3.01	Regiones sanitarias fortalecidas	numero de regiones sanitarias	P	6	6	270,000	540,000
			P (a)	6	12	172,500	535,347
			A	6	6	138,004	295,165
3.02	Expediente electronico y Sistema de Información en hospitales implementado	Hospital	P	-	1	-	3,000,000
			P (a)	-	1	-	1,330,625
			A	-	-	-	-
3.03	Departamento de Hospitales fortalecido en gestion de procesos y de gestores descentralizados hospitalarios.	numero de consultorias	P	-	5	360,000	835,000
			P (a)	-	7	211,000	564,881
			A	-	-	65,984	125,984
3.04	Departamentos y unidades del nivel central de la SESAL fortalecidos en el modelo de gestion descentralizado	numero de consultorias	P	2	9	603,150	1,349,250
			P (a)	2	9	888,494	1,237,675
			A	2	7	196,059	615,452
3.05	Plan Maestro de Inversion Hospitalario en Honduras elaborado	Documento	P	1	1	1,080,000	1,200,000
			P (a)	-	1	-	50,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4 Componente 4: Administración y Evaluación del Programa

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
4.01	Evaluacion de Linea Base y Evaluación Operativa elaborado	Evaluacion	P	-	2	-	300,000
			P (a)	1	2	100,000	300,000
			A	-	-	4,000	4,000
4.02	Estudio Ramos elaborado	estudio	P	-	1	-	70,000
			P (a)	-	1	-	70,000
			A	-	-	-	-
4.03	Evaluacion del Desempeno final del programa elaborado	Evaluacion	P	-	1	-	200,000
			P (a)	-	1	-	200,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Auditoria Financiera	P	30,000	100,000
		P (a)	85,479	130,000
		A	30,298	30,298
	Asistencia Tecnica para realizar un analisis de compromiso fiscal y una evaluacion de estrategias alternativas de financiamiento	P	25,000	50,000
		P (a)	0	0
		A	0	0
	Unidad ejecutora	P	368,078	828,450
		P (a)	368,565	698,458
		A	71,323	308,458
	Gastos operativos	P	150,500	321,550
		P (a)	81,831	421,542
		A	0	99,167
Total Cost				
	Total Cost	P	18,920,528	69,000,000
		P (a)	15,472,334	69,000,000
		A	9,589,224	26,791,998

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Bloque obstetrico Neonatal Hospital Occidente construido	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	3/13/2022
	Comités de Apoyo a Hospitales funcionando.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	3/13/2022
	Convenios de Gestión del II nivel de atención firmados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	3/13/2022
	Departamento de Hospitales fortalecido en gestion de procesos y de gestores descentralizados hospitalarios.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	3/13/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	HUGOG	3/13/2022
	Departamentos y unidades del nivel central de la SESAL fortalecidos en el modelo de gestion descentralizado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	3/13/2022
	Diseño, estudio de preinversion y supervision de las Obras elaborados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	3/13/2022
	Equipos de Salud Familiar (ESFAM) conformados en municipios priorizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	3/21/2022
	Expediente electronico y Sistema de Información en hospitales implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	3/13/2022
	Hospitales con modelo de gestion y costeo fortalecido	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	3/13/2022
	Personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención, priorizando los municipios más pobres	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	3/21/2022
	Plan Maestro de Inversion Hospitalario en Honduras elaborado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	3/13/2022
	Regiones sanitarias fortalecidas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	3/13/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	HUGOG	3/13/2022
	Unidades de cuidados intensivos UCIN para el cuidado neonatal y áreas de Obstetricia equipadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HUGOG	3/13/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Sustainability
	Response Actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE
	4.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Technical Design
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	12.2	Management Strategy	Status
		SHARE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions
