

PMR Public Report

Operation Number	PE-L1171	Chief of Operations Validation Date	04/07/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/27/22
Last Update	03/31/22	Country Representative Validation Date	05/06/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Improving Access to Civil Registry Services and Quality Identification at the National Level	Loan Number	4297/OC-PE
Executing Agency	REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-CIVIL REGISTRIES
Team Leader	RIVERA ARTEAGA, CESAR AUGUSTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PE-L1171	50,000,000	50,000,000	30,214,762	0	80,214,762	50,000,000	9,550,422	19.10%	40,449,578
Aggregated	50,000,000	50,000,000	30,214,762	0	80,214,762	50,000,000	9,550,422	19.10%	40,449,578

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

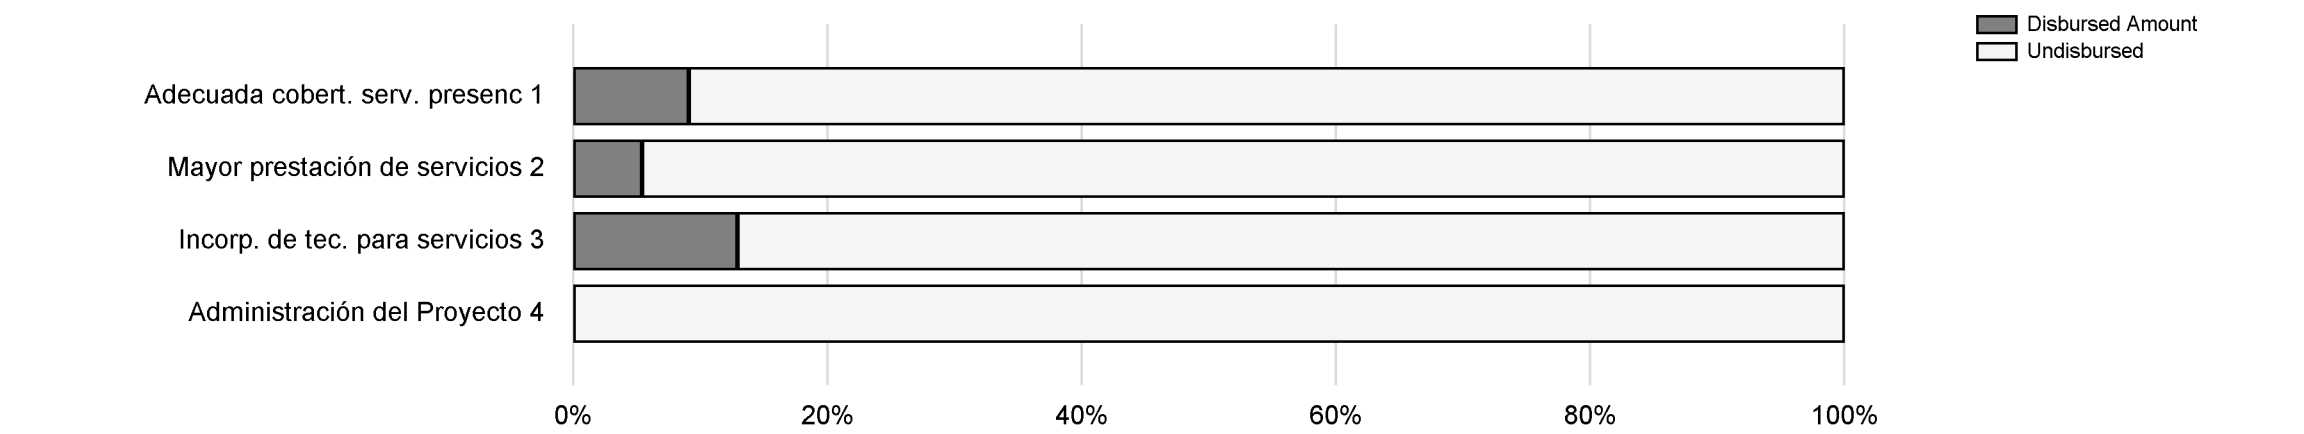

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Costo de transacción para la obtención de los Servicios Registrales y de Identificación (SRI) reducido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.0	Costo de transacción anual, unitario, derivado del cumplimiento de requisitos para inscripción y renovación del DNI	USD	9.37	2017	2024	P	6.31
						A	-
Details							

Means of Verification: Se calculará el indicador con la metodología utilizada en el Estudio de preinversión SNIP y con encuesta a usuarios (ver PME).

Observations: Esta reducción de costos se debe a la implementación de la captura en vivo (enrolamiento). Fuente: Cálculos propios basados en el estudio de preinversión SNIP. Ver Análisis Económico.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.1	Costo de transacción anual, unitario, para la obtención de copia certificada para migrantes internos			USD	54.29	2017	2024	P	5.16
								A	-
Details									

Means of Verification: Se calculará el indicador con la metodología utilizada en el Estudio de preinversión SNIP y con encuesta a usuarios (ver PME).

Observations: Los migrantes internos son el 20% de la población. Si su acta no está digitalizada, deben trasladarse a su municipio para obtenerla. La digitalización de actas elimina la necesidad de viajar. Fuente: Cálculos propios basados en el estudio de preinversión SNIP. Ver Análisis Económico.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX												
Specific Development Objectives												
Specific Development Objectives Nbr. 0: Calidad de los servicios de registro e identificación mejorada												
Observation:												
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
0.0	Número de actas registrales con errores detectadas y corregidas	#	0	2019	P	-	-	-	-	250,000	-	250,000
					A	-	-	-	-	-	-	
Details												
Means of Verification: Registros administrativos de RENIEC												
Observations: La detección de errores se dará como parte del proceso de digitalización y corrección de actas. De 63 millones de actas originalmente en papel, 14 millones ya han sido digitalizadas, habiéndose identificado una tasa de error de 7%. Se asume que esa tasa de error se va a mantener para la digitalización de los 14 millones bajo este proyecto												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
0.1	Copias certificadas de actas registrales solicitadas vía web	#	0	2017	P	-	-	-	-	255,000	-	255,000
					A	-	-	-	-	-	-	
Details												
Means of Verification: Registros administrativos de RENIEC y con encuesta a usuarios (ver PME).												
Observations: Fuente: Estudio de preinversión SNIP, pág. 1254 (682 en el pdf).												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
Specific Development Objectives Nbr. 1: Acceso a los servicios registrales y de identificación para los ciudadanos de las comunidades más aisladas mejorado												
Observation:												
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.0	DNI emitidos a partir de actas bilingües	%	0.16	2017	P	.16	-	-	-	.54	-	.54
					A	-	-	-	-	-	-	
Details												
Means of Verification: Registros administrativos de RENIEC												
Observations: Porcentaje de los DNI emitidos a partir de acta bilingüe respecto al total de DNI (se asume 5,6 millones al año).												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
Specific Development Objectives Nbr. 2: Eficiencia en la gestión de RENIEC mejorada												
Observation:												
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.0	Costo anual de envío para tramitación de DNI y de actas registrales	Miles de USD	674	2017	P	674	-	-	-	246	-	246
					A	-	-	-	-	-	-	
Details												
Means of Verification: Registros administrativos de RENIEC.												
Observations: Esta baja de costos operativos se deriva de la sustitución de envíos físicos por transmisión electrónica, habilitada por los nuevos sistemas de información. Fuente: Estudio de Preinversión SNIP, pág. 1265 y 1268 (693 y 696 respectivamente en el pdf).												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejora de la calidad de los SRI

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
1.01	Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada	Número de oficinas	P	40	200	370,358.03	820,501
			P (a)	40	200	100,124.43	1,228,679.91
			A	-	-	8,330.81	8,330.81
1.02	Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada	Número de ventanillas	P	40	150	32,897	32,897
			P (a)	-	150	-	538,371.11
			A	-	-	-	-
1.03	Actas registrales digitalizadas y revisadas	Número de actas (en millones)	P	3.5	10	8,437,580	25,319,014
			P (a)	3.5	10	1,500,000	24,009,471.15
			A	-	-	26,733.6	66,858.56
1.04	Ventanillas del RENIEC implementadas	Número de ventanillas	P	31	31	452,897	452,897
			P (a)	-	27	125,000	370,437.02
			A	-	-	-	-
1.05	Oficinas acondicionadas térmicamente	Número de oficinas	P	45	45	139,000	245,000
			P (a)	45	12	100,000	404,524
			A	-	-	50,682.17	125,313.33
1.06	Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas	Número de PVM	P	10	20	1,574,919.84	3,833,070.84
			P (a)	10	21	500,000	5,289,614.62
			A	-	-	479,122.41	677,226.17
1.07	Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada	Número de plataformas	P	1	1	35,000	1,740,000
			P (a)	-	1	32,313	1,492,349.6
			A	-	1	29,419.66	1,411,632.12
1.08	Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Número de ventanillas	P	150	450	2,122,470	2,203,897
			P (a)	150	450	250,000	2,130,583.04
			A	-	-	59,874.26	59,874.26
1.09	Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	Números de centros	P	5	5	1,479,239	1,571,798
			P (a)	5	1	2,000,000	1,108,694.37
			A	-	-	-	73,706.37
1.10	Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas	Número de campañas	P	-	1	167,142	185,714
			P (a)	-	1	50,000	102,143
			A	-	-	-	-
1.11	Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	# of public officials	P	500	1,200	179,075.2	1,237,917.2
			P (a)	500	1,200	150,000	1,144,406.98
			A	-	-	1,299.04	11,385.04
1.12	Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados	Número de oficinas	P	-	433	918,235.83	2,305,075.83
			P (a)	-	433	250,000	685,293.2
			A	-	-	-	-
1.13	Equipamiento para descentralización del sistema de impresión de DNI funcionando.	Número de impresoras	P	-	-	-	-
			P (a)	-	35	-	3,848,838
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Mejora del Acceso a los SRI a población de comunidades aisladas

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
2.01	OREC en comunidades nativas con servicios delegados	Número de OREC	P	130	300	896,528.63	1,841,867.92
			P (a)	130	300	400,000	1,215,766
			A	-	-	14,917.42	18,811.72
2.02	Unidades itinerantes equipadas	Número de unidades	P	16	16	3,364,846.04	6,768,499.01
			P (a)	-	16	250,000	5,205,727.98
			A	-	-	255,150.69	372,176.39
2.03	OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida	Número de servicios	P	500	1,000	239,348	4,953,165
			P (a)	-	1,000	50,000	4,578,452.02
			A	-	-	4,092.13	4,092.13
2.04	OREC con registro civil en lengua originaria funcionando	Número de OREC	P	200	400	264,936.17	985,572.03
			P (a)	60	400	100,000	1,239,811
			A	-	-	23,266.68	23,266.68

Component Nbr. 3 Modernización de los sistemas de gestión del RENIEC

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
3.01	Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRCI) implementado	Número de sistemas	P	-	1	6,805,697.05	13,182,723.99
			P (a)	-	1	150,000	11,278,645
			A	-	-	5,915.03	11,744.89
3.02	Sistema de información gerencial implementado	Número de sistemas	P	-	1	154,285.43	285,714
			P (a)	-	1	90,000	460,249.15
			A	-	-	23,398.32	58,447.32
3.03	PIDE en funcionamiento para acceder a las actas registrales	Número de sistemas	P	-	1	85,714	285,714
			P (a)	-	1	-	285,714.29
			A	-	-	-	-
3.04	Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado	Número de sistemas	P	-	1	4,949,437	6,749,437
			P (a)	-	2	3,000,000	7,445,155.01
			A	-	-	3,831,051.05	3,831,051.05
3.05	Servicios en línea ofrecidos	Número de plataformas	P	-	1	798,469.8	1,135,143.97
			P (a)	-	1	-	2,072,692.55
			A	-	-	-	-

Other Cost

	Evaluación	P	28,571.43	57,142
		P (a)	0	57,142
		A	0	0
	Monitoreo y Auditorías	P	57,142.85	114,285.73
		P (a)	80,000	280,000
		A	27,179.2	27,179.2
	Administración	P	1,276,881	3,832,001.48
		P (a)	1,105,910.15	3,666,287
		A	793,109.79	2,139,655.07
	Mitigación ambiental	P	0	75,714
		P (a)	10,816.29	75,714

	Mitigación ambiental	A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	34,830,671.3	80,214,762
		P (a)	10,294,163.87	80,214,762
		A	5,633,542.26	8,920,751.11

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Actas registrales digitalizadas y revisadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
	Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/24/2022
	Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/24/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ESTRELLAC	3/24/2022
	Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ESTRELLAC	3/24/2022
	Equipamiento para descentralización del sistema de impresión de DNI funcionando.	Create Output	N/A	ESTRELLAC	3/24/2022
	Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
	Oficinas acondicionadas térmicamente	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ESTRELLAC	3/24/2022
	Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
	Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/30/2022
	OREC con registro civil en lengua originaria funcionando	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
	OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
	OREC en comunidades nativas con servicios delegados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
	Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
	Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ESTRELLAC	3/24/2022
	Servicios en línea ofrecidos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
	Sistema de información gerencial implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
	Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRCI) implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
	Unidades itinerantes equipadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/30/2022
	Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
	Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
	Ventanillas del RENIEC implementadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ESTRELLAC	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ESTRELLAC	3/24/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Inactive		Political Environment		
	Response Actions				
	2.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Active		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	6.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
7	Inactive		Planning		
	Response Actions				
	7.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	10.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	11.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation
