

PMR Public Report

Operation Number	PR-L1051	Chief of Operations Validation Date	04/06/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/11/22
Last Update	04/05/22	Country Representative Validation Date	04/13/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support to Early Childhood Development	Loan Number	2667/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	OCHOA, FRANCISCO JOSE	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PR-L1051	27,000,000	27,000,000	3,000,000	0	30,000,000	27,000,000	27,000,000	100.00%	-
Aggregated	27,000,000	27,000,000	3,000,000	0	30,000,000	27,000,000	27,000,000	0.00%	-

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

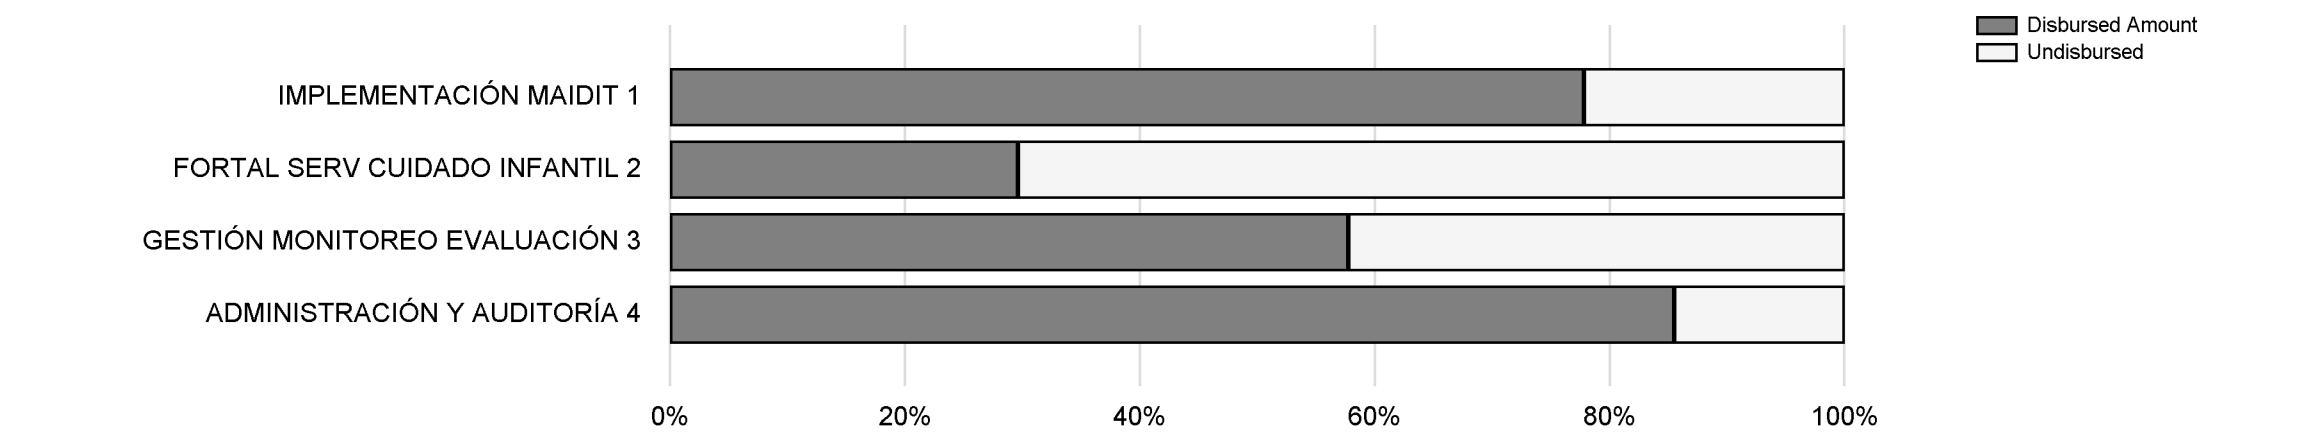

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar los niveles de desarrollo cognitivo, emocional y físico, de los niños/as menores de 5 años, detectando precozmente trastornos en el desarrollo y facilitando el acceso oportuno a intervenciones para su tratamiento.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
1.1	Niños/as con rezagos en municipios intervenidos.	% niños y niñas	10	2011	2022	P	7
						A	7

Details

Means of Verification: Exámenes psicomotores y de lenguaje

Observations: Para el seguimiento se obtendrán mediciones basadas en la evaluación de impacto del programa.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: 1. Los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de los servicios de salud, con énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano, ampliados.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	2022	EOP 2022
0.1	1.1 Niños/niñas menores de 5 años atendidos por personal calificado en DIT, bajo el programa de AIEPI.	Tasa de niños/as	0	2011	P	-	-	-	-	-	-	-	-	10
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	

Details

Means of Verification: Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	2022	EOP 2022
0.1	1.2 Niños/as menores de 5 años con rezagos identificados por personal calificado bajo el programa de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia.	% niños/ñas	0	2011	P	5	-	-	-	-	-	-	-	10
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	

Details

Means of Verification: Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.

Observations: El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator												
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	2022	EOP 2022
0.1	1.3 Niños/as menores de cinco años con tratamiento en los Servicios de Intervención Temprana.			% niños/ñas	0	2011	P	20	30	40	-	-	-	-	-	50
							A	-	-	-	-	-	-	-	-	
Details																

Means of Verification: Información administrativa del AIEPI de las USF Informe de evaluación final del programa.

Observations: El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/asque recibe tratamiento en SIT.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator												
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	2022	EOP 2022
0.1	1.4 Recién nacidos atendidos por el programa Madre Canguro.			% recién nacidos	0	2011	P	-	30	40	-	-	-	-	-	70
							A	-	-	-	-	-	-	-	-	
Details																

Means of Verification: Información administrativa hospitales.

Observations: Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programasPorcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específic

Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										

0.1	1.5 Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje de hipoacusia	% recién nacidos	0	2011	P	-	30	40	-	-	-	-	-	70
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	
Details														
Means of Verification: Información administrativa hospitales.														
Observations: Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programasPorcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos especfic														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	2022	EOP 2022	
0.1	1.6 Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje visual.	% recién nacidos	0	2011	P	-	30	40	-	-	-	-	-	70
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	
Details														
Means of Verification: Información administrativa hospitales.														
Observations: Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programasPorcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos especfic														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
Specific Development Objectives Nbr. 1: 2. Los servicios de los centros de desarrollo infantil articulados y fortalecidos.														
Observation:														
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	2022	EOP 2022	
1.1	2.1 Número de centros aplicando protocolos con estándares de calidad.	% centros	10	2011	P	15	20	25	-	-	-	-	-	30
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	
Details														
Means of Verification: Encuesta específica al final de ejecución.														
Observations: La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada por SPH con base en el KCP 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Numerados: Establecimientos aplicando protocolos. Denominador: total de establecimientos.														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2021	2022	EOP 2022	
1.1	2.2 Personal de centros infantiles calificados según currículo vigente.	% personal	10	2011	P	15	20	25	-	-	-	-	-	30
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	
Details														
Means of Verification: Encuesta específica al final de ejecución.														
Observations: Se mide a través de encuestas de conocimiento: La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada por SPH con base en el 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Denominador total de personal de los establecimient														

Component Nbr. 1 1. Implementación del Modelo de Atención Integral de Desarrollo Infantil Temprano

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
1.01	1.2.1 Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el Programa (de acuerdo con mapeo)	SIT	P	-	10	-	8,475,235
			P (a)	16	16	2,037,294	2,175,183.87
			A	1	1	358,599.3	491,720.23
1.02	1.3.1 Hospital de referencia Acosta Ñu fortalecido	Hospital	P	-	1	-	2,255,221
			P (a)	-	1	-	1,063,640.64
			A	-	1	-	1,063,640.64
1.03	1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención materno-infantil del programa.	Establecimientos	P	-	12	-	3,226,174
			P (a)	5	15	30,000	24,597.53
			A	15	15	24,597.53	24,597.53
1.04	1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales y materno-infantil	Establecimientos	P	-	11	-	2,639,848
			P (a)	9	30	140,000	186,241
			A	9	30	-	186,241
1.05	1.1.2 USF estándar, rehabilitados con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF estándar	P	-	167	-	3,678,615
			P (a)	1	9	391,854.38	1,679,867.95
			A	1	9	390,596.23	1,679,867.95
1.06	1.1.3 USF ampliadas con infraestructura, equipamiento y materiales	USF ampliada	P	-	-	-	-
			P (a)	-	3	270,053.46	845,352.7
			A	-	3	43,174.56	845,352.7
1.07	1.1.4 MAIDIT completado en los tres niveles de atención con los manuales para su implementación	Documentos	P	-	-	-	-
			P (a)	-	10	-	898,217.39
			A	-	10	-	898,217.39
1.08	1.1.5 Personal sanitario y agentes comunitarios capacitados en DIT en el primer nivel de atención	Persona	P	-	-	-	-
			P (a)	150	2,361	354,090.71	705,622.93
			A	332	2,361	110,673.7	664,859.93
1.09	1.1.6 Encuesta Indicadores Múltiples Conglomerados (MICS) realizada	Encuesta	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	492,590.08
			A	-	1	-	492,590.08
1.10	1.2.2 Personal sanitario capacitados en DIT en el segundo nivel de atención.	Persona	P	-	-	-	-
			P (a)	30	150	50,000	65,533.69
			A	36	150	47,279.47	65,533.69
1.11	1.3.4 Personal sanitario capacitados en DIT en el tercer nivel de atención	Persona	P	-	-	-	-
			P (a)	10	190	50,000	75,607.16
			A	126	190	55,336.84	75,607.16
1.12	1.1.1. Agentes comunitarios incorporados a las USF para la implementación del MAIDIT	Agentes comunitarios	P	-	-	-	-
			P (a)	-	137	-	4,065,387.03
			A	-	-	-	4,065,387.03
1.13	1.1.2 USF estándar, ampliados con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF estándar	P	-	-	-	-
			P (a)	22	63	5,200,381.54	10,711,759.5
			A	17	63	3,730,744.22	8,854,056.66
1.14	1.1.2 USF estándar, reconstruidos con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF estándar	P	-	-	-	-
			P (a)	-	22	-	3,835,699.91
			A	-	22	359,788.01	3,462,968.21

Component Nbr. 2 2. Fortalecimiento de Servicios complementarios de atención infantil.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
2.01	2.1. Normativas estandarizadas aprobadas por el MEC, SNNA y MSPBS.	Proyecto de Normativa	P	-	1	-	388,000
			P (a)	-	1	-	15,628.39
			A	-	1	-	15,628.39
2.02	2.2. Centros de cuidado infantil CEBINFA del MSPyBS, fortalecidos.	Establecimientos	P	-	31	-	1,188,519
			P (a)	32	32	528,187	587,512.17
			A	-	-	68,796.75	272,585.22

Component Nbr. 3 3. Gestión de los programas de DIT, Monitoreo y Evaluación

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
3.01	3.1. Modelos descentralizados para la protección de los derechos del niño implementados en los municipios del programa.	Municipios	P	-	20	-	61,000
			P (a)	20	20	300,000	259,726.39
			A	15	15	87,847.24	87,847.24
3.02	3.3 Sistema de información gerencial de DIT con enfoque de red implementado en el MSPyBS.	Sistema	P	-	1	-	130,000
			P (a)	-	1.7	-	378,119.38
			A	-	1.7	-	378,119.38
3.03	3.4 Evaluaciones del programa realizado (mediciones)	Evaluaciones	P	-	2	-	640,000
			P (a)	-	2	50,000	53,254.3
			A	-	2	7,054.59	25,308.89

Other Cost				
	Fortalecimiento Institucional del MSPyBS Administracion y Auditoría	P		1,318,258
		P (a)	255,257.13	1,805,457.99
		A	322,007.36	1,640,153.21
	Imprevistos	P		63,900
		P (a)	0	75,000
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P		30,000,000
		P (a)	9,657,118.22	30,000,000
		A	5,606,495.8	25,290,282.53

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	1.1.2 USF estándar, ampliados con infraestructura, equipamiento y materiales.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOAC	3/11/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ROCIOAC	3/3/2022
	1.1.2 USF estándar, reconstruidos con infraestructura, equipamiento y materiales.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOAC	3/9/2022
	1.1.2 USF estándar, rehabilitados con infraestructura, equipamiento y materiales.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOAC	3/9/2022
	1.1.5 Personal sanitario y agentes comunitarios capacitados en DIT en el primer nivel de atención	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOAC	3/11/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ROCIOAC	3/3/2022
	1.2.1 Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el Programa (de acuerdo con mapeo)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOAC	3/11/2022
	1.2.2 Personal sanitario capacitados en DIT en el segundo nivel de atención.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOAC	3/9/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ROCIOAC	3/9/2022
	1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención materno-infantil del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOAC	3/9/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ROCIOAC	3/3/2022
	1.3.4 Personal sanitario capacitados en DIT en el tercer nivel de atención	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOAC	3/9/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ROCIOAC	3/3/2022
	2.2. Centros de cuidado infantil CEBINFA del MSPyBS, fortalecidos.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOAC	3/11/2022
	3.1. Modelos descentralizados para la protección de los derechos del niño implementados en los municipios del programa.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOAC	3/11/2022
	3.4 Evaluaciones del programa realizado (mediciones)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOAC	3/11/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Planning
	Response Actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
10	Inactive		Institutional Environment		
	Response Actions				
	10.1	Management Strategy		Status	
		ACCEPT		INACTIVE	
	10.2	Management Strategy		Status	
		ACCEPT		INACTIVE	
	10.3	Management Strategy		Status	
		ACCEPT		INACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Legal Environment
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE
	12.2	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE
	12.3	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
14	Inactive		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	14.1	Management Strategy		Status	
		ACCEPT		INACTIVE	
	14.2	Management Strategy		Status	
		ACCEPT		INACTIVE	
	14.3	Management Strategy		Status	
		ACCEPT		INACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE
	15.2	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE
	15.3	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
17	Inactive		Planning		
	Response Actions				
	17.1	Management Strategy		Status	
		ACCEPT		INACTIVE	
	17.2	Management Strategy		Status	
		ACCEPT		INACTIVE	
	17.3	Management Strategy		Status	
		ACCEPT		INACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
20	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	20.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE
	20.2	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE
	20.3	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
22	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	22.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		SHARE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
25	Materialized		Organizational Structure		
	Response Actions				
	25.1	Management Strategy		Status	
		ACCEPT		INACTIVE	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
