

PMR Public Report

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|----------|
| Operation Number | PE-L1231 | Chief of Operations Validation Date | 04/07/22 |
| Year- PMR Cycle | Second period Jan-Dec 2021 | Division Chief Validation Date | 04/13/22 |
| Last Update | 03/25/22 | Country Representative Validation Date | 05/06/22 |
| PMR Validation Stage | Validated by Representative | | |

Basic Data

Operation Profile

| | | | |
|--------------------|---|----------------------------------|---|
| Operation Name | Project to Boost Efficiency in Public Investment Management and Public Procurement | Loan Number | 4428/OC-PE, 4428/OC-PE-1, 4428/OC-PE-2 |
| Executing Agency | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO , MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | Sector/Subsector | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH |
| Team Leader | PEREZ RINCON, BELINDA | Overall Stage | Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed) |
| Operation Type | Loan Operation | Country | Peru |
| Lending Instrument | Investment Loan | Convergence related Operation(s) | |
| Borrower | REPUBLICA DEL PERU | | |


Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|--|---|---|----|
| Impacts Category | C | Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Safeguard Performance Rating | | Date of approval | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale | | | |

Financial Data

| | Total Cost and Source | | | | | Available Funds (US\$) | | | |
|------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| Operations | Original IDB | Current IDB | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disbursed | Undisbursed Amount |
| PE-L1231 | 65,000,000 | 65,000,000 | 8,750,000 | 0 | 73,750,000 | 65,000,000 | 13,575,779.13 | 20.89% | 51,424,220.87 |
| Aggregated | 65,000,000 | 65,000,000 | 8,750,000 | 0 | 73,750,000 | 65,000,000 | 13,575,779.13 | 20.89% | 51,424,220.87 |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

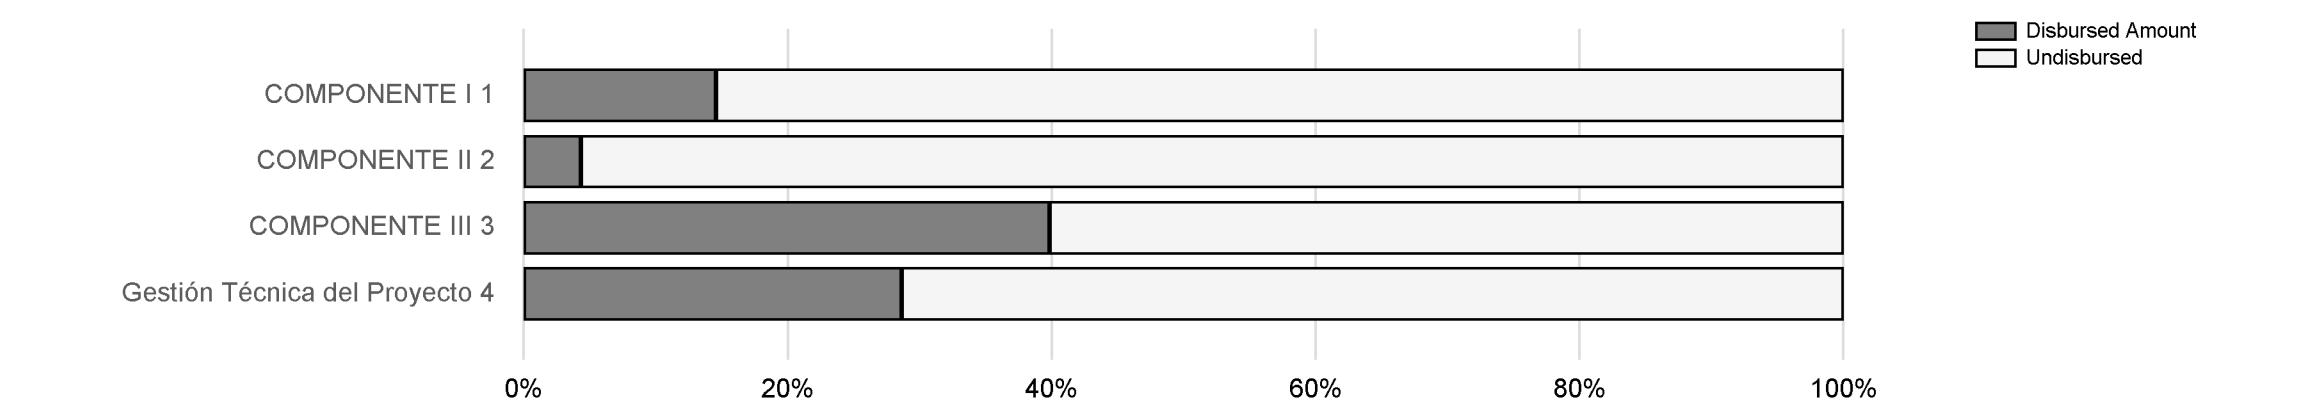

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

| RESULTS MATRIX | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|----|---------------|---------------|------------------------------|----------|----|
| General Development Objectives | | | | | | | | |
| General Development Objectives Nbr. 0: Disminuir las brechas de inversión (cobertura de servicios e infraestructura) en los sectores salud, educación, agua y saneamiento y transporte | | | | | | | | |
| Observation: Las brechas de mediano plazo de estos sectores alcanzan 20% del PIB (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, 2015) | | | | | | | | |
| Indicator | | Unit of Measure | | Baseline | Baseline Year | Expected Year of Achievement | EOP 2024 | |
| 0.0 | Población con acceso a seguro de salud. | | % | 73 | 2015 | 2024 | P | 93 |
| | | | | | | | A | - |
| Details | | | | | | | | |
| Means of Verification: Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0) | | | | | | | | |
| Observations: | | | | | | | | |
| The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No | | | | | | | | |
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | | | | |
| | | | | | | | | |
| Indicator | | Unit of Measure | | Baseline | Baseline Year | Expected Year of Achievement | EOP 2024 | |
| 0.1 | Tasa neta de matrícula escolar de la población de 3-5 años de edad a educación inicial. | | % | 80.1 | 2015 | 2024 | P | 96 |
| | | | | | | | A | - |
| Details | | | | | | | | |
| Means of Verification: Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0) | | | | | | | | |
| Observations: | | | | | | | | |
| The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No | | | | | | | | |
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | | | | |
| | | | | | | | | |
| Indicator | | Unit of Measure | | Baseline | Baseline Year | Expected Year of Achievement | EOP 2024 | |
| 0.2 | Tasa de acceso a agua potable. | | % | 83.8 | 2015 | 2024 | P | 98 |
| | | | | | | | A | - |
| Details | | | | | | | | |
| Means of Verification: Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0) | | | | | | | | |
| Observations: | | | | | | | | |
| The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No | | | | | | | | |
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | | | | |
| | | | | | | | | |
| Indicator | | Unit of Measure | | Baseline | Baseline Year | Expected Year of Achievement | EOP 2024 | |
| 0.3 | Red Vial Nacional (RVN) pavimentada. | | % | 87.7 | 2014 | 2024 | P | 95 |
| | | | | | | | A | - |
| Details | | | | | | | | |

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

| | | | | | |
|------------|----|---------------|----|---------------|--|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Incremento del porcentaje de proyectos formulados alineados con la reducción de brechas.

Observation: Línea Base: Monto de proyectos ejecutados (devengados) alineados con cadenas priorizadas de la inversión pública = S/. 19.645 millones. Monto total de proyectos ejecutados (devengados) = S/. 27.816 millones. Se tomó como proxy de alineamiento a brechas, a los proyectos de inversión pública que están alineados a las cadenas de gasto presupuestal (función-programa-subprograma) priorizadas por brechas, según lo definido por cada sector. Fuente: DGIP.

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2024 | EOP 2024 |
|-----|--|-----------------|----------|---------------|---|------|----------|
| 0.0 | Monto de proyectos ejecutados alineados con brechas / Monto total de proyectos ejecutados. | % | 70.6 | 2016 | P | - | 85 |
| | | | | | A | - | - |

Details

Means of Verification: Nota de verificación de la DGIP

Observations:

Evaluation Methodology: -

| | | | | | |
|------------|----|---------------|----|---------------|--|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

Specific Development Objectives Nbr. 1: Aumento del porcentaje de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública.

Observation: Línea Base: # de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública = 0 funcionarios. Total de funcionarios a ser inscritos en el programa integral de capacitación = 2.720 funcionarios. La capacitación del programa estará dirigida a funcionarios de la DGIP, y OPMI, UF y UE de 4 sectores prioritarios (educación, salud, transporte, y agua y saneamiento) de ministerios de línea y los 26 GR. Se espera capacitar a un total de 2.720 funcionarios al final del programa, y certificar al 65% del total de inscritos capacitados. Fuente: DGIP.

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2024 | EOP 2024 |
|---------|---|-----------------|----------|---------------|---|------|----------|
| 1.0 | Número de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública / Total de funcionarios inscritos en el programa de capacitación integral del sistema de inversión pública | % | 0 | 2016 | P | - | 65 |
| | | | | | A | - | - |
| Details | | | | | | | |

Means of Verification: Nota de verificación de la DGIP

Observations:

Evaluation Methodology: -

| | | | | | |
|------------|----|---------------|----|---------------|--|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

Specific Development Objectives Nbr. 2: Aumento del porcentaje de funcionarios mujeres con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública.

Observation: Línea Base: # de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de contrataciones públicas = 0 funcionarios. Total de funcionarios a ser inscritos en el programa de capacitación = 600 funcionarios. Fuente: OSCE.

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | 2024 | | EOP 2024 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|---|----------|
| 2.0 | Número de funcionarias mujeres con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública / Total de funcionarios inscritos en el programa de capacitación integral del sistema de inversión pública | % | 0 | 2016 | P | - | 35 |
| | | | | | A | - | - |

Details

Means of Verification: Nota de verificación de la DGIP

Observations:

Evaluation Methodology: -

| | | | | | |
|------------|-----|---------------|----|---------------|--|
| Pro-Gender | Yes | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

Specific Development Objectives Nbr. 3: Aumento del porcentaje de funcionarios con conocimientos certificados en contrataciones públicas.

Observation: Línea Base: # de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de contrataciones públicas = 0 funcionarios. Total de funcionarios a ser inscritos en el programa de capacitación = 600 funcionarios. Fuente: OSCE.

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | 2024 | | EOP 2024 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|---|----------|
| 3.0 | Número de funcionarios con conocimientos certificados en contrataciones públicas / Total de funcionarios inscritos en el programa de capacitación en contrataciones públicas | % | 0 | 2016 | P | - | 65 |
| | | | | | A | - | - |

Details

Means of Verification: Informe OSCE

Observations:

Evaluation Methodology: -

| | | | | | |
|------------|----|---------------|----|---------------|--|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

Specific Development Objectives Nbr. 4: Incremento de la tasa de ejecución de la inversión pública.

Observation: Línea Base: Gasto devengado = S/ 27,2 mil millones. Gasto presupuestado (PIM) = S/ 39,8 mil millones. Fuente: Portal de Consulta amigable.

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | 2024 | | EOP 2024 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|---|----------|
| 4.0 | Gasto devengado / Presupuesto institucional modificado de inversión pública. | % | 68 | 2016 | P | - | 80 |
| | | | | | A | - | - |

Details

Means of Verification: Portal de Consulta Amigable

Observations:

Evaluation Methodology: -

| | | | | | |
|------------|----|---------------|----|---------------|--|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

Specific Development Objectives Nbr. 5: Reducción de la incidencia de retrasos en la ejecución de proyectos de inversión pública.

Observation: Línea Base: Toma en consideración el universo de proyectos finalizados entre 2014 y 2016. Fuente: DGIP.

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2024 | EOP 2024 |
|---------|--|-----------------|----------|---------------|---|------|----------|
| 5.0 | # de proyectos finalizados con retraso / # de proyectos finalizados. | % | 72 | 2016 | P | - | 59 |
| | | | | | A | - | - |
| Details | | | | | | | |

Means of Verification: Nota de verificación de la DGIP

Observations:

Evaluation Methodology: -

| | | | | | |
|------------|----|---------------|----|---------------|--|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

Specific Development Objectives Nbr. 6: Reducción de la incidencia de sobrecostos en la ejecución de proyectos de inversión pública.

Observation: Línea Base: Toma en consideración proyectos finalizados entre 2014 y 2016. Fuente: DGIP.

| | Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2024 | EOP 2024 |
|---------|--|-----------------|----------|---------------|---|------|----------|
| 6.0 | # de proyectos finalizados con sobrecostos / Número de proyectos finalizados. | % | 45 | 2016 | P | - | 37 |
| | | | | | A | - | - |
| Details | | | | | | | |

Means of Verification: Nota de verificación de la DGIP

Observations:

Evaluation Methodology: -

| | | | | | |
|------------|----|---------------|----|---------------|--|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator | |
| | | | | | |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejora de la capacidad del marco institucional

| | | | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|------|---|---------------------------|-------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | Output | Unit of Measure | | 2021 | EOP 2024 | 2021 | EOP 2024 |
| 1.01 | Documento con el marco institucional de Invierte.pe implementado | Documento | P | 1 | 5 | 203,257.33 | 1,091,170.33 |
| | | | P (a) | 6 | 11 | 197,279 | 1,139,602 |
| | | | A | 6 | 6 | 258,256 | 270,969 |
| 1.02 | Documento con el modelo de levantamiento de información, que incluye el Plan Nacional de Infraestructura, para la identificación, valorización y proyección de las brechas de inversión, implementado. | Documento | P | 2 | 10 | 785,581.68 | 4,527,432.11 |
| | | | P (a) | 3 | 14 | 944,367 | 4,527,433 |
| | | | A | 3 | 3 | 456,856 | 456,856 |
| 1.03 | Documento con la metodología de formulación, monitoreo y evaluación ex post de proyectos implementado | Documento | P | 2 | 11 | 101,715.45 | 962,159.38 |
| | | | P (a) | 6 | 11 | 98,724 | 862,212 |
| | | | A | 6 | 6 | 394,117 | 454,484 |
| 1.04 | Norma publicada que aprueba la metodología de programación multianual | Documento | P | 1 | 2 | 4,106.67 | 12,320 |
| | | | P (a) | - | 1 | 3,986 | 63,832 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 1.05 | Documento con el modelo para la actualización y mejora de los parámetros de evaluación social | Documento | P | 7 | 35 | 454,831.21 | 2,909,086.36 |
| | | | P (a) | 7 | 18 | 441,454 | 2,909,086 |
| | | | A | 2 | 3 | 141,891 | 219,611 |
| 1.06 | Documento con el modelo de gestión de activos públicos no financieros para los sectores prioritarios implementado. | Documento | P | 2 | 10 | 570,064.98 | 2,928,328.17 |
| | | | P (a) | - | 4 | 553,298 | 2,928,328 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 1.07 | Documento con mecanismos para promover una mayor participación de proveedores en los procesos de contratación pública implementado. | Documento | P | 0.3 | 1 | 251,500 | 849,187 |
| | | | P (a) | 0.2 | 1 | 153,783.78 | 728,622.24 |
| | | | A | 0.12 | 0.42 | 92,438 | 300,799.24 |
| 1.08 | Servicio de actualización del portal de OSCE | Servicio de actualización | P | 1 | 2 | 100,000 | 326,400 |
| | | | P (a) | 0.29 | 2 | 13,513.51 | 129,712.22 |
| | | | A | 0.32 | 0.32 | 14,835 | 57,322.22 |
| 1.09 | Documento con el modelo de planificación de requerimientos en compras y contrataciones públicas considerando los enfoques de eficiencia, eficacia y transparencia, incluyendo productos innovadores, implementado | Documento | P | 0.4 | 1 | 359,200 | 780,054 |
| | | | P (a) | 0.36 | 1 | 344,430.64 | 1,474,985.99 |
| | | | A | 0.3 | 0.4 | 288,640 | 794,090.99 |
| 1.10 | Software del sistema de documentos estándar y de consulta de precios de referencia para contrataciones y adquisiciones para la formulación y ejecución de proyectos implementado | Software | P | 1 | 1 | 183,190 | 183,190 |
| | | | P (a) | 1 | 1 | 183,190 | 12,000 |
| | | | A | 0.07 | 0.07 | 12,000 | 12,000 |

Component Nbr. 2 Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de la inversión pública interoperable con otros sistemas de gestión de las finanzas públicas

| | | | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|------|--|-----------------|-------|-------------------|----------|--------------------|---------------|
| | Output | Unit of Measure | | 2021 | EOP 2024 | 2021 | EOP 2024 |
| 2.01 | Base de datos del Banco de Inversiones implementada | Documento | P | 2 | 10 | 80,440 | 665,094.25 |
| | | | P (a) | 8 | 18 | 78,074 | 665,094 |
| | | | A | 6 | 11 | 214,294 | 375,282 |
| 2.02 | Sistema informático para la gestión del ciclo de inversión pública implementado | Documento | P | 5 | 23 | 2,111,276.33 | 10,900,094.54 |
| | | | P (a) | 2 | 11 | 1,049,180 | 10,900,095 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 2.03 | Servicio de actualización del portal Invierte.pe | Documento | P | - | 4 | - | 86,240 |
| | | | P (a) | 1 | 3 | - | 143,423 |
| | | | A | 1 | 3 | 2,591 | 143,423 |
| 2.04 | Sistema informático off-the-shelf para la gestión transaccional de todo el ciclo de contrataciones públicas, interoperable con otros sistemas de gestión gubernamental, implementado | Software | P | 0.1 | 1 | 1,224,663 | 9,696,753.2 |
| | | | P (a) | 0.47 | 1 | 956,153.09 | 9,677,765.88 |
| | | | A | 0.28 | 0.35 | 574,456 | 681,340.88 |
| 2.05 | Módulo de Inteligencia de Negocios integrado al sistema informático de contrataciones públicas implementado | Software | P | 0.2 | 1 | 65,212 | 301,212 |
| | | | P (a) | 0.2 | 1 | 40,662.17 | 218,440.82 |
| | | | A | 0.11 | 0.51 | 21,991 | 143,740.82 |
| 2.06 | Mesa de ayuda inteligente para el apoyo y soporte a los usuarios del sistema de contrataciones públicas implementado | Software | P | 0.25 | 1 | 82,500 | 324,740 |
| | | | P (a) | 0.39 | 1 | 162,162.16 | 382,166.94 |
| | | | A | - | 0.24 | - | 102,166.94 |
| 2.07 | Equipamiento de soporte del sistema informático de contratación pública implementado | Equipamiento | P | 0.1 | 1 | 160,000 | 2,160,828.72 |
| | | | P (a) | 0.33 | 1 | 107,782.12 | 2,579,751.62 |
| | | | A | 0.2 | 0.2 | 64,243 | 98,455.62 |
| 2.08 | Aplicación informática con instrumentos de apoyo a la gestión de las inversiones públicas implementada | Documento | P | - | 8 | - | 893,586.97 |
| | | | P (a) | - | 8 | - | 893,587 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 2.09 | Sistema informático off-the-shelf para la gestión del inventario de activos públicos implementado | Documento | P | 4 | 17 | 841,296 | 4,243,440 |
| | | | P (a) | - | 8 | 816,552 | 4,243,440 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 2.10 | Laboratorio de innovación en gestión de la inversión pública integrado con plataforma tecnológica de sistema Invierte.pe implementado | Documento | P | 5 | 22 | 78,655.16 | 723,339.08 |
| | | | P (a) | - | 10 | 76,342 | 723,339 |
| | | | A | - | - | - | - |
| 2.11 | Plataforma tecnológica para el funcionamiento de los sistemas informáticos y aplicativos de apoyo a Invierte.pe implementada | Documento | P | 8 | 32 | 506,072.06 | 2,804,732.73 |
| | | | P (a) | 2 | 14 | 491,188 | 2,747,550 |
| | | | A | 2 | 2 | 56,676 | 56,676 |
| 2.12 | Mesa de ayuda inteligente y multicanal para el apoyo y soporte a los usuarios del sistema implementada | Documento | P | 3 | 7 | 156,960 | 433,920 |
| | | | P (a) | - | 3 | 152,344 | 433,920 |
| | | | A | - | - | - | - |

Component Nbr. 3 Mejora de la capacidad del capital humano

| | | | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|------|--|-----------------|-------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | Output | Unit of Measure | | 2021 | EOP 2024 | 2021 | EOP 2024 |
| 3.01 | Documento de la estrategia global de la gestión del capital humano (incluye el diagnóstico de las brechas de conocimiento y perfiles, la estrategia de reclutamiento de operadores mujeres, y el modelo de certificación de especialistas externos) implementado | Documento | P | - | 25 | - | 615,454.24 |
| | | | P (a) | 1 | 15 | - | 615,684 |
| | | | A | 1 | 1 | 15,013 | 45,808 |
| 3.02 | Funcionarios inscritos en el programa de capacitación integral y sostenible para la inversión en capital humano | Documento | P | 8 | 34 | 1,367,509.22 | 6,985,419.06 |
| | | | P (a) | 4 | 19 | 927,288 | 5,245,450 |
| | | | A | 1 | 1 | 81,951 | 81,951 |
| 3.03 | Documento del programa de gestión del cambio para todo el ciclo del proyecto implementado | Documento | P | 5 | 22 | 189,234.46 | 1,194,518.48 |
| | | | P (a) | 1 | 12 | 183,669 | 1,194,903 |
| | | | A | 1 | 1 | 25,155 | 69,998 |
| 3.04 | Documento con la estrategia de fortalecimiento y certificación de capacidades profesionales en contrataciones públicas (incluye el diagnóstico de las brechas de conocimiento y desarrollo de perfiles) implementada | Documento | P | 0.3 | 1 | 300,520 | 1,502,590 |
| | | | P (a) | 0.17 | 1 | 261,557.98 | 1,211,537.73 |
| | | | A | 0.16 | 0.16 | 239,655 | 445,680.73 |
| 3.05 | Documento para la estrategia de acompañamiento in situ de las actividades de asistencia técnica para los tres niveles de gobierno implementado | Documento | P | 2 | 15 | 48,320.43 | 5,020,062.38 |
| | | | P (a) | 5 | 14 | 46,899 | 6,759,417 |
| | | | A | 4 | 8 | 1,884,194 | 5,328,301 |

Component Nbr. 4 Gestión técnica y administrativa

| | | | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|------|-----------------------------|-----------------|-------|-------------------|----------|--------------------|---------------|
| | Output | Unit of Measure | | 2021 | EOP 2024 | 2021 | EOP 2024 |
| 4.01 | Administración del proyecto | Informe | P | 1 | 5 | 2,421,220.6 | 10,628,647 |
| | | | P (a) | 1 | 5 | 1,863,675 | 10,773,610.79 |
| | | | A | 1 | 3 | 1,532,727 | 3,677,885.79 |

| Total Cost | | | | | |
|------------|------------|--|-------|---------------|---------------|
| | Total Cost | | P | 12,647,326.58 | 73,750,000 |
| | | | P (a) | 10,147,554.45 | 74,184,989.23 |
| | | | A | 6,371,979 | 13,816,842.23 |

CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name | Type of Change | Sub type | Modified By | Entered in System |
|---------|--|----------------|---|-------------|-------------------|
| Output | Administración del proyecto | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/15/2022 |
| | Aplicación informática con instrumentos de apoyo a la gestión de las inversiones públicas implementada | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/14/2022 |
| | Base de datos del Banco de Inversiones implementada | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/14/2022 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SCOLQUI | 3/18/2022 |
| | Documento con el marco institucional de Invierte.pe implementado | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/14/2022 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SCOLQUI | 3/21/2022 |
| | Documento con el modelo de gestión de activos públicos no financieros para los sectores prioritarios implementado. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/14/2022 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SCOLQUI | 3/14/2022 |
| | Documento con el modelo de levantamiento de información, que incluye el Plan Nacional de Infraestructura, para la identificación, valorización y proyección de las brechas de inversión, implementado. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/14/2022 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SCOLQUI | 3/21/2022 |
| | Documento con el modelo de planificación de requerimientos en compras y contrataciones públicas considerando los enfoques de eficiencia, eficacia y transparencia, incluyendo productos innovadores, implementado | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/15/2022 |
| | Documento con el modelo para la actualización y mejora de los parámetros de evaluación social | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/14/2022 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SCOLQUI | 3/21/2022 |
| | Documento con la estrategia de fortalecimiento y certificación de capacidades profesionales en contrataciones públicas (incluye el diagnóstico de las brechas de conocimiento y desarrollo de perfiles) implementada | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/15/2022 |
| | Documento con la metodología de formulación, monitoreo y evaluación ex post de proyectos implementado | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/14/2022 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SCOLQUI | 3/21/2022 |
| | Documento con mecanismos para promover una mayor participación de proveedores en los procesos de contratación pública implementado. | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/15/2022 |
| | Documento de la estrategia global de la gestión del capital humano (incluye el diagnóstico de las brechas de conocimiento y perfiles, la estrategia de reclutamiento de operadores mujeres, y el modelo de certificación de especialistas externos) implementado | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/15/2022 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SCOLQUI | 3/21/2022 |
| | Documento del programa de gestión del cambio para todo el ciclo del proyecto implementado | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/15/2022 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SCOLQUI | 3/14/2022 |
| | Documento para la estrategia de acompañamiento in situ de las actividades de asistencia técnica para los tres niveles de gobierno implementado | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/15/2022 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SCOLQUI | 3/21/2022 |
| | Equipamiento de soporte del sistema informático de contratación pública implementado | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/15/2022 |
| | Funcionarios inscritos en el programa de capacitación integral y sostenible para la inversión en capital humano | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/15/2022 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SCOLQUI | 3/21/2022 |

| | | | | | |
|--------|--|---------------|---|---------|-----------|
| Output | Laboratorio de innovación en gestión de la inversión pública integrado con plataforma tecnológica de sistema Invierte.pe implementado | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/14/2022 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SCOLQUI | 3/21/2022 |
| | Mesa de ayuda inteligente para el apoyo y soporte a los usuarios del sistema de contrataciones públicas implementado | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/15/2022 |
| | Mesa de ayuda inteligente y multicanal para el apoyo y soporte a los usuarios del sistema implementada | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/15/2022 |
| | Módulo de Inteligencia de Negocios integrado al sistema informático de contrataciones públicas implementado | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/15/2022 |
| | Norma publicada que aprueba la metodología de programación multianual | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/14/2022 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SCOLQUI | 3/21/2022 |
| | Plataforma tecnológica para el funcionamiento de los sistemas informáticos y aplicativos de apoyo a Invierte.pe implementada | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/15/2022 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SCOLQUI | 3/14/2022 |
| | Servicio de actualización del portal de OSCE | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/15/2022 |
| | Servicio de actualización del portal Invierte.pe | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/14/2022 |
| | Sistema informático off-the-shelf para la gestión del inventario de activos públicos implementado | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/14/2022 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SCOLQUI | 3/21/2022 |
| | Sistema informático off-the-shelf para la gestión transaccional de todo el ciclo de contrataciones públicas, interoperable con otros sistemas de gestión gubernamental, implementado | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/15/2022 |
| | Sistema informático para la gestión del ciclo de inversión pública implementado | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/14/2022 |
| | | | Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a). | SCOLQUI | 3/14/2022 |
| | Software del sistema de documentos estándar y de consulta de precios de referencia para contrataciones y adquisiciones para la formulación y ejecución de proyectos implementado | Modify Output | Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a). | SCOLQUI | 3/15/2022 |

RISKS AND PLANNED RESPONSES

| Risk ID | Risk Status | | Risk Taxonomy |
|---------|------------------|---------------------|-------------------|
| 2 | Active | | Legal Environment |
| | | | |
| | Response Actions | | |
| | 2.1 | Management Strategy | Status |
| | | MITIGATE | ACTIVE |
| | | | |
| | | | |

| Risk ID | Risk Status | | Risk Taxonomy |
|---------|------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | Active | | Governance Framework |
| | | | |
| | Response Actions | | |
| | 4.1 | Management Strategy | Status |
| | | MITIGATE | ACTIVE |
| | | | |
| | | | |

| Risk ID | Risk Status | | Risk Taxonomy |
|---------|------------------|---------------------|------------------|
| 6 | Active | | Technical Design |
| | | | |
| | Response Actions | | |
| | 6.1 | Management Strategy | Status |
| | | MITIGATE | ACTIVE |
| | | | |
| | | | |

| Risk ID | Risk Status | | Risk Taxonomy |
|---------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 8 | Active | | Organizational Structure |
| | | | |
| | Response Actions | | |
| | 8.0 | Management Strategy | Status |
| | | - | |
| | | | |
| | | | |

| Risk ID | Risk Status | | Risk Taxonomy |
|---------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 10 | Active | | Organizational Structure |
| | | | |
| | Response Actions | | |
| | 10.0 | Management Strategy | Status |
| | | - | |
| | | | |
| | | | |

| Risk ID | Risk Status | | Risk Taxonomy |
|---------|------------------|---------------------|---------------------|
| 11 | Inactive | | Goods, and Services |
| | | | |
| | Response Actions | | |
| | 11.0 | Management Strategy | Status |
| | | - | |
| | | | |
| | | | |

| Risk ID | Risk Status | | Risk Taxonomy |
|---------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 14 | Active | | Institutional Environment |
| | | | |
| | Response Actions | | |
| | 14.0 | Management Strategy | Status |
| | | - | |
| | | | |
| | | | |

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

| Lesson Learned - Categories |
|-----------------------------|
| Project Design |
