

PMR Public Report

Operation Number	PR-L1139	Chief of Operations Validation Date	04/06/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/21/22
Last Update	04/05/22	Country Representative Validation Date	05/09/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for Business Development Services to Paraguayan Exporting Companies	Loan Number	3865/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Sector/Subsector	TRADE-EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Team Leader	LARSSON, MIKAEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PR-L1139	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	2,600,561.22	26.01%	7,399,438.78
Aggregated	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	2,600,561.22	26.01%	7,399,438.78

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

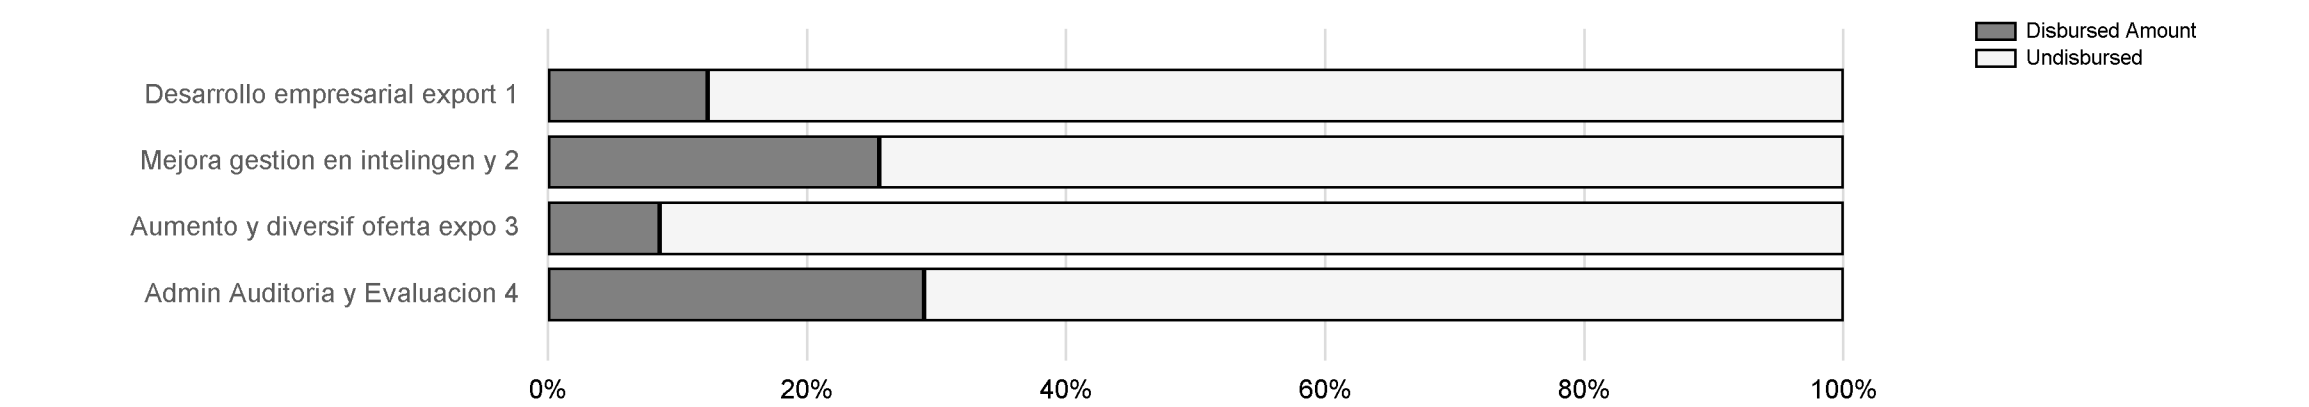

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Aumento de las Exportaciones en Paraguay

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Participación del valor de las exportaciones paraguayas en el PIB	%	46.8	2015		P	50
						A	-
Details							

Means of Verification: BCP

Observations: Representa las exportaciones del valor bienes y servicios sobre PBI 2015 (US\$8.831 millones), incluyen las exportaciones de las Hidroeléctricas Binacionales (Yacyreta e Itaipu) y las reexportaciones

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 2: Diversificación de Mercados de Exportación

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2023
2.0	Índice de concentración de mercados de exportación	Índice	0.35	2015		P	.3
						A	-
Details							

Means of Verification: UNCTAD

Observations: En términos de bloques económicos el MERCOSUR es el principal destino de las exportaciones (41%), seguido de Unión Europea (17%), Asia (11,3%) y resto de Europa (10,4%)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Componente I - SDE para la Exportación

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
1.0	Nº de productos de exportación de empresas beneficiarias durante el último año	Productos	153	2014	P	158
					A	-

Details

Means of Verification: UNCTAD

Observations: El objetivo es mantener una tendencia creciente dado que se han observado fluctuaciones en la última década.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
1.2	Valor promedio de las exportaciones de las empresas beneficiarias del programa en el último año	Promedio de exportaciones	2100000000	2012	P	2,520,000,000
					A	-

Details

Means of Verification: Información interna de REDIEX

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Specific Development Objectives Nbr. 2: Componente II - Mejoramiento de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
2.0	Nº promedio de días que toma la aprobación de proyectos empresariales de SDE	Días	25	2015	P	15
					A	-

Details

Means of Verification: Información CRM REDIEX

Observations: La cantidad de días hábiles desde que el proyecto se presente en la plataforma de REDIEX con los documentos requeridos para su análisis hasta su aprobación por parte del CEP

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
2.2	% de empresas atendidas por REDIEX satisfechas con los servicios e información recibida	%	82	2016	P	86
					A	-

Details

Means of Verification: Encuesta anual de satisfacción REDIEX

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
------------	----	---------------	----	---------------	--	--

--	--	--

Specific Development Objectives Nbr. 3: Componente III - Aumento y Diversificación de la Oferta Exportable en la Zona de Frontera

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
3.0	% personas capacitadas que se insertan en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0	2019	P	8
					A	-

Details

Means of Verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo formal del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
3.2	% personas capacitadas que mejoran su posición en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0	2019	P	20
					A	-

Details

Means of Verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que ascienden en su empleo del universo de empresas seleccionadas en bas

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
3.3	% mujeres capacitadas que se insertan en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0	2019	P	15
					A	-

Details

Means of Verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo forma del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
3.4	% mujeres capacitadas que mejoran su posición en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0	2019	P	15
					A	-

Details

Means of Verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo formal del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
3.5	Valor de las exportaciones de las empresas beneficiarias de la zona de frontera de los sectores priorizados a países de la región	%	0	2019	P	10
					A	-

Details

Means of Verification: MIC – Informe Consejo de Maquila e Información REDIEX

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 – SDE para la Mejora Competitiva de las Empresas Exportadoras

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.01	Nº de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo A)	Proyectos	P	14	51	250,000	1,047,384
			P (a)	14	51	250,000	2,245,942.72
			A	10	11	225,081	256,942.72
1.02	Nº de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo B)	Proyectos	P	8	27	570,000	2,015,000
			P (a)	8	5	570,000	178,584
			A	1	1	24,505	24,505
1.03	Nº de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo C)	Proyectos	P	13	54	675,000	2,937,616
			P (a)	13	40	675,000	3,159,717.63
			A	9	14	335,051	689,717.63

Component Nbr. 2 Componente 2 - Mejora de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.01	Implementacion de plataforma electrónica con información sobre Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) y resultados del Programa	Número	P	0.1	1	299,648	1,029,682
			P (a)	0.1	1	299,648	1,029,687.77
			A	-	1	243,089	427,899.77
2.02	Nº de técnicos capacitados	cursos	P	10	20	42,000	100,000
			P (a)	10	40	42,000	100,000
			A	-	20	-	-
2.03	Diagnósticos de capacidad exportadora realizados	Diagnóstico	P	70	280	74,844	179,500
			P (a)	70	280	74,844	103,380.78
			A	77	169	21,912	25,232.78
2.04	Encuesta de satisfacción de beneficiarios de subproyectos	Número	P	1	4	118,500	220,818
			P (a)	1	4	118,500	-
			A	1	2	-	-

Component Nbr. 3 Apoyo de sectores estratégicos de acuerdo a SDE – establecido en Componente I

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
3.01	Nº de proyectos finalizados para empresas radicadas en Alto Paraná	Número	P	8	30	195,000	1,080,000
			P (a)	8	30	195,000	1,080,000
			A	2	2	19,255	19,255
3.02	Nº de participantes a Eventos de promoción de la zona de frontera alineados con la marca país	Número	P	100	300	73,351	315,000
			P (a)	100	1,351	73,351	314,999.83
			A	694	1,251	43,270	72,785.83
3.03	Nº de cursos de capacitación en empresas en zona de frontera	Número	P	2	8	70,000	105,000
			P (a)	2	18	70,000	105,000
			A	13	13	70,304	70,304

Other Cost				
	Costos de Administración	P	187,270	790,000
		P (a)	187,270	704,838.1
		A	158,192	294,282.1
	Auditoría y Evaluación	P	50,000	180,000
		P (a)	50,000	138,465
		A	13,465	13,465
Total Cost				
	Total Cost	P	2,605,613	10,000,000
		P (a)	2,605,613	9,160,615.83
		A	1,154,124	1,894,389.83

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Diagnósticos de capacidad exportadora realizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOSE	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ROCIOSE	3/25/2022
	Implementacion de plataforma electrónica con información sobre Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) y resultados del Programa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOSE	3/25/2022
	Nº de cursos de capacitación en empresas en zona de frontera	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ROCIOSE	3/25/2022
	Nº de participantes a Eventos de promoción de la zona de frontera alineados con la marca país	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOSE	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ROCIOSE	3/25/2022
	Nº de proyectos finalizados para empresas radicadas en Alto Paraná	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOSE	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ROCIOSE	3/25/2022
	Nº de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo A)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOSE	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ROCIOSE	3/25/2022
	Nº de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo B)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOSE	3/25/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ROCIOSE	3/25/2022
	Nº de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo C)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ROCIOSE	3/25/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Political Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Legal Environment
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Human Resources
	Response Actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		SHARE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Others - Technical-Sectorial Dimensions
