

PMR Public Report

Operation Number	UR-L1110	Chief of Operations Validation Date	05/09/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	05/09/22
Last Update	05/09/22	Country Representative Validation Date	05/09/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support the National Integrated Care System	Loan Number	3706/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	SANCHEZ, MARIO ALBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Por el momento no hay obras en ejecución y se están focalizando en definir los acuerdos interinstitucionales para ejecutar las obras. El ejecutor no cuenta con un especialista socioambiental ni una unidad o departamento para gestionar estos aspectos. Tanto el MGAS como el PGAS de la operación no contemplan la nueva tipología de obras que quiere incluir el ejecutor en el Programa, que consisten en remodelaciones o ampliaciones en centros existentes que atienden a infancia y adolescencia en situación de riesgo psicosocial Las obras suelen ser realizadas por terceros sobre los cuales el ejecutor no realiza seguimiento de los aspectos ambientales, sociales ni de salud y seguridad laboral y comunitaria ni se reportan estos aspectos al Banco.		

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
UR-L1110	50,000,000	50,000,000	15,000,000	0	65,000,000	50,000,000	32,969,753.85	65.94%	17,030,246.15
Aggregated	50,000,000	50,000,000	15,000,000	0	65,000,000	50,000,000	32,969,753.85	65.94%	17,030,246.15

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

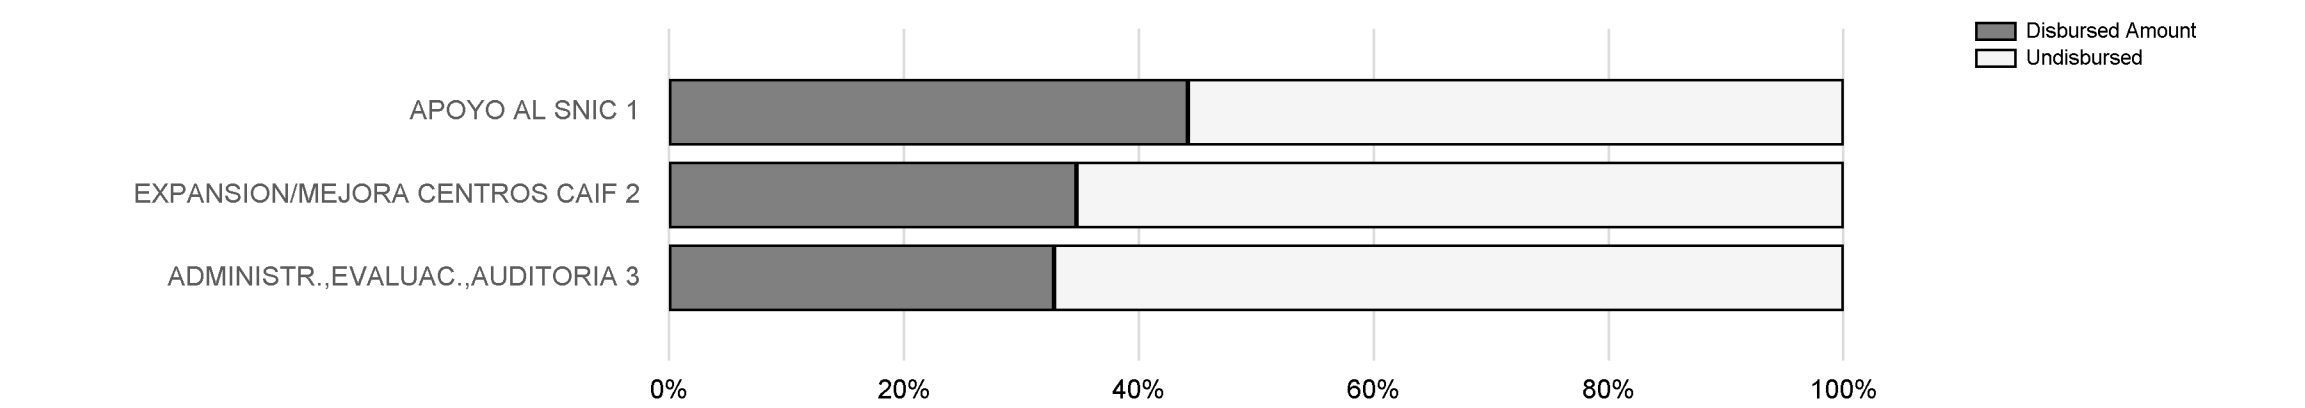

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Contribuir a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de las personas en situación de dependencia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Niños en nuevos centros CAIF con puntaje ASQ-3 por debajo de un umbral crítico.	% niños en nuevos centros CAIF	14	2016	2022	P	10
						A	-
Details							

Means of Verification: Informes SNIC/DINEM-INAU

Observations: ASQ-3 es una herramienta de detección precoz de rezagos en el desarrollo infantil.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.1	Centros CAIF nuevos con puntaje ITERS-R entre 5 y 7.			% centros CAIF	0	2016	2022	P	80
								A	-
Details									

Means of Verification: Informes SNIC/DINEM-INAU

Observations: ITERS-R es un instrumento de medición de calidad en centros para niños.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.2	Brecha en la carga global de trabajo entre mujeres y hombres de Q1.			hs semanales de trabajo	9	2016	2022	P	7
								A	-
Details									

Means of Verification: EUT 2013 y 2019

Observations: Línea de base a partir de EUT 2013 y seguimiento EUT 2019.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.3	Carga de trabajo no remunerado de cuidado infantil.			hs semanales de cuidado infantil	21.2	2016	2021	P	20
								A	-
Details									

Means of Verification: EUT 2013 y 2019

Observations: Línea de base a partir de EUT 2013 y seguimiento EUT 2019. En el caso de este indicador, hay una línea de base y una meta para mujeres (21.2) y otra para varones (14.8)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
			Mujeres		P	20	
					A	-	
			Varones		P	16	
					A	-	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Contribuir a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de las personas en situación de dependencia en el marco del SNIC.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.0	Porcentaje de cuidadores registrados en el RNC.	%	0	2016	P	25	50	50
					A	25	-	-

Details

Means of Verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.1	Porcentaje de instituciones prestadoras de servicios registradas en el RNC.	%	0	2016	P	75	100	100
					A	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.2	Porcentaje de usuarios registrados en el RNC.	%	0	2016	P	50	100	100
					A	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.3	Porcentaje de instituciones formadoras de RRHH registradas en el RNC.	%	0	2016	P	50	100	100
					A	100	-	-

Details

Means of Verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.4	Número de postulaciones para prestaciones.	#	0	2016	P	3,500	5,000	5,000
					A	10,000	-	-
Details								
Means of Verification: Sistemas de información del SNC								
Observations: Las prestaciones a considerar son: Asistente Personal, Tele asistencia, Centro de día, y Casa comunitaria Definir postulación como: beneficiario elegible (cumple requisitos) y está ingresado en el RNC.								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.5	Porcentaje de personas con conocimiento de derechos y prestaciones en el marco del SNIC.	%	0	2016	P	25	50	50
					A	46	-	-
Details								
Means of Verification: Informes SNIC								
Observations: Informe producido a partir de encuesta a ser realizada por la SNC								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.6	Porcentaje de trabajadores de CAIF nuevos, formados según nueva currícula.	%	0	2016	P	50	80	80
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: Informes semestrales de avance, e informe específico sobre calidad de centros.								
Observations: Se mide sobre los centros CAIF nuevos operando en el momento de medición								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.7	Porcentaje de usuarios satisfechos por al pertinencia de las innovaciones del PI.	%	60	2016	P	80	90	90
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: Informes semestrales de avances del programa.								
Observations: Medición que forma parte de la agenda de conocimiento del SNIC								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.8	Porcentaje de niños de los CAIF pertenecientes a hogares elegibles para AFAM Plan de Equidad (condición de vulnerabilidad socioeconómica)	%	64	2016	P	68	72	72
					A	-	-	-
Details								

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2023
0.9	Tasa de matriculación de los nuevos centros CAIF (niños/cupos)	tasa niños/cupos	0	2016	P	85	95	95
					A	-	-	-

Details

Means of Verification: Registros administrativos INAU

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la instalación y funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.01	Diseño del Portal de Cuidados aprobado por SNIC.	Portal	P	-	1	-	561,645
			P (a)	-	1	-	92,839.08
			A	-	1	-	92,839.08
1.02	Nuevas funcionalidades del Portal de Cuidados habilitadas con carga de datos de casos reales.	# nuevas funcionalidades	P	5	5	569,942	4,036,083
			P (a)	5	5	1,799,775	9,454,512.23
			A	4	4	1,398,307	6,124,234.23
1.03	Diseño de Registro Nacional de Cuidados aprobado por SNIC.	Documento - disño RNC	P	-	1	-	150,898
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-
1.04	Módulos del Registro Nacional de Cuidados en funcionamiento.	# módulos RNC	P	5	5	81,785	878,722
			P (a)	2	4	456,844	4,603,656.13
			A	3	2	985,758	3,832,840.13
1.05	Personas valoradas en relación a su situación de dependencia.	# personas valoradas	P	2,000	10,500	175,470	1,544,144
			P (a)	-	20,127	-	936,853.19
			A	-	16,127	111,927	658,031.19
1.06	Campañas de comunicación implementadas.	# campañas de comunicación	P	-	4	488,000	3,318,400
			P (a)	-	5	-	703,915.47
			A	-	5	14,136	718,051.47
1.07	Encuestas de opinión realizadas.	# encuestas de opinión	P	1	5	-	85,400
			P (a)	-	3	-	78,023.1
			A	-	3	-	78,023.1
1.08	Iniciativas territoriales de comunicación financiadas e implementadas.	# iniciativas territoriales de comunicación	P	-	120	78,125	1,046,875
			P (a)	-	74	-	831,378.78
			A	-	74	-	828,328.78
1.09	Líneas de trabajo que cuentan con productos comunicacionales.	# líneas de trabajo	P	3	15	381,486	1,007,573
			P (a)	1	13	24,471	1,090,466.72
			A	-	12	11,702	1,077,697.72
1.10	Estudios de la agenda de conocimiento publicados en el sitio web.	# estudios	P	2	12	16,470	1,197,186
			P (a)	-	10	-	279,791.58
			A	-	9	-	179,791.58

1.11	Informes de avances y resultados de la agenda de conocimiento del SNIC elaborados y aprobados por SNIC y DINEM/MIDES.	# informes de avance y resultados	P	-	3	47,581	339,484
			P (a)	-	4	-	300,632.98
			A	-	4	-	300,632.98
1.12	Prestaciones reguladas.	# prestaciones reguladas	P	-	28	86,275	880,418
			P (a)	1	23	23,135	735,364.87
			A	1	23	50,953	509,904.87
1.13	Diseño de un censo de centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisado por MEC o ANEP)	# instrumentos de medición de DIT	P	-	3	-	36,600
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.14	Centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisados por MEC o ANEP) censados	Documento - diseño de instrumento	P	-	1	-	133,379
			P (a)	-	-	-	70,627
			A	-	-	-	70,627
1.15	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de formación del SNIC.	currícula de cursos	P	-	1	31,411	608,653
			P (a)	-	1	-	315,806.32
			A	-	1	-	265,725.32
1.16	Modelo de supervisión de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por MEC.	Documento - modelo de supervisión	P	-	1	-	442,491
			P (a)	-	1	-	272,762.11
			A	-	1	17,757	224,070.11
1.17	Centros de educación y cuidado infantil supervisados por MEC con el nuevo modelo.	# de centros de educación y cuidado infantil	P	980	980	-	851,717
			P (a)	1,203	1,203	25,156	523,514.27
			A	1,203	1,203	25,157	523,515.27
1.18	Diseño de instrumento de medición de la calidad de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por INAU y MEC.	Documento - diseño instrumento de medición de calidad	P	-	1	-	61,000
			P (a)	1	2	9,760	51,350.76
			A	-	1	-	41,590.76
1.19	Centros de educación y cuidado infantil evaluados con el instrumento de medición de calidad.	# centros de educación y cuidado infantil	P	980	980	-	91,500
			P (a)	980	980	91,500	183,000
			A	130	-	-	-
1.20	Pilotos de innovaciones en primera infancia implementados.	# pilotos de innovaciones	P	5	5	33,805	1,039,311
			P (a)	6	5	34,703	806,681.95
			A	5	5	50,369	731,735.95
1.21	Pilotos de innovaciones para Personas Mayores implementados	# pilotos de innovaciones	P	-	-	-	-
			P (a)	-	4	-	1,860,466
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Expansión y mejora de la calidad de Centros de Atención a la Infancia y Familia (CAIF)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.01	Centros CAIF nuevos que cuentan con dotación de personal (técnico y de gestión) adecuado.	# centros CAIF	P	142	142	-	122,001
			P (a)	-	119	-	-
			A	-	77	-	-
2.02	Centros CAIF construidos.	# centros CAIF	P	50	50	375,007	37,939,310
			P (a)	25	25	1,639,205	19,107,097.43
			A	24	24	1,887,020	19,354,912.43
2.03	Centros CAIF que implementan el Programa de Parentalidades Comprometidas	# centros CAIF	P	70	70	103,411	592,787
			P (a)	83	83	109,695	1,011,036.77
			A	124	83	118,023	696,590.77
2.04	Centros de educación y cuidado infantil de INAU (CAIF, Nuestros Niños y CAPI) evaluados con el instrumento de medición de calidad de los centros validado.	# centros de educación y cuidado infantil	P	600	600	-	666,270
			P (a)	10	10	47,539	436,444.53
			A	10	10	47,535	342,308.53
2.05	Centros de protección y atención a niños, niñas y adolescentes de INAU con infraestructura mejorada.	# Centros de protección y atención	P	-	-	-	-
			P (a)	-	13	-	1,630,982
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Ejecución, evaluación y monitoreo

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
3.01	Mediciones para la evaluación de impacto de CAIF realizadas.	# mediciones	P	-	3	406,666	915,000
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-

Other Cost				
	Administración y ejecución del proyecto	P	241,680	6,393,153
		P (a)	250,379	2,637,769.76
		A	113,131	2,364,925.76
	Evaluación y auditoría	P	20,000	60,000
		P (a)	16,000	62,330.7
		A	16,000	44,330.7
	Fondos sin asignar	P		0
		P (a)	26,258,905.27	26,258,905.27
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	3,137,114	65,000,000
		P (a)	30,787,067.27	74,336,209
		A	4,847,775	39,060,707.73

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Centros CAIF que implementan el Programa de Parentalidades Comprometidas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	5/8/2022
			Modify Physical Historical Actual	CARLOSFAC	5/6/2022
	Centros de educación y cuidado infantil de INAU (CAIF, Nuestros Niños y CAPI) evaluados con el instrumento de medición de calidad de los centros validado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	5/8/2022
	Centros de educación y cuidado infantil evaluados con el instrumento de medición de calidad.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	5/6/2022
			Modify Physical Historical Actual	CARLOSFAC	5/6/2022
	Centros de protección y atención a niños, niñas y adolescentes de INAU con infraestructura mejorada.	Create Output	N/A	CARLOSFAC	5/6/2022
	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de formación del SNIC.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	5/6/2022
	Estudios de la agenda de conocimiento publicados en el sitio web.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	5/6/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	5/6/2022
	Iniciativas territoriales de comunicación financiadas e implementadas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	5/6/2022
	Modelo de supervisión de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por MEC.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	5/8/2022
	Módulos del Registro Nacional de Cuidados en funcionamiento.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	5/8/2022
	Nuevas funcionalidades del Portal de Cuidados habilitadas con carga de datos de casos reales.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	5/6/2022
	Personas valoradas en relación a su situación de dependencia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	5/6/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	5/6/2022
	Pilotos de innovaciones en primera infancia implementados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	5/8/2022
	Pilotos de innovaciones para Personas Mayores implementados	Create Output	N/A	CARLOSFAC	5/6/2022
	Prestaciones reguladas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	5/8/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Social Environment
	Response Actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	8.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	10.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Inactive		Social Environment
	Response Actions		
	14.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
16	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	16.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
17	Materialized		Institutional Environment
	Response Actions		
	17.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	17.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
19	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	19.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
