


PMR Public Report

Operation Number	BO-L1113	Chief of Operations Validation Date	10/14/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Rural Land Regularization and Titling Program	Loan Number	3722/BL-BO
Executing Agency	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA	Sector/Subsector	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
Team Leader	MATTOS, JUAN DE DIOS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Bolivia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	En la misión el INRA presentó el estado de avance en los puntos socio ambientales del plan de acción acordado con el BID que se encuentra en proceso de ejecución. Los principales avances se concentran en: a) Se cuenta con especialistas ambiental y social que forman parte del equipo del INRA. b) Se cuenta con TDR y se ha iniciado el proceso de contratación de especialistas para la actualización del PGAS que al momento no cuenta con los planes adecuados para la gestión de impactos ambientales y sociales, e incluye un análisis de los riesgos ambientales y sociales generados por el programa hasta la fecha. c) Se han venido implementando mecanismos participativos de titulación de las áreas remanentes, en cumplimiento de demandas de pueblos indígenas, se ha desarrollado reuniones de coordinación con las autoridades de los pueblos indígenas para orientar en este proceso de titulación. d) Se cuenta con un desarrollo considerable de la Plataforma Inter operativa SIMAT/SIG del INRA para la transparencia del proceso agrario, la misma que ha sido expuesta en la misión.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BO-L1113	60,000,000	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000	60,000,000	38,792,077.91	64.65%	21,207,922.09
Aggregated	60,000,000	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000	60,000,000	38,792,077.91	64.65%	21,207,922.09
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

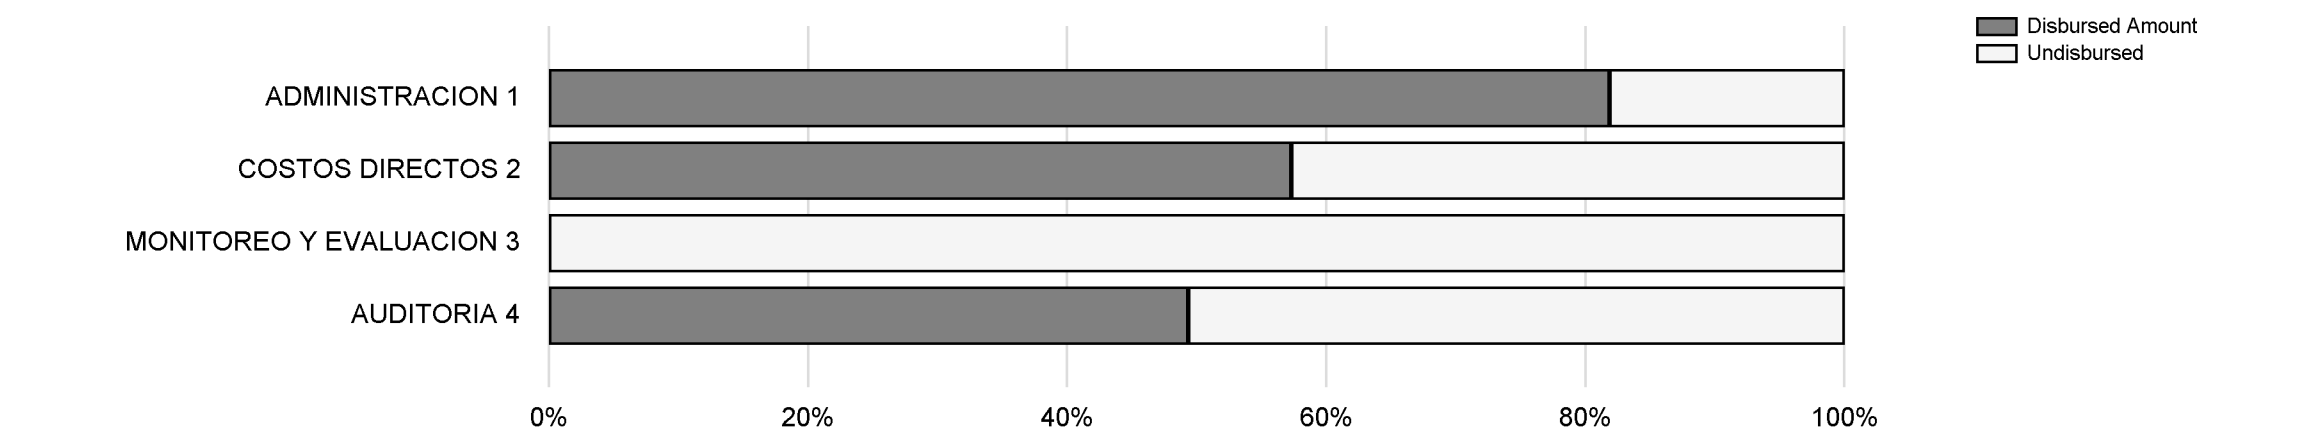

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: 1. Aumentar los ingresos netos del hogar

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Incremento en el ingreso neto total del Hogar	us\$/año	801	2008	2023	P	974
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de evaluación de impacto

Observations: La encuesta linea final se realizará al final del proyecto

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 1: 2. Aumentar la productividad agropecuaria de los productores agropecuarios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Incremento en el valor bruto de la producción agropecuaria (VBA)	US\$/HA	870	2008	2023	P	1,075
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de evaluación de impacto

Observations: La encuesta linea final se realizará al final del proyecto

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: 1. Aumento de la inversión Productiva

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Valor de la inversión productiva (maquinaria y equipos) de los productores agropecuarios	US\$ invertidos por año	215	2008	P	-	-	-	-	241	-	-	241
					A	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe de evaluación de impacto

Observations: La encuesta línea final se realizará al final del proyecto

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Beneficiarios con títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	# of farmers	0	2019	P	-	-	-	-	-	-	-	650,000
					A	48,649	77,894	-	-	-	-	-	122,543

Details

Means of Verification: Informe de evaluación de impacto

Observations: La encuesta línea final se realizará al final del proyecto

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.11 Farmers with improved access to agricultural services and investments (#) (C)

Disaggregation		Male	P	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
			A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Female	P	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
			A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Indigenous	P	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000
			A	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Specific Development Objectives Nbr. 1: 2. Reducción del Costo de la Titulación de Propiedades Rurales

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Costo promedio del proceso completo de titulación de propiedad rural	US\$/HA	8.31	2016	P	-	-	-	-	7	-	-	7
					A	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe final del proyecto

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: 3. Reducción del tiempo promedio de compra y venta de propiedad

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Tiempo que se requiere para inscribir la compra y venta de propiedad en los registros públicos	Números de días laborales	39.7	2016	P	-	-	-	-	25	-	-	25
					A	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe final del proyecto

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: 4. Reducción del área intervenida bajo conflictos por saneamiento y titulación

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Número de Ha. bajo conflictos por saneamiento y titulación de propiedad rural resultados	Millones de Ha.	5	2016	P	-	-	-	-	3	-	-	3
					A	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe final del proyecto

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 4: 5. Fortalecimiento institucional del INRA y DDRR

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.0	Oficinas del INRA y DDRR compartiendo información de catastro y registro de forma automática	%	0	2016	P	-	-	-	-	100	-	-	100
					A	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe final del proyecto

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1. Saneamiento, titulación y registro de tierras rurales

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Títulos	P	-	1,300,000	-	74,938,787
			P (a)	175,085	906,130	16,055,529.8	74,307,000
			A	48,075	579,120	2,994,791.35	48,197,324.22
1.02	Personal del INRA capacitado en gestión de conflictos sociales.	Personas	P	-	900	-	70,000
			P (a)	815	900	50,000	70,000
			A	-	85	-	6,458.14
1.03	Implementación de una brigada especializada en conflictos sociales.	Brigada	P	-	1	-	150,000
			P (a)	1	1	124,133.56	255,000
			A	1	1	17,694.45	22,909.04
1.04	Técnicos del tribunal agroambiental capacitados en gestión de conflictos sociales.	Técnicos	P	-	160	-	150,000
			P (a)	160	160	150,000	150,000
			A	-	-	-	-
1.05	Desarrollo y puesta en marcha del mecanismo de atención al usuario de los servicios de saneamiento, catastro, titulación y registro.	Protocolo	P	-	1	-	50,000
			P (a)	1	1	50,000	50,000
			A	-	-	-	-
1.06	Manual de transparencia actualizado.	Manual	P	-	1	-	21,600
			P (a)	1	1	21,600	21,600
			A	1	1	-	-
1.07	Técnicos del INRA capacitados en la utilización del manual de transparencia.	Técnicos	P	-	900	-	86,400
			P (a)	900	900	42,472.15	76,400
			A	-	-	12,318.14	12,620.69

Component Nbr. 2 2. Administración de tierras

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Sistemas SIMAT/SIC actualizado e integrado	Sistema	P	-	1	-	693,054
			P (a)	-	1	-	761,071
			A	1	2	9,656.49	745,120.83
2.02	Implementación de los sistemas SIMAT/SIC en las oficinas del INRA.	Oficinas	P	-	9	-	131,748
			P (a)	2	9	83,935.2	194,836
			A	2	9	6,605.84	90,286.46
2.03	Desarrollo de la plataforma informática de servicios de Derechos Reales.	Plataforma	P	-	1	-	800,000
			P (a)	-	1	476,793.14	1,001,000
			A	-	-	-	-
2.04	Plataforma de servicios del INRA diseñada e implementada.	Plataforma	P	-	1	-	3,852,604
			P (a)	-	1	633,316.97	3,852,604
			A	-	-	2,842.19	533,272.19
2.05	Nodo geobolivia implementado.	Nodo	P	-	1	-	15,826
			P (a)	1	1	-	15,826
			A	1	1	-	15,204.18
2.06	Campañas de mantenimiento catastral.	campañas	P	-	5	-	600,000
			P (a)	-	5	162,982.38	764,000
			A	-	5	-	599,427
2.07	Digitalización e indexación de carpetas.	Carpetas	P	-	5,000	-	1,900,000
			P (a)	2,000	5,000	250,000	1,750,000
			A	-	-	-	-
2.08	Centros de Operaciones del INRA fortalecidos.	Oficinas	P	-	3	-	6,044,172
			P (a)	-	3	1,748,889.94	5,885,146
			A	-	-	-	-
2.09	Plan de gestión ambiental y social implementado	Plan	P	-	1	-	2,376,514
			P (a)	-	1	538,670.37	2,725,514
			A	1	1	13,858.2	39,376.08

Other Cost				
	Administración	P		7,239,295
		P (a)	445,887.09	7,240,000
		A	150,934.42	6,572,685.4
	Monitoreo y evaluación	P		580,000
		P (a)	85,000	580,000
		A	64,985.42	64,985.42
	Auditoría	P		300,000
		P (a)	36,000	300,003
		A	17,980.3	165,943.53

Total Cost				
	Total Cost	P	0	100,000,000
		P (a)	20,955,210.6	100,000,000
		A	3,291,666.8	57,065,613.18

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Political Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
5	Active		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	5.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
